

Участник ДЗЗД "Аква Билд - Рилци" е представил:

1. Заявява, че ще изпълни поръчката в съответствие с всички нормативни изисквания за този вид дейност, както и в съответствие с изискванията на възложителя, посочени в техническата спецификация, обявлението и указанията за възлагане на обществената поръчка.
2. Гарантира, че е в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с предложението ни, изискванията на Възложителя, действащото законодателство и представения проект на договор.
3. Срок на договора/срок за изпълнение:
(1) Срокът на договора: до 12 месеца от датата на сключване на договора за изпълнение.
(2) Срок на изпълнение: Изпълнението на обществената поръчка е със срок за изпълнение до 6 месеца. Срокът започва да тече от датата на съставяне и подписване на Протокол обр.2/2а по Наредба №3 от 31.07.2003г. за откриване на строителна площадка и е до Датата на подписване на Констативен Акт обр. 15.
4. Предлаган подход за качествено изпълнение на поръчката (Приложение 1)
5. Организация за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката (Приложение 2)
6. Линеен график за изпълнение на предмета на поръчката (Приложение 3)
7. Комуникация и координация при изпълнение на поръчката (Приложение 4)
8. Социални характеристики, свързани с изпълнението на поръчката (Приложение 5)

9. Мерки за опазване на околната среда(Приложение 6)

10. Предложение за управление на риска(Приложение 7)

11. План за осигуряване на гаранционната поддръжка и устойчивост на обекта (Приложение 8)

12.Гаранционни срокове: минималните срокове за видовете дейности съгласно Наредба №2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, в случаите когато определените минимални срокове превишават 60 месеца, във всички останали случаи гаранционния срок е 60 месеца.

13. Декларира, че:

Всички дейности ще бъдат съгласувани с Възложителя и при необходимост коригирани и ще се изпълняват в обем и съдържание съгласно Техническите спецификации, приложенията към тях и настоящата оферта.

Са запознати с документацията за участие и приемаме без възражения условията и изискванията.

В случай, че бъдем определени за изпълнители, ние ще представим всички документи, необходими за подписване на договора съгласно документацията за участие в посочения срок от възложителя.

14. Удостоверява и потвърждава, че:

- Ще подписва съответните актове и протоколи по време на строителството, съгласно Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и договорните условия на договора;

- Строително-монтажните работи (СМР/СРР) ще бъдат изпълнени в съответствие със съществените изисквания към строежите, определени чрез Закона за устройство на територията (ЗУТ), както и другото приложимо действащо законодателство в областта на строителството, техническите спецификации, инвестиционния проект и изискванията на Възложителя;
- Екзекутивната документация и необходимите изпитания за пускане в експлоатация, когато и където е приложимо, се осигуряват за наша сметка.
- Разходите за консумация на електрическа енергия, вода и други консумативи, които са необходими за изграждане и въвеждане на обекта в експлоатация, са за наша сметка.

15. Декларира, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд;

Констатации на комисията относно съдържанието на техническото предложение на участника спрямо Първа степен на оценяване, за оферти съдържащи в себе си задължителен компонент по съответните приложения към техническото предложение предложен от участника и представяващ базово/минимално изискване по всеки един показател:

КТП1: Предлагаан подход за качествено изпълнение на поръчката

КТП1А-Първа степен на оценяване, за оферти съдържащи в себе си задължителен компонент по съответните приложения към техническото предложение предложен от участниците и представляващ базово/минимално изискване по всеки един показател

1. Минимално изискване: Подход за качествено изпълнение в който се установява, че участникът е направил анализ на

техническата спецификация и действащото законодателство и е представил подход за качествено изпълнение на дейностите и СМР и

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА, НО ИМА НЕСЪОТВЕТСТВИЯ СПРЯМО ИЗСКВАНИЯТА НА ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ , ПРЕДВИД СЛЕДНИТЕ

МОТИВИ:Участника е представил генерален подход за изпълнение на поръчката, който включва-Избор на ръководство на строително-монтажната дейност от опитни : Ръководител екип , технически ръководители -3 бр , инженер геодезист , експерт - контрол на качеството и експерт „Здравословни и безопасни условия на труд“ ,отговорник „логистика и механизация“ и специалисти ПТО – 2бр. ,всички с опит в изграждането на подобни обекти;Координация и съгласуване на дейностите с всички заинтересувани институции, съгласно българското законодателство;Подбор на квалифицирани и надлежно инструктирани, относно качество и безопасност на изпълнение на СМР технически лица, които са доказали своя професионализъм и отговорност при изпълнението на предишни наши обекти с подобен характера;Изпълнение на строителни дейности, с оформяне съответни протоколи, актове и др., съпровождащи документи съгласно нормативната база за приемане на отделните видове работи и предаване на етапи;Доставка на суровини и материали, осигуряване на механизация, работна сила и всички други услуги и дейности, необходими за изпълнение на заложените дейности;посочил е цел на настоящата поръчка;обхват на извършваните работи; Съпътстващи СМР дейности; след това в табличен вид участника е обхванал основните етапи за изпълнение на обекта, като е посочил Видове етапи и дейности за осъществяване на строителните работи в съответствие с изискванията за безопасност и здраве; отговорник и срок, за следните етапи: етап 1 Подготвителен - Дейност 1- Подготовка на строителната площадка за работа;Задача 1-Подписване на Протокол обр.2а по Наредба №3 от 31.07.2003г. за откриване на строителна площадка; Задача2- Мобилизация на механизация и работници;Задача 3- Почистване на

площадката , разчистване на терена ,обособяване на временно селище и трасиране; Етап 2 Дейности и задачи по изпълнение на обекта; Етап 3 Завършване на дейностите и задачите и предаване обекта на Възложителя- Дейност 1 - Подготовка за приемане и демобилизация; Задача 1- Демобилизация на работните екипи и почистване на площадката; Задача 2 -Оглед от страна на Възложителя и отстраняване на евентуални забележки; Задача 3-Подписване на Констативен Акт обр. 15; след това за всеки етап е описан със съставните му дейности; представил е Организация на схема на персонала при изпълнение на строителството и взаимовръзката между участниците в строителния процес

От направеното предложение и констатации на комисията се установява, че участника е предложил подход за качествено изпълнение на поръчката, но не се установява, участника да е направил анализ на техническата спецификация и действащото законодателство, съгласно минимално заложеното изискване на възложителя заложено в документацията за участие, а именно:Подход за качествено изпълнение в който се установява, че участникът е направил анализ на техническата спецификация и действащото законодателство и е представил подход за качествено изпълнение на дейностите и СМР

2. Минимално изискване:Технология на изпълнение на строително-монтажните работи (СМР), технологичните процеси и последователността на извършване на СМР при съблюдаването на общите изисквания за безопасни и здравословни условия на труд в строителството, като са обхванати всички дейности, технологични процеси и доставка на основните материали, необходими за изпълнението предмета на поръчката, отчитайки мерките за гарантиране на качество произтичащи пряко от обхвата и съдържанието на Техническите спецификации, както и разпоредбите на действащото законодателство и

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА, НО ИМА НЕСЪОТВЕТСТВИЯ СПРЯМО ИЗСКВАНИЯТА НА ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ , ПРЕДВИД СЛЕДНИТЕ

МОТИВИ:Участника е направил предложение за технология на изпълнение , както следва: Изпълнение на временна организация на движението и обезопасяване на площадката; Изкопи; Ръчни изкопи; Механизиран изкоп; Укрепване на изкопи, вкл. Разкрепване; Прехвърляне на земна почва до 3 м хоризонтално и 2м вертикално разстояние – ръчно; Превоз със самосвал земни почви до 10 км; Химическа стабилизация на лъсови почви; Обратно засипване с лъсова почва-пласт 10см; Доставка и монтаж тръби PE-HD PN10 ; Доставка и монтаж на спирателни кранове; Пожарни хидранти ; Доставка и монтаж Автоматичен въздушник ф50; Сградни водопроводни отклонения ; Изпитване на положените водопроводи ; Дезинфекция на водопровода; Засипване на положения водопровод; Сигнални и детекторни ленти; Доставка и монтаж сглобяема стоманобетонова шахта ф150 см h=2м, комплект със стъпала, цилиндри, КРШ и капак; Доставка и полагане на материал за основа с различна ширина и дебелина на пласта с CBR не по-малък от 80 % при плътност 98 % модифицирана суха плътност по AASHTO; Направа на бордюри ; Направа на тротоарите с тротоарни плочи; Изпълнение на асфалтобетонното покрития; Демонтиране на предназначите огради около обекта, знаците и огражденията от ВОД, ограничаващи движението; Приемане на водопровода.

В Приложение 2 участника е представил последователност на изпълнение и доставка на основните материали, необходими за изпълнението предмета на поръчката, за следните основни материали: инертни материали; бетонови бордюри, бетонови плочи; бетонови и асфалтови смеси. Не се установява участника да е направил предложение за следните основни материали: Тръби PE-HD, PE100, PN10; Спирателен кран; Пожарен хидрант ф80 надземен; Автоматичен въздушник; Ел. заваряема водовземна скоба; Лъсова почва за засипване; Нестандартна баластра,

съгласно минимално заложеното изискване на възложителя, а именно: следва да се обхванат и доставка на основните материали (Тръби PE-HD, PE100, PN10; Спирателен кран; Пожарен хидрант ф80 надземен; Автоматичен въздушник; Ел. заваряема водовземна скоба; Лъсоча почва за засипване; Нестандартна баластра; Бетонови плочи в тротоар; Бетонови бордюри с размер 18/35/50(100), съгласно БДС 624-87; Битумизирана основа съгласно БДС 4132-90 с минимално уплътнение 97%; Материал за основа с различна ширина и дебелина на пласта с CBR не по-малък от 80 % при плътност 98 % модифицирана суха плътност по AASHTO; Плътен асфалтобетон тип А, марка II, съгласно БДС 4132 за износващ пласт с дебелина в уплътнено състояние 4 см.)

От направеното предложение комисията не установи участника да е направил предложение по отношение на общите изисквания за безопасни и здравословни условия на труд в строителството

3. Минимално изискване: Мерки за осигуряване на качество при изпълнение на строителството :

За всяка от базовите мерки предложението отговаря едновременно на следните условия:

-предложение за обхват, план и конкретни действия, свързани с реализация на изведените мерки, вкл. съставлящите ги фактори и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана

и

- Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество при изпълнение на настоящата обществена поръчка

и

- Входящ контрол от страна на персонала, отговарящ за контрола на качеството при логистиката, свързана с поръчване и получаване на материали и други продукти за строежа, както и контрол на качеството на труда по Мерки(тип 1). Тези мярки следва да гарантира, че на строежа няма да се вложат материали, изделия и/или други стоки, имащи явни или скрити дефекти и че СМР ще бъдат изпълнени с необходимото качество според инвестиционния проект, действащите стандарти и добри практики.

и

да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености

Като минимум всеки един от участниците следва да разгледа мерките, посочени по-долу, които следва да се възприемат като базови изисквания на Възложителя:

-Мерки(тип 1), свързани с изпълнение на СМР - предвид обхвата на възлаганите СМР, както и относителната сложност на обекта в неговата:

- 1). мерки, свързани с ритмичност и достатъчност при доставка на необходимите материали;
- 2). мерки, свързани с осигуряване на материали, чийто качества и характеристики съответстват на договорните изисквания, вкл. тези, произтичащи от съдържанието на одобрения проект;

3). мерки, касаещи замяна на техника и механизация в случай, че същата е дефектирала в процеса на изпълнение на СМР;

4). мерки, отнасящи се до действия на участника в случай на изключително неблагоприятни климатични условия;

5). мерки, отнасящи се до действия на участника при изпълнение и документирание на СМР подлежащи на закриване;

- Мерки(тип 2), отнасящи се до извършване на тестове (проби) след завършване на СМР - за да е възможно законосъобразното завършване на обекта и последващото му въвеждане в експлоатация бъдещият изпълнител следва да извърши тестове/проби (независимо дали единични или комплексни), доказващи експлоатационната годност на изградените мрежи и съоръжения. Последното е съществен елемент, свързан с цялостното спазване на определения чрез договора срок:

1). мерки за навременно провеждане на пробите с оглед фактическата степен на завършеност на СМР;

2). мерки в случай на неуспешни проби (т.е. резултати от проби, които не доказват експлоатационната годност на обекта или неговата част);

-Мерки(тип 3), отнасящи се до спазване на наличния финансов ресурс

1). мерки, целящи избягване или минимизиране размера на претендираните суми, чиито източник са непредвидените разходи като част от офертата на съответния участник;

2). мерки, свързани с избягване увреждане на чуждо имущество и последващи финансови претенции от тях към

възложителя.

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА, НО ИМА НЕСЪОТВЕТСТВИЯ СПРЯМО ИЗСКВАНИЯТА НА ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ, ПРЕДВИД СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

Участника е обхванал –Мерки (тип 1), свързани с изпълнение на СМР - предвид обхвата на възлаганите СМР, както и относителната сложност на обекта в неговата:

-Мерки, свързани с ритмичност и достатъчност при доставка на необходимите материали; към предложената мярка участника е представил :

- обхват, план и конкретни действия, свързани с реализация на изведените мерки, вкл. съставлящите ги фактори и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана;

- Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество при изпълнение на настоящата обществена поръчка

-Входящ контрол от страна на персонала, отговарящ за контрола на качеството при логистиката, свързана с поръчване и получаване на материали и други продукти за строежа на настоящата обществена поръчка

-да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености

От направеното предложение по тази мярка се установява , че участника не е представил контрол на качеството на труда, съгласно изискването на възложителя, а именно Входящ контрол от страна на персонала, отговарящ за контрола на качеството при логистиката, свързана с поръчване и получаване на материали и други

продукти за строежа, както и контрол на качеството на труда по Мерки(тип 1). Тези мярки следва да гарантира, че на строежа няма да се вложат материали, изделия и/или други стоки, имащи явни или скрити дефекти и че СМР ще бъдат изпълнени с необходимото качество според инвестиционния проект, действащите стандарти и добри практики.

мерки, свързани с осигуряване на материали, чийто качества и характеристики съответстват на договорните изисквания, вкл. тези, произтичащи от съдържанието на одобрения проект;

към посочената мярка участника е представил:

- обхват, план и конкретни действия, свързани с реализация на изведените мерки, вкл. съставлящите ги фактори и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана;

- Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество при изпълнение на настоящата обществена поръчка

-Входящ контрол от страна на персонала, отговарящ за контрола на качеството при логистиката, свързана с поръчване и получаване на материали и други продукти за строежа ение на настоящата обществена поръчка

-да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености

От направеното предложение по тази мярка се установява , че участника не е представил контрол на качеството на труда, съгласно изискването на възложителя, а именно Входящ контрол от страна на персонала, отговарящ за контрола на качеството при логистиката, свързана с поръчване и получаване на материали и други

продукти за строежа, както и контрол на качеството на труда по Мерки(тип 1). Тези мярки следва да гарантира, че на строежа няма да се вложат материали, изделия и/или други стоки, имащи явни или скрити дефекти и че СМР ще бъдат изпълнени с необходимото качество според инвестиционния проект, действащите стандарти и добри практики.

- мерки, касаещи замяна на техника и механизация в случай, че същата е дефектирала в процеса на изпълнение на СМР;

Към посочената мярка участника е направил предложение, както следва:

- обхват, план и конкретни действия, свързани с реализация на изведените мерки, вкл. съставлящите ги фактори и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана;

- Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество при изпълнение на настоящата обществена поръчка

Входящ контрол от страна на персонала, отговарящ за контрола на качеството при логистиката, свързана с поръчване и получаване на материали и други продукти за строежа ение на настоящата обществена поръчка

-да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености

От направеното предложение по тази мярка се установява , че участника не е представил контрол на качеството на труда, съгласно изискването на възложителя, а именно Входящ контрол от страна на персонала, отговарящ за контрола на качеството при логистиката, свързана с поръчване и получаване на материали и други

продукти за строежа, както и контрол на качеството на труда по Мерки(тип I). Тези мярки следва да гарантира, че на строежа няма да се вложат материали, изделия и/или други стоки, имащи явни или скрити дефекти и че СМР ще бъдат изпълнени с необходимото качество според инвестиционния проект, действащите стандарти и добри практики.

-мерки, отнасящи се до действия на участника в случай на изключително неблагоприятни климатични

УСЛОВИЯ;

Към посочената мярка участника е направил предложение, както следва:

- обхват, план и конкретни действия, свързани с реализация на изведените мерки, вкл. съставлящите ги фактори и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана;
- Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество при изпълнение на настоящата обществена поръчка

Входящ контрол от страна на персонала, отговарящ за контрола на качеството при логистиката, свързана с поръчване и получаване на материали и други продукти за строежа ение на настоящата обществена поръчка

-да отчитат спецификата на възлагащите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености

От направеното предложение по тази мярка се установява , че участника не е представил контрол на качеството на труда, съгласно изискването на възложителя, а именно Входящ контрол от страна на персонала, отговарящ за контрола на качеството при логистиката, свързана с поръчване и получаване на материали и други

продукти за строежа, както и контрол на качеството на труда по Мерки(тип 1). Тези мерки следва да гарантира, че на строежа няма да се вложат материали, изделия и/или други стоки, имащи явни или скрити дефекти и че СМР ще бъдат изпълнени с необходимото качество според инвестиционния проект, действащите стандарти и добри практики.

- мерки, отнасящи се до действия на участника при изпълнение и документирание на СМР подлежащи на закриване;

Към посочената мярка участника е направил предложение, както следва:

- обхват, план и конкретни действия,
- Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество при изпълнение на настоящата обществена поръчка

Входящ контрол от страна на персонала, отговарящ за контрола на качеството при логистиката, свързана с поръчване и получаване на материали и други продукти за строежа ение на настоящата обществена поръчка

От направеното предложение, комисията установи че участника не е направил предложение по отношение на:

съставлящите ги фактори и приемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана, съгласно минимално заложеното изискване на възложителя, а именно:

-да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености

От направеното предложение по тази мярка се установява , че участника не е представил контрол на качеството на труда, съгласно изискването на възложителя, а именно Входящ контрол от страна на персонала, отговарящ за контрола на качеството при логистиката, свързана с поръчване и получаване на материали и други продукти за строежа, както и контрол на качеството на труда по Мерки(тип I). Тези мерки следва да гарантира, че на строежа няма да се вложат материали, изделия и/или други стоки, имащи явни или скрити дефекти и че СМР ще бъдат изпълнени с необходимото качество според инвестиционния проект, действащите стандарти и добри практики.

Мерки(тип 2), отнасящи се до извършване на тестове (проби) след завършване на СМР - за да е възможно законосъобразното завършване на обекта и последващото му въвеждане в експлоатация

-мерки за навременно провеждане на пробите с оглед фактическата степен на завършеност на СМР;

Към тази мярка участника е предложил:

-обхват, план и конкретни действия

- Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество при изпълнение на настоящата обществена поръчка

- Входящ контрол от страна на персонала, отговарящ за контрола на качеството при логистиката, свързана с поръчване и получаване на материали и други продукти за строежа ение на настоящата обществена поръчка

От направеното предложение, комисията установи че участника не е направил предложение по отношение на:

съставлящите ги фактори и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана, съгласно минимално заложеното изискване на възложителя, а именно: - обхват, план и конкретни действия, свързани с реализация на изведените мерки, вкл. съставлящите ги фактори и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана;

-да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености

-мерки в случай на неуспешни проби (т.е. резултати от проби, които не доказват експлоатационната годност на обекта или негова част);

Към тази мярка участника е предложил:

- обхват, план и конкретни действия, свързани с реализация на изведените мерки, вкл. съставлящите ги фактори и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана;

- Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество при изпълнение на настоящата обществена поръчка

- Входящ контрол от страна на персонала, отговарящ за контрола на качеството при логистиката, свързана с

поръчване и получаване на материали и други продукти за строежа с ние на настоящата обществена поръчка

От направеното предложение, комисията установи че участника не е напредвил предложението по отношение на:

-да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености

-Мерки(тип 3), отнасящи се до спазване на наличния финансов ресурс

-мерки, целящи избягване или минимизиране размера на претендираните суми, чиито източник са непредвидените разходи като част от офертата на съответния участник;

Към тази мярка участника е предложил:

- обхват, план и конкретни действия, свързани с реализация на изведените мерки, вкл. съставлящите ги фактори и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана;

- Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество при изпълнение на настоящата обществена поръчка

- Входящ контрол от страна на персонала, отговарящ за контрола на качеството при логистиката, свързана с

поръчване и получаване на материали и други продукти за строежа е на настоящата обществена поръчка

-да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености

- мерки, свързани с избягване увреждане на чуждо имущество и последващи финансови претенции от тях към възложителя.

От направеното предложение, комисията установи че участника не е направил предложение по отношение на:

съставлящите ги фактори и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана, съгласно минимално заложено изискване на възложителя, а именно: - обхват, план и конкретни действия, свързани с реализация на изведените мерки, вкл. съставлящите ги фактори и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана;

-да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености

КТП2: Организация за изпълнение на дейностите
КТП2А-Първа степен на оценяване, за оферти съдържащи в себе си задължителен компонент по съответните приложения към техническото предложение предложен от участниците и представляващ базово/минимално изискване по всеки един показател 1. <u>Минимално изискване:</u> Дейности за изпълнението на предмета на поръчката, като са обхванати всички работи и технологични процеси, необходими за изпълнението на предмета на поръчката, отчитайки времето за тяхното изпълнение, включително подготовителни работи (мобилизация), работи по изпълнението на СМР, тествания (в приложимите случаи), въвеждане на строежа в експлоатация, както и всички други съпътстващи работи, необходими за постигане целите на предмета на поръчката и <u>ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА, КОИТО ИМА НЕСЪОТВЕТСТВИЯ СПРЯМО ИЗСКВАНИЯТА НА ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ , ПРЕДВИД СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:</u> Участника е обхванал Подготвителни работи- Временна строителна площадка и работни строителни площадки – предвижда мобилни фургони; Складови площи; Временно водоснабдяване; Временно електрооснабдяване ; Оборудване на фургоните; осигуряване на лични предпазни средства за работниците; Временни площадки – мивки; Разчистване на терена; Обезопасяване на изкопите; Поставяне на табели и знаци; Временни технологични пътища; ВОД ; Обезопасяване на изкопите; Изкопни работи; Изграждане на водопровода; Обратна засипка; Възстановяване на пътната настилка; Асфалтова настилка; Макадамова настилка; Плочки; от направеното предложение не се установява участника да е направил предложение по отношение на тествания и

въвеждане на строежа в експлоатация

2. Минимално изискване: Последователността на строителните процеси в зависимост от представения технологичен подход за постигането на целите на предмета на поръчката, включително чрез определяне на тяхната продължителност в съответствие с Техническите спецификации и

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

Участника е представил Последователността на строителните процеси в зависимост от представения технологичен подход за постигането на целите на предмета на поръчката, включително чрез определяне на тяхната продължителност в съответствие с Техническите спецификации

3. Минимално изискване: Организацията на строителната площадка, както в периода на подготовката ѝ и изграждане на временното строителство, така и в периода на същинското строителство, включително на доставките и складирането на материалите и строителните продукти, като същата е съобразена с предложението за изпълнение на основните дейности/СМР и гарантира осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност на обекта и

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА, НО ИМА НЕСЪОТВЕТСТВИЯ СПРЯМО ИЗИСКВАНИЯТА НА ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ, ПРЕДВИД СЛЕДНИТЕ МОТИВИ: в

тази част от предложението си участник е представил дейности по подготовка на строителната площадка с Възложителя и проектантите за представяне на ръководния екип; Работна среща на техническия ръководител с проектантския екип за уточняване на изискванията им; Среща с експлоатационните предприятия, запознаване със

съществуващите съоръжения и проводи на техническата инфраструктура; Подготовка на документи за подписване на протокол Образец 2; Подписване на договор за охрана на строителната площадка; Предложение за одобрение на информационни табели, изработката им и монтаж на видни места; Информационна табела; Подписване на договори с производители и доставчици и изготвяне на график за доставка на материали; Уточняване на местата за депониране на земни маси, строителни отпадъци и др. и получаване на разрешение за използването им; Устрояване на наестата база /временно строително селище; Участника е посочил Описание на организацията на строителната площадка, която включва Осигуряването на терен за материали и оборудване , съобразява се с видовете работи и тяхната последователност, със съществуващите инфраструктурни и други обекти, като те ще са в максимална близост до изграждания обект; Дейностите, свързани с координация между Изпълнителя и Възложителя и др. Институции; Дейностите, свързани с практическата организация на строителната площадка, включват: Ограждане на площадката с метална ограда, оборудвана с табели за забрана на достъпа на външни лица и обособяване на вход/изход на строителния обект; Предложение за одобрение на информационни табели, изработката им и монтаж на определени от Възложителя места; Осигуряване на временно електрозахранване; Осигуряване на временно водоснабдяване; Обособяване на будка за охрана; Обособяване на автомивка за измиване на площадката механизация; Обособяване на канцелария на инженерно-техническото ръководство; Обособяване на съблекални за работниците; Обособяване на открити и покрити складови зони; Обособяване на места за съхранение и ремонт на механизацията; Обособяване на санитарно битови помещения; Осигуряване и транспорт до мястото на основното строително оборудване и на всички изисквани инструменти и уреди. Набавяне на материали; Складиране и охраняване на оборудване и материали; охрана на обекта и пропускателен режим; Получаване на разрешение от Строителния надзор от направеното предложение комисията констатира следното: участника е направил предложение за Организацията на

строителната площадка в периода на подготовката ѝ и изграждане на временното строителство, включително на доставките и складирането на материалите и строителните продукти

от направеното предложение не се установява участника да е представил Организацията на строителната площадка в периода на същинското строителство, като същата е съобразена с предложението за изпълнение на основните дейности/СМР и гарантира осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност на обекта

4. Минимално изискване: Организацията на работата на инженерно-техническия (ръководен) състав на участника и на изпълнителския/ките екип/и (строителните работници), отговорни за строителството на обекта и предложение относно начините за осъществяване на координация и за съгласуване на дейностите по между им и

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

Участника е представил схема- структура на дружеството; след това в табличен вид е представил наименование на персонала и функции/действия/работни задължения на ключов персонал и допълнителни експерти; след това е представил отговорностите и задълженията им, представил е и Организация на Работната ръка ангажирана в строителния процес ; определил е Необходима работна ръка и екипи при изпълнение на строителството; Оборудване и механизация, които ще се използват при изпълнението на обекта

5. Минимално изискване: Линеен график за изпълнение на обекта, отразяващ последователността и продължителността на всички видове работи и дейности, необходими за изпълнението и

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

Участника е представил Линеен график за изпълнение на обекта, отразяващ последователността и продължителността на всички видове работи и дейности, необходими за изпълнението и

6. Минимално изискване: Представен качествен и количествен анализ на дефинираните от Възложителя рискове и направена оценка на вероятността за проявлението и степента на въздействие, които могат да предизвикат затруднения в планираната организация на изпълнението на дейностите от предмета на поръчката, както и предложена програма (относими към обекта) за управление на риска, включваща мерки за недопускане/предотвратяване на риска, в приложимите случаи, съответно обосновка за невъзможността да се предприемат подобни мерки в конкретния случай; мерки за преодоляване на риска, в случай на неговото настъпване;

Възложителят дефинира следните рискове, които могат да възникнат при изпълнението на обекта и които следва да бъдат отчетени от Участниците при подготовката на Предложението им за изпълнение на поръчката, а именно:

1. Закъснение началото на започване на изпълнението на строително-монтажните работи;
2. Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите по изпълнение на СМР;

3. Закъснение за окончателно приключване и предаване на строежа;
4. Трудности с използваната от изпълнителя техника и/или човешки ресурси;
5. Липса и/или недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес и/или компетентни държавни и/или общински органи и институции;
6. Липса и/или неточности в проектната документация;
7. Промени в законодателството на Република България и/или на Европейския съюз, свързани с изпълнението на договора за обществена поръчка.

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА, КОИТО ИМА

НЕСЪОТВЕТСТВИЯ СПРЯМО ИЗСКВАНИЯТА НА ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ , ПРЕДВИД СЛЕДНИТЕ

МОТИВИ: Участника е представил Организацията и координацията на дейностите по оценяването на риска; Специалисти; Група по условия на труд; Специалисти от Службата по трудова медицина; Оценители на риска; Източници на информация за оценяване на риска; Етапи и последователността за оценяване на риска, съгласно "Методика за оценка на риска" и Договор за обслужване по трудова медицина

Закъснение началото на започване на изпълнението на строително-монтажните работи

участника е представил Оценка вероятността за проявление и степента на въздействие му върху изпълнението на дейностите от предмета на поръчката ; Степен на въздействие върху изпълнението при възникването на риска;

Мерки за недопускане/ предотвратяване на риска; Мерки за преодоляване на риска

Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите по изпълнение на СМР

участника е представил Оценка вероятността за проявяването и степента на въздействие му върху изпълнението на дейностите от предмета на поръчката ; Мерки за превенция за недопускане и/или за ранно предотвратяване на риска, съответно обосновка за невъзможността да се предприемат подобни мерки в конкретния случай; Мерки за предотвратяване на риска и на последиците при настъпването му ; Мерки за мониторинг на риска по време на изпълнение на договора; Дейности по контрол върху изпълнението на предложените мерки

Закъснение за окончателно приключване и предаване на строежа

участника е представил Оценка вероятността за проявяването и степента на въздействие му върху изпълнението на дейностите от предмета на поръчката ; Мерки за превенция за недопускане и/или за ранно предотвратяване на риска; Мерки за предотвратяване на риска и на последиците при настъпването му ; Мерки за мониторинг на риска по време на изпълнение на договора; Дейности по контрол върху изпълнението на предложените мерки

Трудности с използваната от изпълнителя техника и/или човешки ресурси

участника е представил Оценка вероятността за проявяването и степента на въздействие му върху изпълнението на дейностите от предмета на поръчката ; Мерки за превенция за недопускане и/или за ранно предотвратяване на риска, съответно обосновка за невъзможността да се предприемат подобни мерки в конкретния случай; Мерки за предотвратяване на риска и на последиците при настъпването му ; Мерки за мониторинг на риска по време на

изпълнение на договора; Дейности по контрол върху изпълнението на предложените мерки
Липса и/или недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес и/или компетентни държавни и/или общински органи и институции;
участника е представил Оценка вероятността за проявлението и степента на въздействие му върху изпълнението на дейностите от предмета на поръчката ; Мерки за недопускане /предотвратяване на риска; Мерки за мониторинг на риска по време на изпълнение на договора; Дейности по контрол върху изпълнението на предложените мерки
Липса и/или неточности в проектната документация
участника е представил Оценка вероятността за проявлението и степента на въздействие му върху изпълнението на дейностите от предмета на поръчката ; Мерки за недопускане/ предотвратяване на риска; Мерки за преодоляване на риска
Промени в законодателството на Република България и/или на Европейския съюз, свързани с изпълнението на договора за обществена поръчка
участника е представил Оценка вероятността за проявлението и степента на въздействие му върху изпълнението на дейностите от предмета на поръчката ; Мерки за недопускане / предотвратяване на риска; Управление на последиците от настъпилия риск
<u>не се установява участника да е Представил качествен и количествен анализ на дефинираните от Възложителя</u>

<u>рискове</u>	
КТПЗ: Мерки за опазване на околната среда	
КТПЗА-Първа степен на оценяване, за оферти съдържащи в себе си задължителен компонент по съответните приложения към техническото предложение предложени от участниците и представляващ базово/минимално изискване по всеки един показател	1. <u>Минимално изискване:</u>Предвидени са мерки за опазване на околната среда по всеки един от посочените аспекти, идентифицирани от Възложителя. Установява се подробно предложение относно всички мерки в тази част от офертата на участника, като са предвидени най-малко по една мярка за всеки един аспект. Всяка мярка съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ и В)План за организация за изпълнение на мярката, с посочване на ресурсите(технически и човешки), Базовите аспекти идентифицирани от възложителя са: • Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с отработени горива, масла и др.работни течности от механизацията; • Намаляване запрашеността на атмосферния въздух и шума при изпълнение на поръчката; • Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на строителство; • Оптимизиране на графика за доставка на материали за намаляване на трафика

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

Участника е направил предложение в тази си част от офертата, както следва:

Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с отработени горива, масла и др. работни течности от механизацията. Мярка- използване на технически изправна техника и механизация за обекта

Мярка- използване на технически изправна техника и механизация за обекта

към посочената мярка е представил

А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението й и В) План за организация за изпълнение на мярката, с посочване на ресурсите (технически и човешки)

Намаляване запрашеността на атмосферния въздух и шума при изпълнение на поръчката

към посочената мярка е представил

А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението й и В) План за организация за изпълнение на мярката, с посочване на ресурсите (технически и човешки)

Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на строителство

към посочената мярка е представил
А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението й и В)План за организация за изпълнение на мярката, с посочване на ресурсите(технически и човешки)
Оптимизиране на графика за доставка на материали за намаляване на трафика
към посочената мярка е представил
А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението й и В)План за организация за изпълнение на мярката, с посочване на ресурсите(технически и човешки)
2.План за отпадъците, генерирани вследствие изпълнението предмета на поръчката
Участника в табличен вид е представил План за отпадъците, генерирани вследствие изпълнението предмета на поръчката, като е посочил дейност; аспект; мерки за управление; срок; отговорност и контрол по изпълнението
КТП4: Социални характеристики, свързани с изпълнението на поръчката
КТП4А-Първа степен на оценяване, за офerti съдържащи в себе си задължителен компонент по съответните приложения към техническото предложение предложение от участниците и представляващ базово/минималноизискване по всеки един показател
1. Минимално изискване: Предвидени са мерки касаещи социални характеристики по всеки един от посочените аспекти,

идентифицирани от Възложителя. Установява се подробно предложение относно всички мерки в тази част от офертата на участника, като са предвидени най-малко по една мярка за всеки един аспект. Мерките отчитат спецификата на възлагащите работи и са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка съдържа едновременно три компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен социален ефект; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението й; В)План за организация за изпълнение на мярката, с посочване на ресурсите(технически и човешки).

Базовите аспекти идентифицирани от възложителя са :

- Базовите аспекти идентифицирани от възложителя са :

-Организиране на работния процес, така че да се не се прекъсва достъпа и достъпната среда около строежа;

-Организиране на работния процес, така че да се минимизира неудобството за транспорта и пешеходците и гарантира безопасността им ;

-Организиране на работния процес, така че да се минимизира неудобството за гражданите в близост до обекта от прах, шум, замърсяване;

-Информирание на гражданите (живущи и работещи в близост до обекта) относно предстоящи строително-монтажни работи.

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

Участника е представил

Организиране на работния процес, така че да се не се прекъсва достъпа и достъпната среда около строежа;

А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен социален ефект; Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението й;

В)План за организация за изпълнение на мярката, с посочване на ресурсите(технически и човешки).

Организиране на работния процес, така че да се минимизира неудобството за транспорта и пешеходците и гарантира безопасността им

А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен социален ефект;

Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението й;

В)План за организация за изпълнение на мярката, с посочване на ресурсите(технически и човешки).

Организиране на работния процес, така че да се минимизира неудобството за гражданите в близост до обекта от прах, шум, замърсяване;

А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен социален ефект;

Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението й;

В)План за организация за изпълнение на мярката, с посочване на ресурсите(технически и човешки). Информирание на гражданите (живущи и работещи в близост до обекта) относно предстоящи строително-монтажни работи. А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен социален ефект; Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението й; В)План за организация за изпълнение на мярката, с посочване на ресурсите(технически и човешки).

План за осигуряване на гаранционната поддръжка и устойчивост на обекта:

Изисквания:	Да/не
Минимално изискване:Превантивен мониторинг чрез регулярни огледи на място и/или други методи по предложение на участника (превантивни действия).-методи за наблюдение и оценка на състоянието на обекта по време на гаранционния период, включително честота на наблюдение, основни характеристики – обект на наблюдение, периодичност на докладване. Планираните методи, характеристики и периодичност да бъдат обвързани с осигуряването на нормално функциониране на обекта, както и предпоставки за появята на дефекти с цел ранна диагностика на проблеми, свързани с функционирането на обекта. <u>Представената част от плана отговаря на минималните изисквания на Възложителя, поради следните</u>	да

<u>МОТИВИ:</u> Участника е представил методи за наблюдение и оценка на състоянието на обекта по време на гаранционния период включително честота на наблюдение, основни характеристики – обект на наблюдение, периодичност на докладване	
<u>Минимално изискване:</u> Честота на превантивен мониторинг-е на всеки 6 месеца	
<u>Минимално изискване:</u>изпълнение на необходимите коригиращи дейности, за постигане на нормално функциониране и отстраняване на дефекти, свързани с описаните аспекти и дефекти Съществени дефекти са такива, свързани с: - Дефекти в резултат на несъответствие на качеството на вложените материали с техническата спецификация, включително тяхната годност и дълготрайност; - Дефекти, свързани с начина на изпълнение на строително – монтажните работи; - Срок на годност в съчетание на материал и технология.	<u>Представената част от плана отговаря на минималните изисквания на Възложителя, поради следните</u> <u>МОТИВИ:</u> Участника е обвързал необходимите коригиращи дейности, за постигане на нормално функциониране и отстраняване на дефекти, свързани с описаните аспекти и дефекти в частта Осигуряване (обезпечаване) подмяната на материал или други елементи и съоръжения, които са повредени или негодни за експлоатация

-	
<u>Минимално изискване:</u> Реакция при констатирани дефекти, включително описание на процедури за реакция, отстраняване и срокове (коригирани действия)-описание на техническия капацитет, необходимите ресурси и процедури за мобилизация за осигуряване на ефективна и навременна реакция и отстраняване на констатирани дефекти. Предвид обществената значимост на обекта на интервенция, максимално допустимият срок за реакция е 4 часа, а за отстраняване на констатирани дефекти е 24 /двадесет и четири / часа. Срокът може да бъде удължаван само при обективна невъзможност за срок, предварително съгласуван с Възложителя. <u>Представената част от плана не отговаря на минималните изисквания на Възложителя, поради следните МОТИВИ:</u> Участника е представил коригирани действия включително описание на процедури за реакция, отстраняване и срокове; участника е представил процедури за мобилизация за осигуряване на ефективна и навременна реакция и отстраняване на констатирани дефекти, <u>но не е направил описание на техническия капацитет, необходимите ресурси</u>	не
<u>Минимално изискване:</u> Комуникация с Възложителя през периода на гаранционните срокове-включващ като минимум: процедури за докладване на резултатите от превантивния мониторинг, регистър на констатирани проблеми и предприетите мерки за отстраняване на констатирани дефекти, оценка на рискове, свързани с неправилна експлоатация, намеса на трети страни и препоръки за преодоляването им. <u>Представената част от плана не отговаря на минималните изисквания на Възложителя, поради следните МОТИВИ:</u> Участника е представил процедури за докладване на резултатите от превантивния	не

мониторинг, регистър на констатираните проблеми и предприетите мерки за отстраняване на констатираните дефекти, <u>но не е представил оценка на рисковете, свързани с неправилна експлоатация, намеса на трети страни и препоръки за преодоляването им.</u>	да
<u>Минимално изискване:</u> Дейностите по превантивен мониторинг, докладване и отстраняване на констатираните дефекти-трябва да обхващат всички елементи на обекта, които са предмет на гаранционна отговорност, а именно: -Водопровод и елементите към него; -Асфалтови покрития, бордюри и тротоари; <u>Представената част от плана отговаря на минималните изисквания на Възложителя, поради следните МОТИВИ:</u> Дейностите по превантивен мониторинг, докладване и отстраняване на констатираните дефекти обхващат всички елементи на обекта, които са предмет на гаранционна отговорност	да
<u>Минимално изискване:</u>Обосновка на предложения срок за реакция и отстраняване на констатираните дефекти, за всяка от изброените групи елементи. Срокът за реакция трябва да включва и времето на доставка и монтаж на материали и /или оборудване. <u>Представената част от плана отговаря на минималните изисквания на Възложителя, поради следните МОТИВИ:</u> участника е представил Обосновка на предложения срок за реакция и отстраняване на констатираните дефекти, за всяка от изброените групи елементи	да

ВЪВ ВРЪЗКА С ГОРЕЦИТИРАНИТЕ КОНСТАТАЦИИ И МОТИВИ ОТНОСНО съдържанието на техническото предложение на участника спрямо Първа степен на оценяване, КОМИСИЯТА ЗАКЛЮЧИ, ЧЕ ПРЕДСТАВЕНОТО ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НЕ ОТГОВАРЯ НА МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ СЪГЛАСНО ДОКУМЕНТАЦИЯТА за участие и съответно не отговаря на Първа степен на оценяване, за оферти съдържащи в себе си задължителен компонент по съответните приложения към техническото предложение предложен от участниците и представляващ базово/минимално изискване по всеки един показател ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

1. В част Предлагаан подход за качествено изпълнение на поръчката (Приложение 1):

1.1. Подход за качествено изпълнение в който се установява, че участникът е направил анализ на техническата спецификация и действащото законодателство и е представил подход за качествено изпълнение на дейностите и СМР- участника не е предложил подход за качествено изпълнение на поръчката, но не се установява, участника да е направил анализ на техническата спецификация и действащото законодателство, съгласно минимално заложеното изискване на възложителя заложено в документацията за участие, а именно: Подход за качествено изпълнение в който се установява, че участникът е направил анализ на техническата спецификация и действащото законодателство и е представил подход за качествено изпълнение на дейностите и СМР

1.2. Технология на изпълнение на строително-монтажните работи (СМР), технологичните процеси и последователността на извършване на СМР при съблюдаването на общите изисквания за безопасни и здравословни условия на труд в строителството, като са обхванати всички дейности, технологични процеси и доставка на основните материали, необходими за изпълнението предмета на поръчката, отчитайки мерките за гарантиране на качество произтичащи пряко от обхвата и съдържанието на Техническите

спецификации, както и разпоредбите на действащото законодателство- участника не е направил предложение по отношение на общите изисквания за безопасни и здравословни условия на труд в строителството

1.3. Мерки за осигуряване на качество при изпълнение на строителството-за Мерки(тип 1), свързани с изпълнение на СМР - предвид обхвата на възлаганите СМР, както и относителната сложност на обекта в неговата: -Мерки, свързани с ритмичност и достатъчност при доставка на необходимите материали; към предложената мярка участника е представил : не е представил контрол на качеството на труда, съгласно изискването на възложителя, а именно Входящ контрол от страна на персонала, отговарящ за контрола на качеството при логистиката, свързана с поръчване и получаване на материали и други продукти за строежа, както и контрол на труда по Мерки(тип 1). Тези мерки следва да гарантира, че на строежа няма да се вложат материали, изделия и/или други стоки, имащи явни или скрити дефекти и че СМР ще бъдат изпълнени с необходимото качество според инвестиционния проект, действащите стандарти и добри практики.; -мерки, свързани с осигуряване на материали, чиито качества и характеристики съответстват на договорните изисквания, вкл. тези, произтичащи от съдържанието на одобрения проект: не е представил контрол на качеството на труда, съгласно изискването на възложителя, а именно Входящ контрол от страна на персонала, отговарящ за контрола на качеството при логистиката, свързана с поръчване и получаване на материали и други продукти за строежа, както и контрол на качеството на труда по Мерки(тип 1). Тези мерки следва да гарантира, че на строежа няма да се вложат материали, изделия и/или други стоки, имащи явни или скрити дефекти и че СМР ще бъдат изпълнени с необходимото качество според инвестиционния проект, действащите стандарти и добри практики.; - мерки, касаещи замяна на техника и механизация в случай, че същата е дефектирала в процеса на изпълнение на СМР: не е представил контрол на качеството на труда, съгласно изискването на възложителя, а именно Входящ контрол от страна на персонала, отговарящ за контрола на качеството при логистиката, свързана с поръчване и получаване на материали и други продукти за строежа, както и

контрол на качеството на труда по Мерки (тип 1). Тези мярки следва да гарантира, че на строежа няма да се вложат материали, изделия и/или други стоки, имащи явни или скрити дефекти и че СМР ще бъдат изпълнени с необходимото качество според инвестиционния проект, действащите стандарти и добри практики. -мерки, отнасящи се до действия на участника в случай на изключително неблагоприятни климатични условия: не е представил контрол на качеството на труда, съгласно изискването на възложителя, а именно Входящ контрол от страна на персонала, отговарящ за контрола на качеството при логистиката, свързана с поръчване и получаване на материали и други продукти за строежа, както и контрол на качеството на труда по Мерки(тип 1). Тези мярки следва да гарантира, че на строежа няма да се вложат материали, изделия и/или други стоки, имащи явни или скрити дефекти и че СМР ще бъдат изпълнени с необходимото качество според инвестиционния проект, действащите стандарти и добри практики.; - мерки, отнасящи се до действия на участника при изпълнение и документирание на СМР подлежащи на закриване: не е направил предложение по отношение на: съставлящите ги фактори и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана, съгласно минимално заложеното изискване на възложителя, а именно:-да отчитат спецификата на възлагащите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Участника не е представил контрол на качеството на труда, съгласно изискването на възложителя, а именно Входящ контрол от страна на персонала, отговарящ за контрола на качеството при логистиката, свързана с поръчване и получаване на материали и други продукти за строежа, както и контрол на качеството на труда по Мерки(тип 1). Тези мярки следва да гарантира, че на строежа няма да се вложат материали, изделия и/или други стоки, имащи явни или скрити дефекти и че СМР ще бъдат изпълнени с необходимото качество според инвестиционния проект, действащите стандарти и добри практики. За Мерки(тип 2), отнасящи се до извършване на тестове (проби) след завършване на СМР - за да е възможно законосъобразното завършване на обекта и

последващото му въвеждане в експлоатация: -мерки за навременно провеждане на пробите с оглед фактическата степен на завършеност на СМР: не е направил предложение по отношение на: съставящите ги фактори и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана, съгласно минимално заложеното изискване на възложителя, а именно: - обхват, план и конкретни действия, свързани с реализация на изведените мерки, вкл. съставлящите ги фактори и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана; -да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености; -мерки в случай на неуспешни проби (т.е. резултати от проби, които не доказват експлоатационната годност на обекта или негова част): не е направил предложение по отношение на:-да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености; -за Мерки(тип 3), отнасящи се до спазване на наличния финансов ресурс: -мерки, целящи избягване или минимизиране размера на претендираните суми, чиито източник са непредвидените разходи като част от офертата на съответния участник: не е направил предложение по отношение на: съставящите ги фактори и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана, съгласно минимално заложеното изискване на възложителя, а именно: - обхват, план и конкретни действия, свързани с реализация на изведените мерки, вкл. съставлящите ги фактори и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана; -да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености

2. В част Организация за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката (Приложение 2):

2.1. Дейности за изпълнението на предмета на поръчката, като са обхванати всички работи и технологични процеси, необходими за изпълнението предмета на поръчката, отчитайки времето за тяхното изпълнение, включително подготовителни работи (мобилизация), работи по изпълнението на СМР, тествания (в приложимите случаи), въвеждане на строежа в експлоатация, както и всички други съпътстващи работи, необходими за постигане целите на предмета на поръчката- участника не е направил предложение по отношение на тествания и въвеждане на строежа в експлоатация

2.2. Организацията на строителната площадка, както в периода на подготовка и изграждане на временното строителство, така и в периода на същинското строителство, включително на доставките и складирането на материалите и строителните продукти, като същата е съобразена с предложението за изпълнение на основните дейности/СМР и гарантира осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност на обекта - участника не е представил Организацията на строителната площадка в периода на същинското строителство, като същата е съобразена с предложението за изпълнение на основните дейности/СМР и гарантира осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност на обекта

2.3. Представен качествен и количествен анализ на дефинираните от Възложителя рискове и направена оценка на вероятността за проявлението и степента на въздействие, които могат да предизвикат затруднения в планираната организация на изпълнението на дейностите от предмета на поръчката, както и предложена програма (относими към обекта) за управление на риска, включваща мерки за недопускане/предотвратяване на риска, в приложимите случаи, съответно обосновка за невъзможността да се предприемат

подобни мерки в конкретния случай; мерки за преодоляване на риска, в случай на неговото настъпване- участника не е Представил качествен и количествен анализ на дефинираните от Възложителя рискове

3. В част План за осигуряване на гаранционната поддръжка и устойчивост на обекта (Приложение 8)

- не е направил описание на техническия капацитет, необходимите ресурси

- не е представил оценка на рискове, свързани с неправилна експлоатация, намеса на трети страни и препоръки за преодоляването им.

ВЪВ ВРЪЗКА С ГОРЕЦИТИРАНИТЕ КОНСТАТАЦИИ И МОТИВИ ОТНОСНО съдържанието на техническото предложение на участника КОМИСИЯТА КОНСТАТИРА, ЧЕ ЗА ПРЕДСТАВЕНОТО ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПРИЛОЖЕН КРИТЕРИЯ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ, ПРЕДВИД ЧЕ НЕ ОТГОВАРЯ НА Първа степен на оценяване, и офертата не съдържа в себе си задължителен компонент по съответните приложения към техническото предложение предложен от участника и представляващ базово/минимално изискване по всеки един показател, а именно :

Представеното предложение по подпоказател „КТП1: Предлаган подход за качествено изпълнение на поръчката“ не отговаря първа степен на оценяване, офертата не съдържащи в себе си следните задължителни компоненти по съответните приложения към техническото предложение предложен от участника и представляващ базово/минимално изискване по всеки един показател и липсва една или повече от минимално изискуемите условия/хипотези за поставяне на 5 точки, а именно:

КТП1А-Първа степен на оценяване, за оферти съдържащи в себе си задължителен компонент по съответните

приложения към техническото предложение предложен от участниците и представляващ базово/минимално изискване по всеки един показател

1. Подход за качествено изпълнение в който се установява, че участникът е направил анализ на техническата спецификация и действащото законодателство и е представил подход за качествено изпълнение на дейностите и СМР и
2. Технология на изпълнение на строително-монтажните работи (СМР), технологичните процеси и последователността на извършване на СМР при съблюдаването на общите изисквания за безопасни и здравословни условия на труд в строителството, като са обхванати всички дейности, технологични процеси и доставка на основните материали, необходими за изпълнението предмета на поръчката, отчитайки мерките за гарантиране на качество произтичащи пряко от обхвата и съдържанието на Техническите спецификации, както и разпоредбите на действащото законодателство и
3. Мерки за осигуряване на качество при изпълнение на строителството :

За всяка от базовите мерки предложението отговаря едновременно на следните условия:

- предложение за обхват, план и конкретни действия, свързани с реализация на изведените мерки, вкл. съставлящите ги фактори и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана

и

- Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество при изпълнение на настоящата обществена поръчка

и


- Входящ контрол от страна на персонала, отговарящ за контрола на качеството при логистиката, свързана с поръчване и получаване на материали и други продукти за строежа, както и контрол на качеството на труда по Мерки(тип 1). Тези мярки следва да гарантира, че на строежа няма да се вложат материали, изделия и/или други стоки, имащи явни или скрити дефекти и че СМР ще бъдат изпълнени с необходимото качество според инвестиционния проект, действащите стандарти и добри практики. и да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености	Представеното предложение по подпоказател „КТП2: Организация за изпълнение на дейностите“ не отговаря първа степен на оценяване, офертата не съдържащи в себе си следните задължителни компоненти по съответните приложения към техническото предложение предложен от участника и представляващ базово/минимално изискване по всеки един показател и липсва една или повече от минимално изискуемите условия/хипотези за поставяне на 5 точки, а именно:	КТП2А-Първа степен на оценяване, за оферти съдържащи в себе си задължителен компонент по съответните приложения към техническото предложение предложен от участниците и представляващ базово/минимално изискване по всеки един показател 1. Дейности за изпълнението на предмета на поръчката, като са обхванати всички работи и технологични процеси, необходими
---	---	--

за изпълнението предмета на поръчката, отчитайки времето за тяхното изпълнение, включително подготовителни работи (мобилизация), работи по изпълнението на СМР, тествания (в приложимите случаи), въвеждане на строежа в експлоатация, както и всички други съпътстващи работи, необходими за постигане целите на предмета на поръчката и

3. Организацията на строителната площадка, както в периода на подготовката ѝ и изграждане на временното строителство, така и в периода на същинското строителство, включително на доставките и складирането на материалите и строителните продукти, като същата е съобразена с предложението за изпълнение на основните дейности/СМР и гарантира осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност на обекта и

6. Представен качествен и количествен анализ на дефинираните от Възложителя рискове и направена оценка на вероятността за проявяването и степента на въздействие, които могат да предизвикат затруднения в планираната организация на изпълнението на дейностите от предмета на поръчката, както и предложена програма (относими към обекта) за управление на риска, включваща мерки за недопускане/предотвратяване на риска, в приложимите случаи, съответно обосновка за невъзможността да се предприемат подобни мерки в конкретния случай; мерки за преодоляване на риска, в случай на неговото настъпване;

Съгласно критерия за възлагане „За оферти, за които не е налице изпълнението на базовите изисквания за присъждане на минимален брой точки независимо по кой подпоказател се отстранява от участие.“ Представеното Техническо предложение НЕ отговоря на минимално поставените изисквания за съдържание и наличие на задължителни елементи в своята

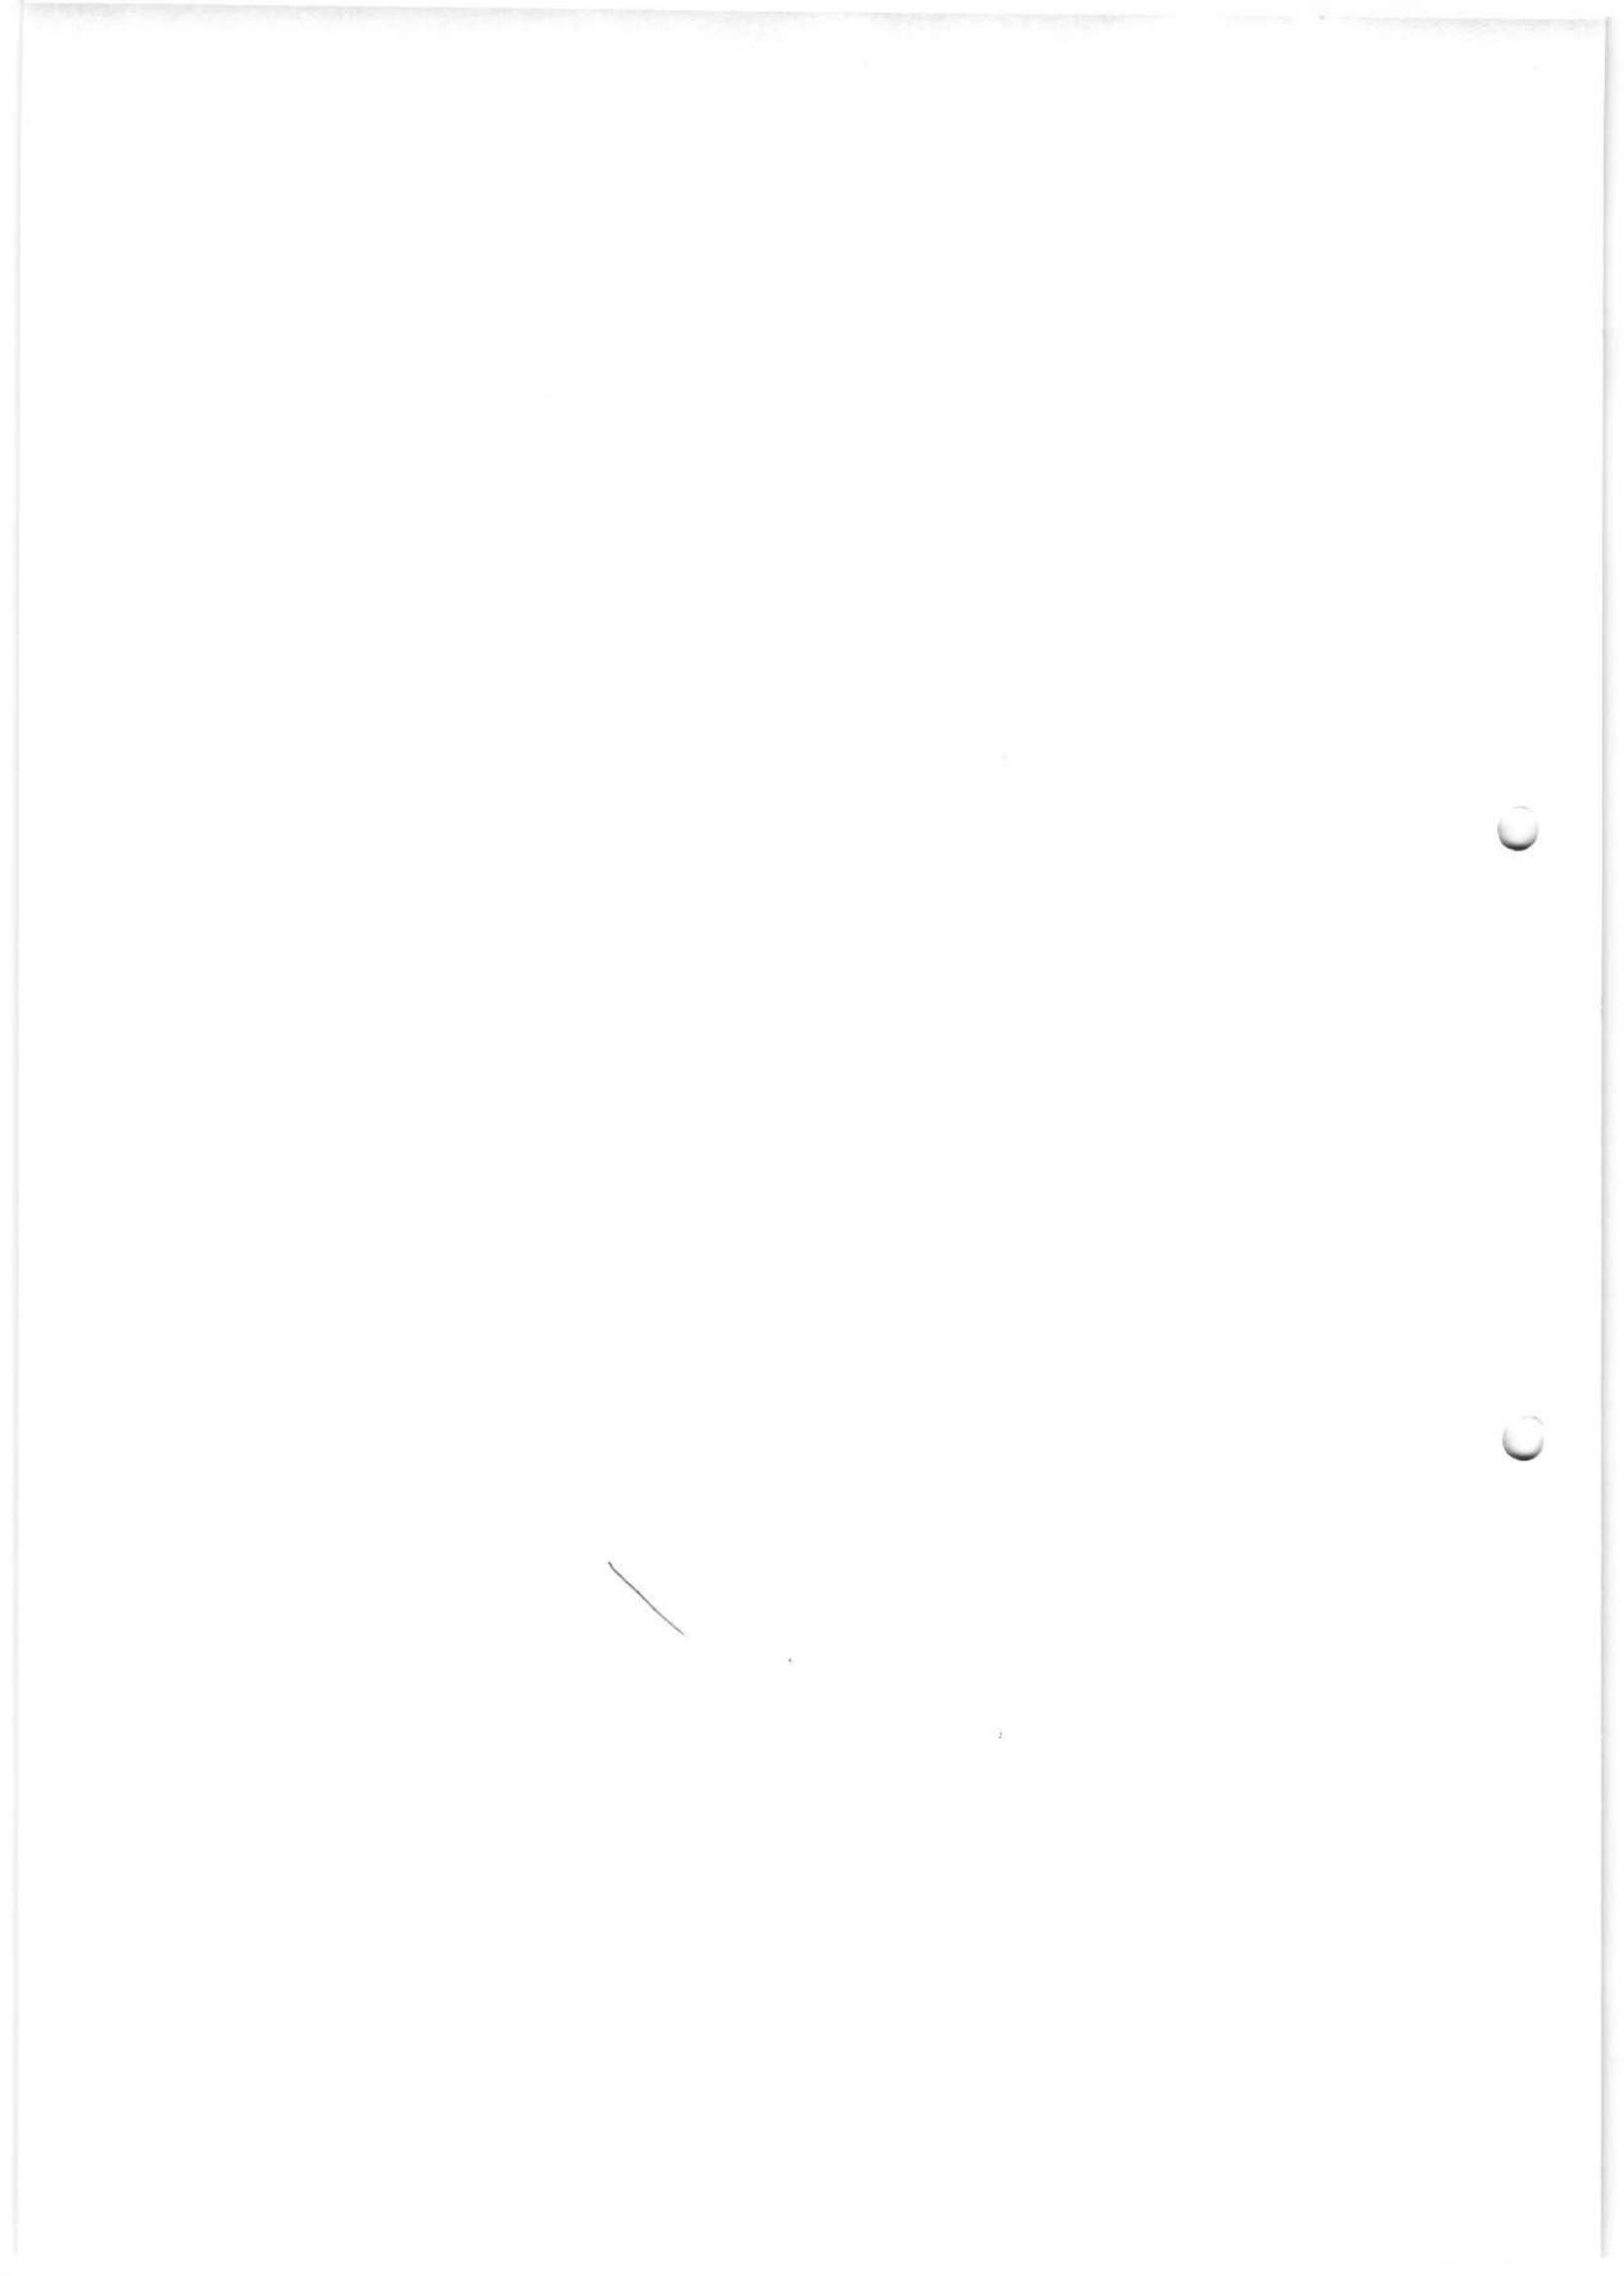

„Реконструкция на вътрешно-разпределителна водопроводна мрежа за кв. Рилци – Етап I, гр. Добрич“ - Приложение 1 - ДЗД „Аква Билд - Рилци“

последователност спрямо минималните изисквания на техническата спецификация и спрямо изискванията на документацията. Представеното техническо предложение НЕ се допуска до оценяване по следващи степени предвид, че не покрива Първа степен на оценяване, поради гореситираните мотиви.

чл. 37
ЗОП във
вр. с рег.
2016/679

Председател:
Николай Великов

чл. 37
ЗОП във
вр. с рег.
2016/679

Членове:
Ивайло Иванов

чл. 37
ЗОП
във
вр. с
рег.
2016/679

.....
инж. Орлин Първулов
