


Участник „ЛЮНИК“ ЕООД е представил:

1. Заявява, че ще изпълни поръчката в съответствие с всички нормативни изисквания за този вид дейност, както и в съответствие с изискванията на възложителя, посочени в техническата спецификация, обявлението и указанията за възлагане на обществената поръчка.
2. Гарантира, че е в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с предложението ни, изискванията на Възложителя, действащото законодателство и представения проект на договор.
3. Срок на договора/срок за изпълнение:
 - (1)Срокът на договора: до 12 месеца от датата на сключване на договора за изпълнение.
 - (2) Срок на изпълнение: Изпълнението на обществената поръчка е със срок за изпълнение до 6 месеца. Срокът започва да тече от датата на съставяне и подписване на Протокол обр.2/2а по Наредба №3 от 31.07.2003г. за откриване на строителна площадка и е до Датата на подписване на Констативен Акт обр. 15.
4. Предлаган подход за качествено изпълнение на поръчката (Приложение 1)
5. Организация за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката (Приложение 2)
6. Линеен график за изпълнение на предмета на поръчката (Приложение 3)
- 7.Комуникация и координация при изпълнение на поръчката (Приложение 4)
- 8.Социални характеристики, свързани с изпълнението на поръчката (Приложение 5)
9. Мерки за опазване на околната среда (Приложение 6)

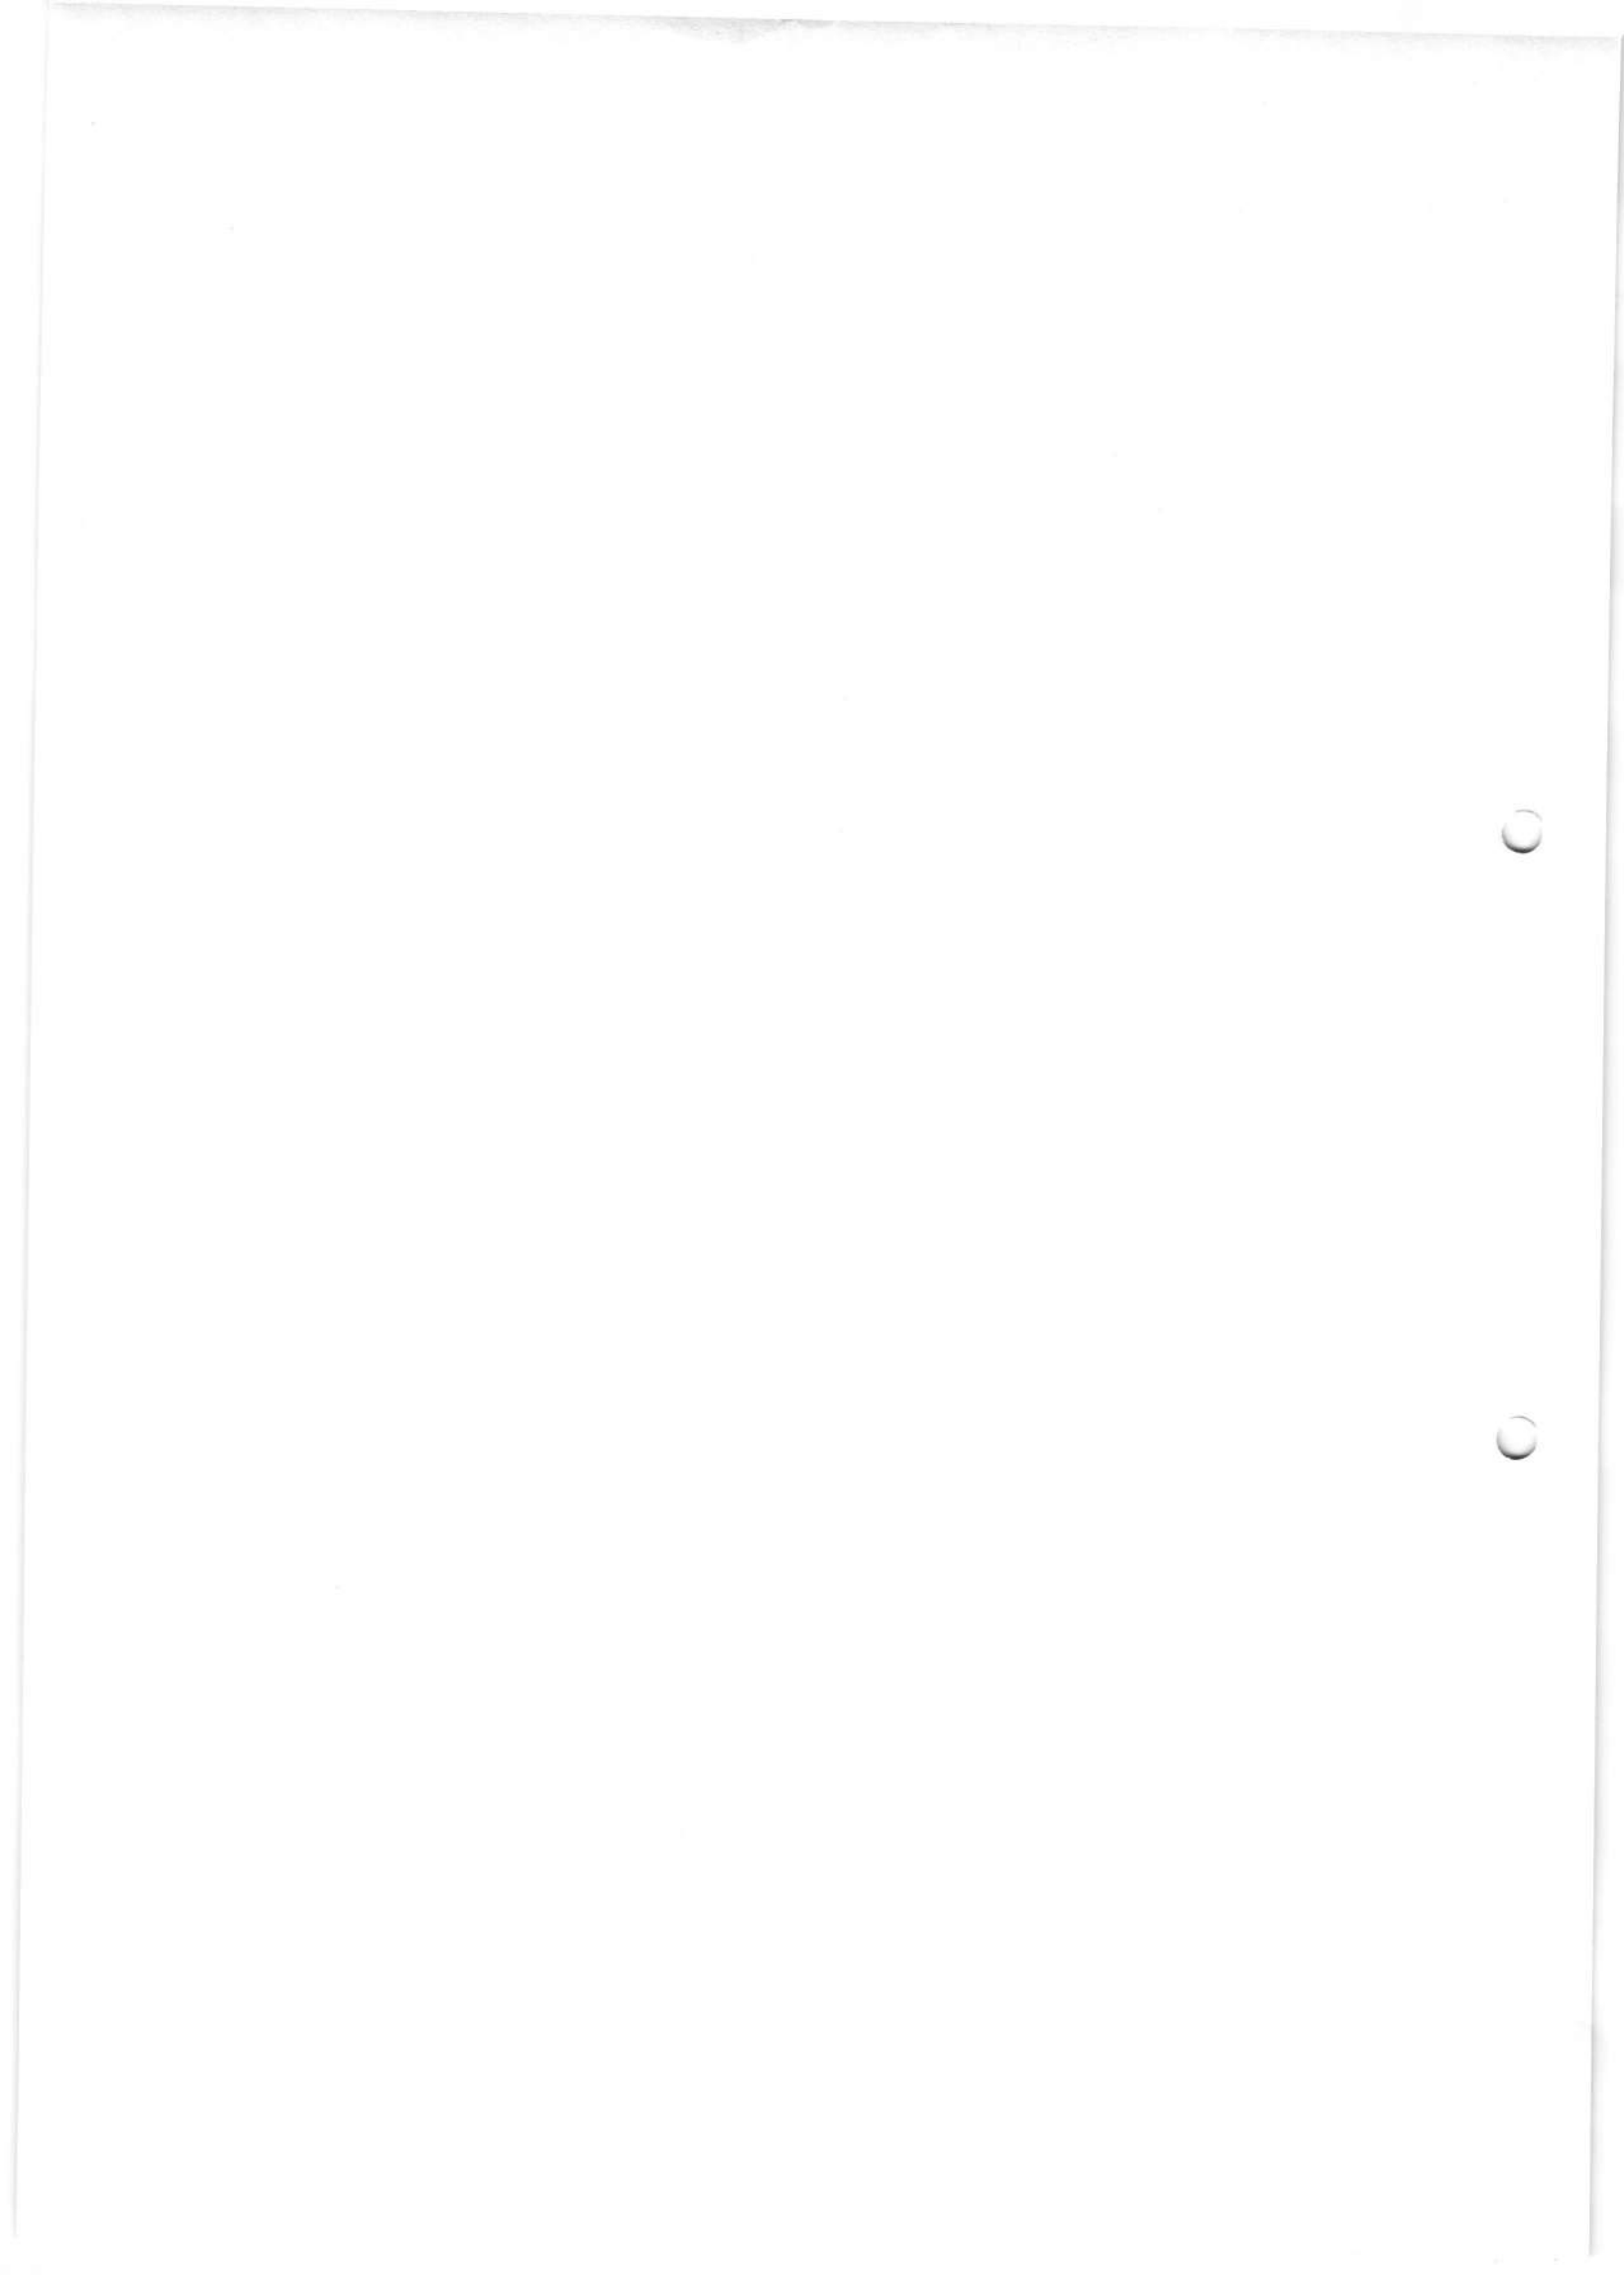

10. Предложение за управление на риска (Приложение 7)

11. План за осигуряване на гаранционната поддръжка и устойчивост на обекта (Приложение 8)

12. Гаранционни срокове: минималните срокове за видовете дейности съгласно Наредба №2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, в случаите когато определените минимални срокове превишават 60 месеца, във всички останали случаи гаранционния срок е 60 месеца.

13. Декларира, че:

Всички дейности ще бъдат съгласувани с Възложителя и при необходимост коригирани и ще се изпълняват в обем и съдържание съгласно Техническите спецификации, приложенията към тях и настоящата оферта.

Са запознати с документацията за участие и приемаме без възбращения условията и изискванията.

В случай, че бъдем определени за изпълнители, ние ще представим всички документи, необходими за подписване на договора съгласно документацията за участие в посочения срок от възложителя.

14. Удостоверява и потвърждава, че:

- Ще подписва съответните актове и протоколи по време на строителството, съгласно Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и договорните условия на договора;

- Строително-монтажните работи (СМР/СРР) ще бъдат изпълнени в съответствие със съществените изисквания към строежите, определени чрез Закона за устройство на територията (ЗУТ), както и другото приложимо действащо законодателство в областта на строителството, техническите спецификации, инвестиционния проект и изискванията на Възложителя;
- Екзекутивната документация и необходимите изпитания за пускане в експлоатация, когато и където е приложимо, се осигуряват за наша сметка.
- Разходите за консумация на електрическа енергия, вода и други консумативи, които са необходими за изграждане и въвеждане на обекта в експлоатация, са за наша сметка.

15. Декларира, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд;

Констатации на комисията относно съдържанието на техническото предложение на участника спрямо Първа степен на оценяване, за оферти съдържащи в себе си задължителен компонент по съответните приложения към техническото предложение предложен от участника и представляващ базово/минимално изискване по всеки един показател:

КТП1: Предлагаан подход за качествено изпълнение на поръчката
--

КТП1А-Първа степен на оценяване, за оферти съдържащи в себе си задължителен компонент по съответните приложения към техническото предложение предложение предложен от участниците и представляващ базово/минимално изискване

по всеки един показател

1. Минимално изискване:Подход за качествено изпълнение в който се установява, че участникът е направил анализ на техническата спецификация и действащото законодателство и е представил подход за качествено изпълнение на дейностите и СМР и

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА, НО ИМА НЕСЪОТВЕТСТВИЯ СПРЯМО ИЗСКВАНИЯТА НА ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ , ПРЕДВИД СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:Участника е представил въведение (общи положения), който включва наименования и обхват на поръчката; след това е представил анотация (представяне) на дружеството; след това участника е предложил етапи на изпълнение, а именно: Етап I – Подготвителни и мобилизационни дейности:Мобилизация за изпълнение на строително монтажните работи;Временно строителство; Етап II –Строително – монтажни работи;Демонтажни работи;Доставка на необходимите материали и оборудване;Изпълнение на строителството;Съставяне на протоколи и актове по време на строителството;ЗБУТ;Управление на отпадъците; Етап III – Предаване на строежа е констативен акт; участника е представил описание на отделните етапи на изпълнение ;

от направеното предложение се установява, че участника е представил подход за качествено изпълнение, но не се установява участника да е направил направил анализ на техническата спецификация и действащото законодателство, съгласно минимално заложеното изискване на възложителя от документацията за участие , а именно:Подход за качествено изпълнение в който се установява, че участникът е направил анализ на техническата спецификация и действащото законодателство и е представил подход за качествено изпълнение на дейностите и СМР

2. Минимално изискване:Технология на изпълнение на строително-монтажните работи (СМР), технологичните процеси и

последователността на извършване на СМР при съблюдаването на общите изисквания за безопасни и здравословни условия на труд в строителството, като са обхванати всички дейности, технологични процеси и доставка на основните материали, необходими за изпълнението предмета на поръчката, отчитайки мерките за гарантиране на качество произтичащи пряко от обхвата и съдържанието на Техническите спецификации, както и разпоредбите на действащото законодателство и

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА, НО ИМА НЕСЪОТВЕТСТВИЯ СПРЯМО ИЗСКВАНИЯТА НА ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ, ПРЕДВИД СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

Участника е представил описание на видовете СМР и технология на изпълнение на СМР, в която е обхванал: Подготовка - сигнализиране и поставяне на пътни знаци, геодезическо трасиране на осите и разкриване на подземни комуникации; Демонтажни работи; Дооформяне на траншеен изкоп ръчно; Изкопни работи; Плътнo укрепване и разкрепване на изкопи с дълбочина до 2 м в земни почви; Ръчно подравняване на дъното на изкопа; Полагане на тръби, монтаж на фасонни части и спирателна арматура, монтаж на сградни водопроводни отклонения, пожарни хидранти; Сградни отклонения; Засипване и уплътняване на обратния насип (стартови и изходни шахти и други технологични отвори; Доставка и полагане на трошенокаменна настилка; Асфалтови работи; Отводняване; Изпитване на водопровода; Дезинфекция на водопровода; Почистване на работните площадки

Участника е посочил, че Основните материали, необходими за изграждането на обекта включват: Водопроводни тръби и фасонни части РЕ-HD, РЕ100, с номинално налягане PN10, придружени с СЕ сертификат или Сертификат за съответствие на продукта. ISO сертификат за производителя или еквивалентен. Писто за гаранцията от производителя. Оторизационно писто от производителя за дистрибутора. Каталози на български език с техническите данни на продуктите. Ръководство за монтаж и експлоатация на продуктите на български език; Бетонови смеси; Армировъчна

стомана; Минерални материали – баластра, трошен камък за оформяне на пътното легло и основните пластове; Трогоарни плочи и бордюри; Асфалтобетонкови смеси ; описал е Доставка на необходимите материали за започване на СМР; Последователност и разпределението във времето на доставките на строителни материали; Изисквания към доставка на материалите, с което не е изпълнил минимално заложеното изискване на възложителя , а именно: Следва да се обхванат и доставка на основните материали (Тръби PE-HD, PE100, PN10; Спирателен кран; Пожарен хидрант ф80 надземен; Автоматичен въздушник; Ел. заваряема водовземна скоба; Лъсцова почва за засипване; Нестандартна баластра; Бетонни плочи в тротоар; Бетонни бордюри с размер 18/35/50(100), съгласно БДС 624-87; Битумизирана основа съгласно БДС 4132-90 с минимално уплътнение 97%; Материал за основа с различна ширина и дебелина на пласта с CBR не по-малък от 80 % при плътност 98 % модифицирана суха плътност по АASHTO; Плътен асфалтобетон тип А, марка II, съгласно БДС 4132 за износващ пласт с дебелина в уплътнено състояние 4 см.) необходими за изпълнението предмета на поръчката, отчитайки мерките за гарантиране на качество произтичащи пряко от обхвата и съдържанието на Техническите спецификации, както и разпоредбите на действащото законодателство, участник не е обхванал Спирателен кран; Пожарен хидрант ф80 надземен; Автоматичен въздушник;

Ел. заваряема водовземна скоба; Лъсцова почва за засипване

Участника в табличен вид е представил последователността на изпълнение, като е посочил вид СМР, начало, край и продължителност

по отношение на изискването на възложителя за съблюдаване на общите изисквания за безопасни и здравословни условия на труд в строителството, участника е посочил че Преди започване на работа на обекта като част от дейностите включени във първи етап предвиждаме подробно запознаване с План за безопасност и здраве при работа съгласно

Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

3. Минимално изискване: Мерки за осигуряване на качество при изпълнение на строителството :

За всяка от базовите мерки предложението отговаря едновременно на следните условия:

-предложение за обхват, план и конкретни действия, свързани с реализация на изведените мерки, вкл. съставлящите ги фактори и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана

и

- Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество при изпълнение на настоящата обществена поръчка

и

- Входящ контрол от страна на персонала, отговарящ за контрола на качеството при логистиката, свързана с поръчване и получаване на материали и други продукти за строежа, както и контрол на качеството на труда по Мерки(тип 1). Тези мярки следва да гарантира, че на строежа няма да се вложат материали, изделия и/или други стоки, имащи явни или скрити дефекти и че СМР ще бъдат изпълнени с необходимото качество според инвестиционния проект, действащите стандарти и добри практики.

и

да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености

Като минимум всеки един от участниците следва да разгледа мерките, посочени по-долу, които следва да се възприемат като базови изисквания на Възложителя:

-Мерки(тип 1), свързани с изпълнение на СМР - предвид обхвата на възлаганите СМР, както и относителната сложност на обекта в неговата:

1). мерки, свързани с ритмичност и достатъчност при доставка на необходимите материали;
2). мерки, свързани с осигуряване на материали, чиито качества и характеристики съответстват на договорните изисквания, вкл. тези, произтичащи от съдържанието на одобрения проект;

3). мерки, касаещи замяна на техника и механизация в случай, че същата е дефектирала в процеса на изпълнение на СМР;

4). мерки, отнасящи се до действията на участника в случай на изключително неблагоприятни климатични условия;

5). мерки, отнасящи се до действията на участника при изпълнение и документиране на СМР подлежащи на закриване;

- Мерки(тип 2), отнасящи се до извършване на тестове (проби) след завършване на СМР - за да е възможно законосъобразното завършване на обекта и последващото му въвеждане в експлоатация бъдещият изпълнител следва да извърши тестове/проби (независимо дали единични или комплексни), доказващи експлоатационната годност на

изградените мрежи и съоръжения. Последното е съществен елемент, свързан с цялостното спазване на определения чрез договора срок:

- 1). мерки за навременно провеждане на пробите с оглед фактическата степен на завършеност на СМР;
- 2). мерки в случай на неуспешни проби (т.е. резултати от проби, които не доказват експлоатационната годност на обекта или неговата част);

-Мерки(тип 3), отнасящи се до спазване на наличния финансов ресурс

- 1). мерки, целящи избягване или минимизиране размера на претендираните суми, чиито източници са непредвидените разходи като част от офертата на съответния участник;
- 2). мерки, свързани с избягване увреждане на чуждо имущество и последващи финансови претенции от тях към възложителя.

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА, НО ИМА НЕСЪОТВЕТСТВИЯ СПРЯМО ИЗСКВАНИЯТА НА ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ, ПРЕДВИД СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

Участника е представил

Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество при изпълнение на СМР-Предложение относно обхвата и аспектите на проявление на мярката; Текущо прилагане на мярката в процеса на изпълнение- Метод на контрол на строителните дейности

Входящ контрол от страна на персонала, отговарящ за контрола на качеството при логистиката, свързана с поръчване и получаване на материали и други продукти за строежа

Предложение относно обхвата и предмета на мярката Текущо прилагане на мярката в процеса на изпълнение Мерки за извършване на входящия контрол за качество и съответствие на материалите с предвидените за използване	Контрол на изпълнението на СМР от направеното предложение Комисията констатира следното по -Мерки(тип 1), свързани с изпълнение на СМР - предвид обхвата на възлаганите СМР, както и относителната сложност на обекта в неговата: по 1). мерки, свързани с ритмичност и достатъчност при доставка на необходимите материали; Участника е направил предложение по посочената мярка , каято да отговаря на следните условия: - предложение за обхват, план и конкретни действия, свързани с реализация на изведените мерки, вкл. съставлящите ги фактори и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана и - Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество при изпълнение на настоящата обществена поръчка и - Входящ контрол от страна на персонала, отговарящ за контрола на качеството при логистиката, свързана с поръчване и получаване на материали и други продукти за строежа, както и контрол на качеството на труда по Мерки(тип 1). Тези мерки следва да гарантира, че на строежа няма да се вложат материали, изделия и/или други стоки, имащи явни или скрити дефекти и че СМР ще бъдат изпълнени с необходимото качество според инвестиционния
---	--

проект, действащите стандарти и добри практики.

и

да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености

2). мерки, свързани с осигуряване на материали, чиито качества и характеристики съответстват на договорните изисквания, вкл. тези, произтичащи от съдържанието на одобрения проект;

Участника е направил предложение по посочената мярка , както да отговаря на следните условия: - предложение за обхват, план и конкретни действия, свързани с реализация на изведените мерки, вкл. съставлящите ги фактори и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана

и

- Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество при изпълнение на настоящата обществена поръчка

и

- Входящ контрол от страна на персонала, отговарящ за контрола на качеството при логистиката, свързана с поръчване и получаване на материали и други продукти за строежа, както и контрол на качеството на труда по Мерки(тип 1). Тези мерки следва да гарантира, че на строежа няма да се вложат материали, изделия и/или други стоки, имащи явни или скрити дефекти и че СМР ще бъдат изпълнени с необходимото качество според инвестиционния проект, действащите стандарти и добри практики.

Участника е посочил в табличен вид превантивен контрол- За варо-циментовите мазилки, влагани в процеса на строителството, задължително се изисква декларация за съответствие и сертификат за качество. Всички количества доставени на обекта варо-циментови разтвори се вписват от техническия ръководител в „Дневник на бетонните доставките“.

предвид , че с проекта не се предвижда изпълнението на варо-циментовите мазилки и варо-циментови разтвори, комисията счита , че не е изпълнено условието да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености

по 3). мерки, касаещи замяна на техника и механизация в случай, че същата е дефектирала в процеса на изпълнение на СМР;


Участника не е направил предложение по посочената мярка , каято да отговаря на следните условия: - предложение за обхват, план и конкретни действия, свързани с реализация на изведените мерки, вкл. съставлящите ги фактори и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана

и

- Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество при изпълнение на настоящата обществена поръчка

и

- Входящ контрол от страна на персонала, отговарящ за контрола на качеството при логистиката, свързана с

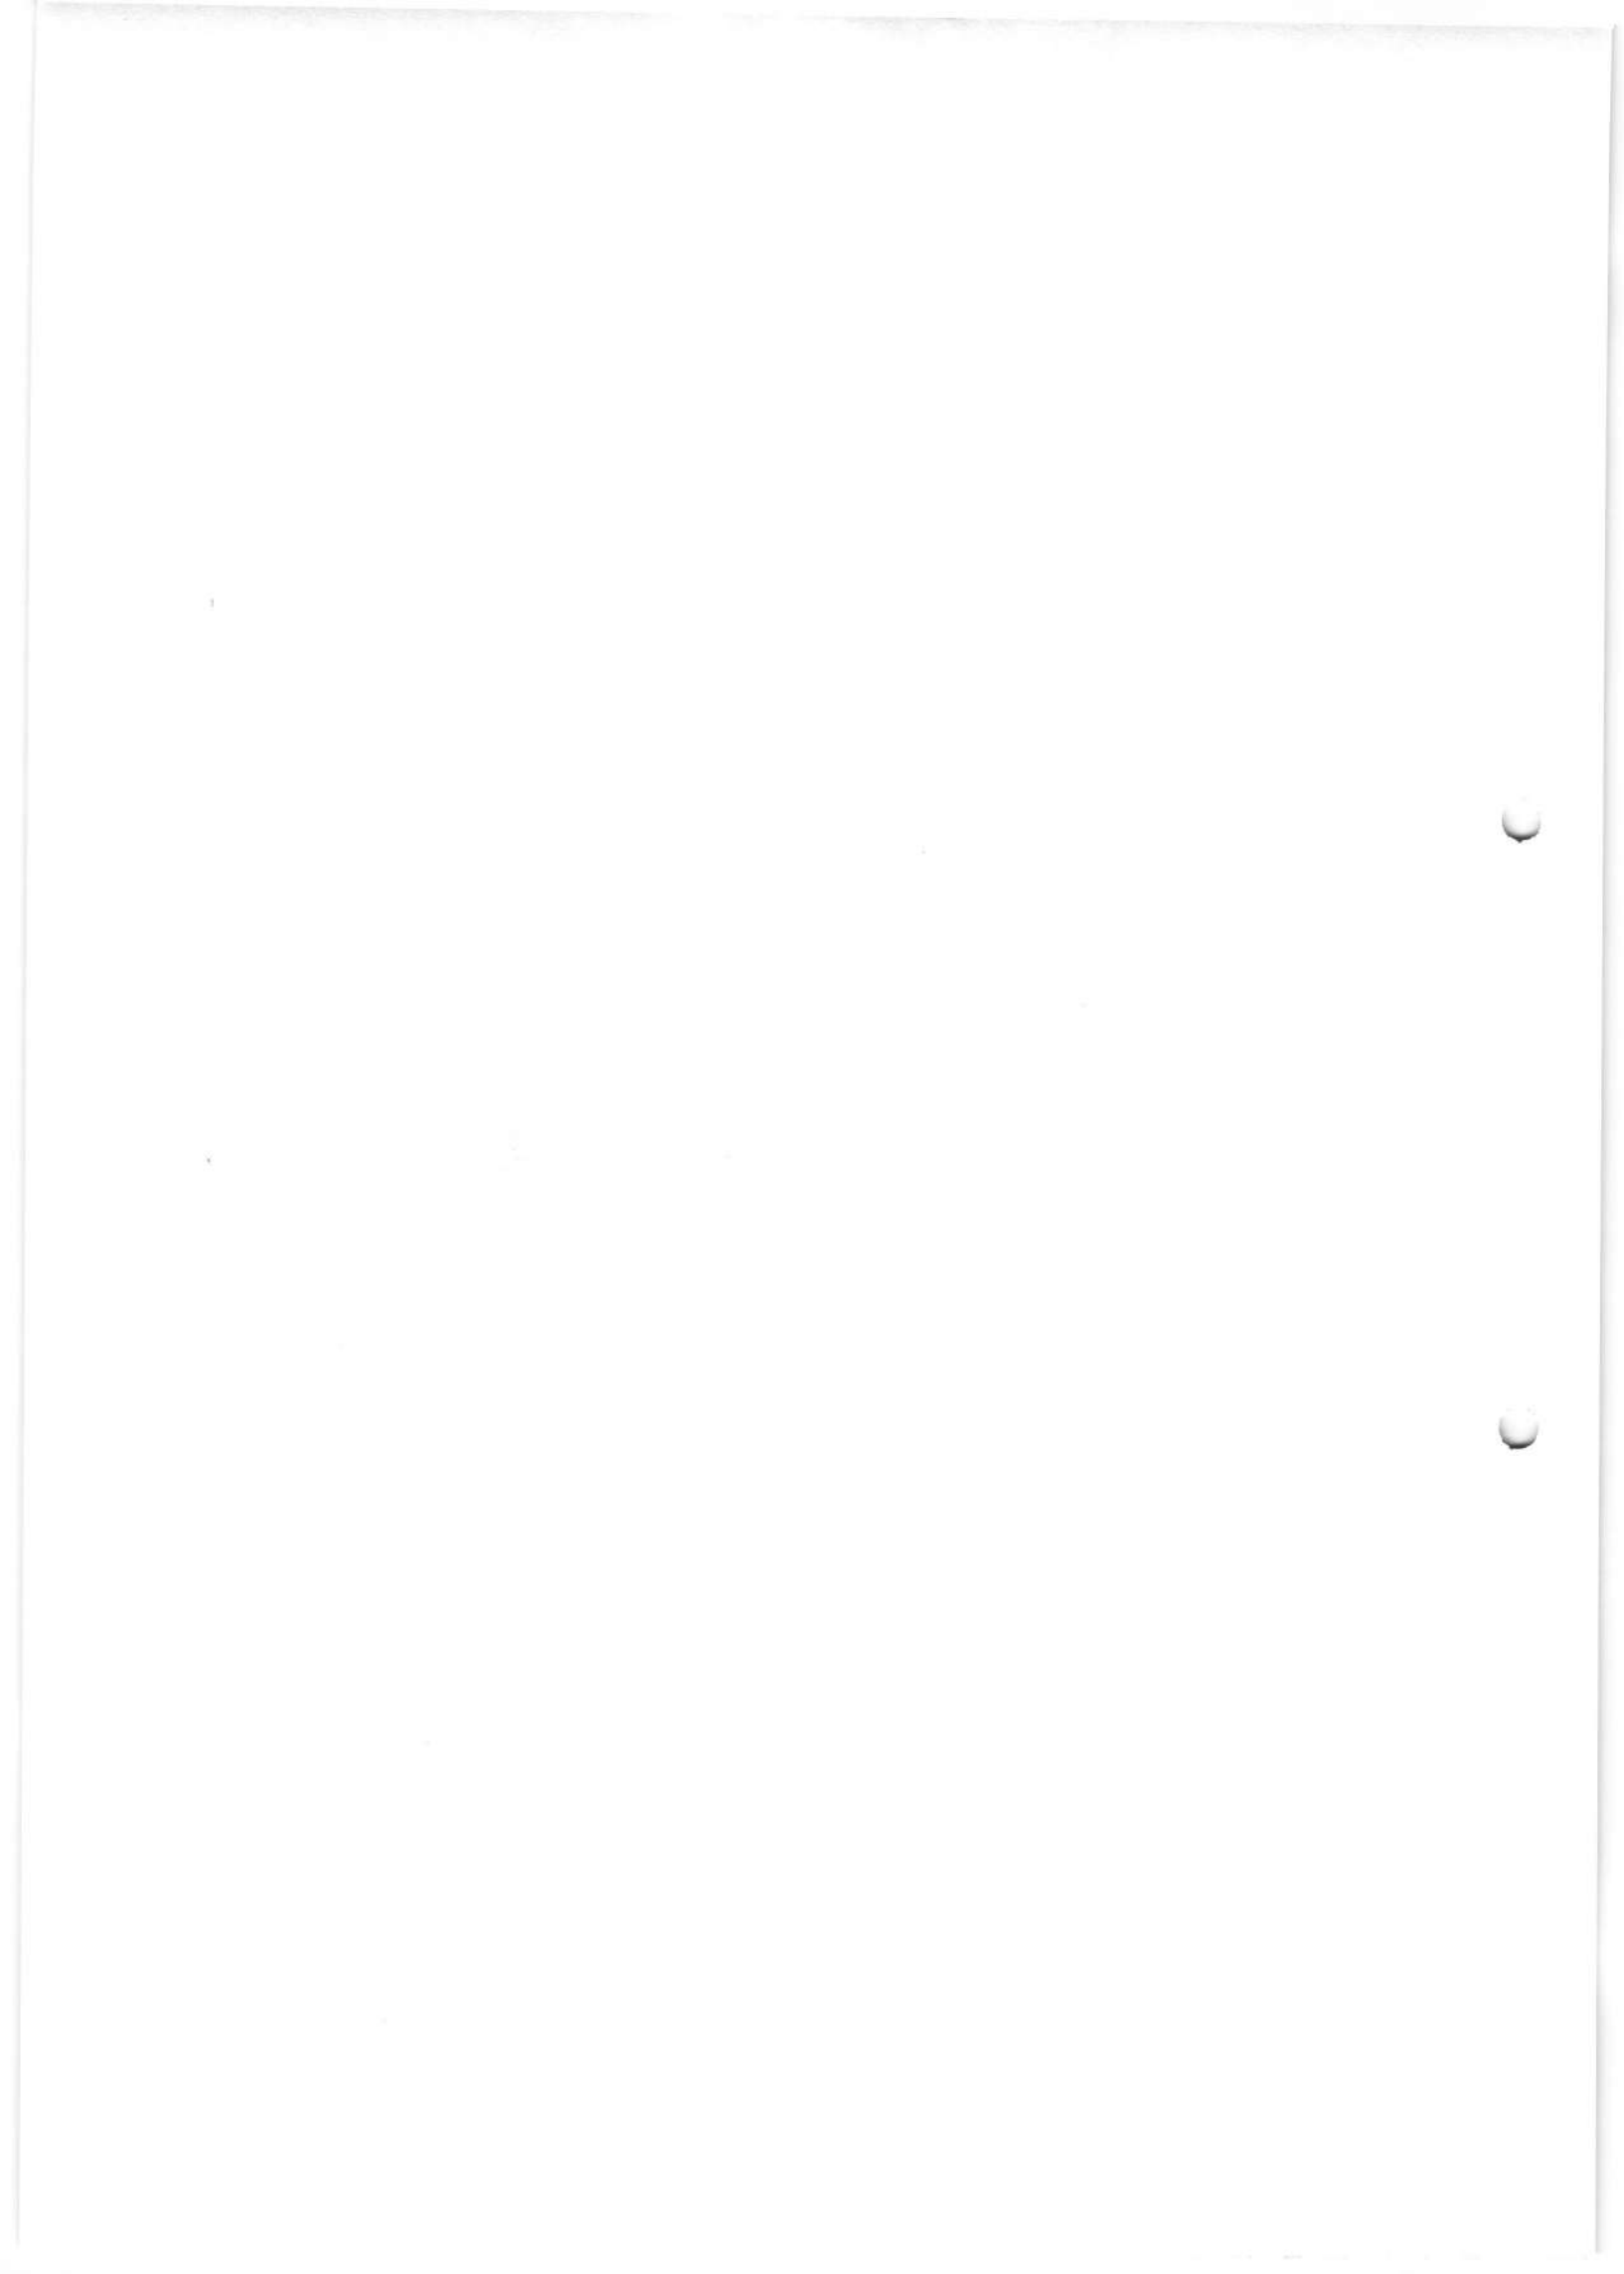

поръчване и получаване на материали и други продукти за строежа, както и контрол на качеството на труда по Мерки(тип 1). Тези мярки следва да гарантира, че на строежа няма да се вложат материали, изделия и/или други стоки, имащи явни или скрити дефекти и че СМР ще бъдат изпълнени с необходимото качество според инвестиционния проект, действащите стандарти и добри практики.

и

да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености

4). мерки, отнасящи се до действия на участника в случай на изключително неблагоприятни климатични условия;

Участника не е направил предложение по посочената мярка , както да отговаря на следните условия: - предложение за обхват, план и конкретни действия, свързани с реализация на изведените мерки, вкл. съставлящите ги фактори и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана

и

- Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество при изпълнение на настоящата обществена поръчка

и

- Входящ контрол от страна на персонала, отговарящ за контрола на качеството при логистиката, свързана с поръчване и получаване на материали и други продукти за строежа, както и контрол на качеството на труда по Мерки(тип 1). Тези мярки следва да гарантира, че на строежа няма да се вложат материали, изделия и/или други стоки,

имащи явни или скрити дефекти и че СМР ще бъдат изпълнени с необходимото качество според инвестиционния проект, действащите стандарти и добри практики.

и

да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености

5). мерки, отнасящи се до действия на участника при изпълнение и документирание на СМР подлежащи на закриване;

Участника не е направил предложение по посочената мярка , каято да отговаря на следните условия: - предложение за обхват, план и конкретни действия, свързани с реализация на изведените мерки, вкл. съставлящите ги фактори и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана

и

- Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество при изпълнение на настоящата обществена поръчка

и

- Входящ контрол от страна на персонала, отговарящ за контрола на качеството при логистиката, свързана с поръчване и получаване на материали и други продукти за строежа, както и контрол на качеството на труда по Мерки(тип 1). Тези мерки следва да гарантира, че на строежа няма да се вложат материали, изделия и/или други стоки, имащи явни или скрити дефекти и че СМР ще бъдат изпълнени с необходимото качество според инвестиционния проект, действащите стандарти и добри практики.



и

да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености

- Мерки(тип 2), отнасящи се до извършване на тестове (проби) след завършване на СМР - за да е възможно законосъобразното завършване на обекта и последващото му въвеждане в експлоатация бъдещият изпълнител следва да извърши тестове/проби (независимо дали единични или комплексни), доказващи експлоатационната годност на изградените мрежи и съоръжения. Последното е съществен елемент, свързан с цялостното спазване на определения чрез договора срок:

1). мерки за навременно провеждане на пробите с оглед фактическата степен на завършеност на СМР;

Участника не е направил предложение по посочената мярка , която да отговаря на следните условия: - предложение за обхват, план и конкретни действия, свързани с реализация на изведените мерки, вкл. съставлящите ги фактори и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана

и

- Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество при изпълнение на настоящата обществена поръчка

и

да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености

2). мерки в случай на неуспешни проби (т.е. резултати от проби, които не доказват експлоатационната годност на обекта или негова част);

Участника не е направил предложение по посочената мярка , каято да отговаря на следните условия: - предложение за обхват, план и конкретни действия, свързани с реализация на изведените мерки, вкл. съставлящите ги фактори и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана

и

- Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество при изпълнение на настоящата обществена поръчка

и

да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености

-Мерки(тип 3), отнасящи се до спазване на наличния финансов ресурс

1). мерки, целящи избягване или минимизиране размера на претендираните суми, чиито източник са непредвидените разходи като част от офертата на съответния участник;

Участника не е направил предложение по посочената мярка , каято да отговаря на следните условия: - предложение за обхват, план и конкретни действия, свързани с реализация на изведените мерки, вкл. съставлящите ги фактори и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана

и

- Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество при изпълнение на настоящата обществена поръчка

и

да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености

2). мерки, свързани с избягване увреждане на чуждо имущество и последващи финансови претенции от тях към възложителя.

Участника не е направил предложение по посочената мярка , каято да отговаря на следните условия: - предложение за обхват, план и конкретни действия, свързани с реализация на изведените мерки, вкл. съставлящите ги фактори и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана

и

- Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество при изпълнение на настоящата обществена поръчка

и

да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености

	КТП2: Организация за изпълнение на дейностите
КТП2А-Първа степен на оценяване, за оферти съдържащи в себе си задължителен компонент по съответните приложения към техническото предложение предложен от участниците и представляващ базово/минимално изискване по всеки един показател 1. <u>Минимално изискване:</u> Дейности за изпълнението на предмета на поръчката, като са обхванати всички работи и технологични процеси, необходими за изпълнението предмета на поръчката, отчитайки времето за тяхното изпълнение, включително подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнението на СМР, тествания (в приложимите случаи), въвеждане на строежа в експлоатация, както и всички други съпътстващи работи, необходими за постигане целите на предмета на поръчката и	<u>ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:</u> Участника е обхванал етапите на изпълнение, които включват Етап I - Подготвителни и мобилизационни дейности; Подготовка на строителната площадка по документи, който обхваща преглед и анализ на следните документи: Сключеният договор за обществена поръчка; Техническата спецификация; Количествено-стойностна сметка; Организация за изпълнение на поръчката - Описание на отделните етапи за изпълнение на поръчката; Описание на основните видове СМР, тяхната продължителност и технологична последователност и обвързаността на отделните етапи и процеси; Методи за организация на строителството; Обосновка на ресурсите възможности на

участника, включително обезпечеността с трудови ресурси и механизация и транспортни средства; Описание на мероприятията по временна организация на движението, опазване на околната среда, мерките по безопасност на труда и мерките за намаляване на затрудненията на местното население по време на изпълнението на поръчката; Линеен график за изпълнение на предмета на поръчката; Наличие на всички необходими строителни книжа, в т.ч. : Инвестиционен проект, съгласуван и одобрен по реда на ЗУТ; Разрешение за строеж; изготвяне и представяне на РПОИС; организиране на среща; изготвяне на информационна табела; След подписването на Акт Образец 2а, ще започне изпълнението на временното строителство и мобилизация. Продължителност 10 календарни дни и ще включва: мобилизация и временно строителство, подготвителни работи, разпространяване на изготвените документи за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, предприемане на мерки за опазване на околната среда и др. Персоналът ще бъде транспортиран до гр.Добрич и запознат с обхвата на обекта. Необходимото оборудване, материали и механизация ще бъдат доставени на обекта за стартирането на работите; съгласуване План за предотвратяване и ликвидиране на пожари; План за предотвратяване и ликвидиране на аварии; План за евакуация на работещите и намиращите се на строителната площадка; Подготовка на строителната площадка на място- Устройване на временна строителна база; Временно водоснабдяване, ел.захранване и санитарни възли; Временна организация, безопасност на движението (ВОБД) по време на строителството; Ограждане и сигнализиране на работните участъци; Разчистване на работните участъци; Организиране на геодезични работи; Изясняване на подземните инфраструктури; Уведомяване на експлоатационното ВиК дружество; Доставка на материали; направил е описание на позициониране и съдържание на фургони /контейнери за нуждите на строителството; Противопожарно табло; Временна химическа тоалетна; Контейнери за отпадъци; Ограда - за ограничаване на достъпа на неоторизирани лица; Временна организация на движението по време на строителството; Ограждане и сигнализиране на работните участъци; Разчистване на работните участъци; Изграждане на геодезическа мрежа; Мониторинг на строителните работи и

окончателна проверка; Калиброване и изпробване; Хоризонтален и вертикален контрол; Уточняване на местоположението на подземните инфраструктури; Уведомяване на експлоатационното ВиК дружество; Доставка на материали; Доставка на необходимите материали за започване на СМР; Последователност и разпределението във времето на доставките на строителни материали; Изисквания към доставка на материалите; План за управление на строителните отпадъци /ПУСО/; Изготвяне на План за опазване на околната среда; Етап II - Изпълнение на строително-монтажните работи по „Реконструкция на вътрешно-разпределителна водопроводна мрежа за кв. Рилци – Етап I, гр. Добрич“- към този етап участника е посочил В рамките на Етап II от изпълнението на поръчката ще бъдат реализирани предвидените в рамките на проекта демонтажни и земни работи.

Етап II включва: Изпълнение на строителните и монтажните дейности от основното строителство при „Реконструкция на вътрешно-разпределителна водопроводна мрежа за кв. Рилци – Етап I, гр. Добрич“ в съответствие с Техническия/Работен проект, Техническата спецификация, изискванията на Възложителя - видовете СМР съгласно Количествено - стойностните сметки, както и тяхната последователност на изпълнение при спазване на приетите методи, технологии и организация на изпълнение; организация и подход на изпълнение - разпределение на ресурсите (човешки и технически); Изпълнение на мерки по безопасност и здраве; Осигуряване на временна организация на движение и др. Етап III - Предаване на строежа с констативен акт ; Измерване и приемане на извършените работи ; Одобрение на работите

от направеното предложение се установи следното, участника е представил Дейности за изпълнението на предмета на поръчката, като са обхванати всички работи и технологични процеси, необходими за изпълнението на предмета на поръчката, отчитайки времето за тяхното изпълнение, включително подготовителни работи (мобилизация), работи по изпълнението на СМР, тествания (в приложимите случаи), въвеждане на строежа в експлоатация, както и всички други съпътстващи работи, необходими за постигане целите на предмета на поръчката

2. Минимално изискване: Последователността на строителните процеси в зависимост от представения технологичен подход за постигането на целите на предмета на поръчката, включително чрез определяне на тяхната продължителност в съответствие с Техническите спецификации и

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

участника е представил Последователността на строителните процеси в зависимост от представения технологичен подход за постигането на целите на предмета на поръчката, включително чрез определяне на тяхната продължителност в съответствие с Техническите спецификации

3. Минимално изискване: Организацията на строителната площадка, както в периода на подготовката ѝ и изграждане на временното строителство, така и в периода на същинското строителство, включително на доставките и складирането на материалите и строителните продукти, като същата е съобразена с предложението за изпълнение на основните дейности/СМР и гарантира осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност на обекта и

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА, НО ИМА НЕСЪОТВЕТСТВИЯ СПРЯМО ИЗИСКВАНИЯТА НА ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ , ПРЕДВИД СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

Участника в е обхванал етапите на изпълнение, които включват Етап I - Подготвителни и мобилизационни дейности; Подготовка на строителната площадка по документи, който обхваща преглед и анализ на следните документи: Сключеният договор за обществена поръчка; Техническата спецификация; Количествено-стойностна сметка; Организация за изпълнение на поръчката - Описание на отделните етапи за изпълнение на поръчката;

Описание на основните видове СМР, тяхната продължителност и технологична последователност и обвързаността на отделните етапи и процеси; Методи за организация на строителството; Обосновка на ресурсните възможности на участника, включително обезпечеността с трудови ресурси и механизация и транспортни средства; Описание на мероприятията по временна организация на движението, опазване на околната среда, мерките по безопасност на труда и мерките за намаляване на затрудненията на местното население по време на изпълнението на поръчката; Линеен график за изпълнение на предмета на поръчката; Наличие на всички необходими строителни книги, в т.ч. : Инвестиционен проект, съгласуван и одобрен по реда на ЗУТ; Разрешение за строеж; изготвяне и представяне на РПОИС; организиране на среща; изготвяне на информационна табела; След подписването на Акт Образец 2а, ще започне изпълнението на временното строителство и мобилизация. Продължителност 10 календарни дни и ще включва: мобилизация и временно строителство, подготвителни работи, разпространяване на изготвените документи за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, предприемане на мерки за опазване на околната среда и др. Персоналът ще бъде транспортиран до гр.Добрич и запознат с обхвата на обекта. Необходимото оборудване, материали и механизация ще бъдат доставени на обекта за стартирането на работите; съгласуване План за предотвратяване и ликвидиране на пожари; План за предотвратяване и ликвидиране на аварии; План за евакуация на работещите и намиращите се на строителната площадка; Подготовка на строителната площадка на място- Устройване на временна строителна база; Временно водоснабдяване, ел.захранване и санитарни възли; Временна организация, безопасност на движението (ВОБД) по време на строителството; Ограждане и сигнализиране на работните участъци; Разчистване на работните участъци; Организиране на геодезични работи; Изясняване на подземните инфраструктури; Уведомяване на експлоатационното ВиК дружество; Доставка на материали; направил е описание на позициониране и съдържание на фургони /контейнери за нуждите на строителството; Противопожарно табло; Временна химическа тоалетна; Контейнери за отпадъци; Ограда - за ограничаване на достъпа на неоторизирани лица; Временна

организация на движението по време на строителството; Ограждане и сигнализиране на работните участъци; Разчистване на работните участъци; Изграждане на геодезическа мрежа; Мониторинг на строителните работи и окончателна проверка; Калиброване и изпробване; Хоризонтален и вертикален контрол; Уточняване на местоположението на подземните инфраструктури; Уведомяване на експлоатационното ВК дружество; Доставка на материали; Доставка на необходимите материали за започване на СМР; Последователност и разпределението във времето на доставките на строителни материали; Изисквания към доставка на материалите; План за управление на строителните отпадъци /ПУСО/; Изготвяне на План за опазване на околната среда; Етап II - Изпълнение на строително-монтажните работи по „Реконструкция на вътрешно-разпределителна водопроводна мрежа за кв. Рилци – Етап I, гр. Добрич“- към този етап участника е посочил В рамките на Етап II от изпълнението на поръчката ще бъдат реализирани предвидените в рамките на проекта демонтажни и земни работи.

Етап II включва: Изпълнение на строителните и монтажните дейности от основното строителство при „Реконструкция на вътрешно-разпределителна водопроводна мрежа за кв. Рилци – Етап I, гр. Добрич“ в съответствие с Техническия/Работен проект, Техническата спецификация, изискванията на Възложителя - видовете СМР съгласно Количествено - стойностните сметки, както и тяхната последователност на изпълнение при спазване на приетите методи, технологии и организация на изпълнение; организация и подход на изпълнение - разпределение на ресурсите (човешки и технически); Изпълнение на мерки по безопасност и здраве; Осигуряване на временна организация на движение и др. Етап III - Предаване на строежа с констативен акт ; Измерване и приемане на извършените работи ; Одобрение на работите

от направеното предложение се установи следното : участник е направил предложение за Организацията на строителната площадка в периода на подготовката ѝ и изграждане на временното строителство ,включително на доставките и складирането на материалите и строителните продукти и опазване на околната среда. От направеното

предложение не се установява участника да е направил предложение по отношение на Организацията на строителната площадка в периода на същинското строителство като същата да е съобразена с предложението за изпълнение на основните дейности/СМР и гарантира осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и пожарна безопасност на обекта

4. Минимално изискване: Организацията на работата на инженерно-техническия (ръководен) състав на участника и на изпълнителския/ките екип/и (строителните работници), отговорни за строителството на обекта и предложение относно начините за осъществяване на координация и за съгласуване на дейностите по между им и

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

участника е представил мерки за организиране на експертния екип; Мобилизиране; Делегиране на права и отговорности; Текущо информирание; Активно управление на работните процеси; Ефективен контрол; Активна комуникация; Механизми за организация на ангажираните експерти- Сформиране на екип за управление на Договора; Съгласуваност; Сътрудничество; Описание на разпределението на екипа за изпълнение на СМР- описал е разпределението на ролите и отговорностите на ръководител на обекта; Технически ръководител на обекта; Специалист по здравословни и безопасни условия на труд ; Специалист - контрол на качеството ; Геодезист; Технически отдел – ПТО; Работните екипи - основни задължения и отговорности; в табличен вид е описал бригада и задачи и отговорности; представена е организация на работната ръка;след това е представил Организация и мобилизация на техническите ресурси

5. Минимално изискване: Линеен график за изпълнение на обекта, отразяващ последователността и продължителността на всички видове работи и дейности, необходими за изпълнението и

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

участника е представил Линеен график за изпълнение на обекта, отразяващ последователността и продължителността на всички видове работи и дейности, необходими за изпълнението

6. Минимално изискване: Представен качествен и количествен анализ на дефинираните от Възложителя рискове и направена оценка на вероятността за проявлението и степента на въздействие, които могат да предизвикат затруднения в планираната организация на изпълнението на дейностите от предмета на поръчката, както и предложена програма (относими към обекта) за управление на риска, включваща мерки за недопускане/предотвратяване на риска, в приложимите случаи, съответно обосновка за невъзможността да се предприемат подобни мерки в конкретния случай; мерки за преодоляване на риска, в случай на неговото настъпване;

Възложителят дефинира следните рискове, които могат да възникнат при изпълнението на обекта и които следва да бъдат отчетени от Участниците при подготовката на Предложението им за изпълнение на поръчката, а именно:

1. Закъснение началото на започване на изпълнението на строително-монтажните работи;
2. Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите по изпълнение на СМР;
3. Закъснение за окончателно приключване и предаване на строежа;

4. Трудности с използваната от изпълнителя техника и/или човешки ресурси;
5. Липса и/или недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес и/или компетентни държавни и/или общински органи и институции;
6. Липса и/или неточности в проектната документация;
7. Промени в законодателството на Република България и/или на Европейския съюз, свързани с изпълнението на договора за обществена поръчка.

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА, НО ИМА НЕСЪОТВЕТСТВИЯ СПРЯМО ИЗСКВАНИЯТА НА ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ, ПРЕДВИД СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

Участника в тази си част от предложението е представил

Отговорни лица :Техническия ръководител; Отговорник - назначен на обекта; Операторите и работещите, на които е възложено управлението или използването на строителни машини, инструменти или пистолети; Специфични мерки и изисквания при извършване на СМР, включително за местата със специфични рискове; Мерки за безопасна работа на работното място; Предпазни средства и специално работно облекло, които ще бъдат осигурени на строителната площадка; Описание на отчетените възможни рискове, които могат да забавят или възпрепятстват навременното и качествено изпълнение на предвидените СМР, като в тази част е описал Класифициране на опасностите

от направеното предложение не се установи участника да е направил предложение за

Представен качествен и количествен анализ на дефинираните от Възложителя рискове и направена оценка на вероятността за проявяването и степента на въздействие, които могат да предизвикат затруднения в планираната организация на изпълнението на дейностите от предмета на поръчката, както и предложена програма (относими към обекта)за управление на риска, включваща мерки за недопускане/предотвратяване на риска, в приложимите случаи, съответно обосновка за невъзможността да се предприемат подобни мерки в конкретния случай; мерки за преодоляване на риска, в случай на неговото настъпване;

Възложителят дефинира следните рискове, които могат да възникнат при изпълнението на обекта и които следва да бъдат отчетени от Участниците при подготовката на Предложението им за изпълнение на поръчката, а именно:

1. Закъснение начало на започване на изпълнението на строително-монтажните работи;
2. Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите по изпълнение на СМР;
3. Закъснение за окончателно приключване и предаване на строежа;
4. Трудности с използваната от изпълнителя техника и/или човешки ресурси;
5. Липса и/или недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес и/или компетентни държавни и/или общински органи и институции;
6. Липса и/или неточности в проектната документация;
7. Промени в законодателството на Република България и/или на Европейския съюз, свързани с изпълнението на договора за обществена поръчка.

	КТПЗ: Мерки за опазване на околната среда КТПЗА-Първа степен на оценяване, за оферти съдържащи в себе си задължителен компонент по съответните приложения към техническото предложение предложен от участниците и представляващ базово/минимално изискване по всеки един показател 1. Минимално изискване:Предвидени са мерки за опазване на околната среда по всеки един от посочените аспекти, идентифицирани от Възложителя. Установява се подробно предложение относно всички мерки в тази част от офертата на участника, като са предвидени най-малко по една мярка за всеки един аспект. Всяка мярка съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ и В)План за организация за изпълнение на мярката, с посочване на ресурсите(технически и човешки), Базовите аспекти идентифицирани от възложителя са: • Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с отработени горива, масла и др.работни
--	--

течности от механизацията;

- Намаляване запрашеността на атмосферния въздух и шума при изпълнение на поръчката;
- Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на строителство;
- Оптимизиране на графика за доставка на материали за намаляване на трафика

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА, НО ИМА НЕСЪОТВЕТСТВИЯ СПРЯМО ИЗСКВАНИЯТА НА ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ, ПРЕДВИД СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

Участника е представил описание на възможните замърсители; *Фактори оказващи въздействие на околната среда*

Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с отработени горива, масла и др. работни течности от механизацията

участника е представил:

А. Предложение относно обхвата и предмета на мярката

Б. Текущо прилагане на мярката и изпълнение предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

не се установява участника да е представил В)План за организация за изпълнение на мярката, с посочване на ресурсите(технически и човешки),

Намаляване запрашеността на атмосферния въздух при изпълнение на поръчката

А. Предложение относно обхвата и предмета на мярката

Б. Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ не се установява участника да е представил В)План за организация за изпълнение на мярката, с посочване на ресурсите(технически и човешки),предвид че обхвата на този аспект включва и шум, а именно: Намаляване запрашеността на атмосферния въздух и шума при изпълнение на поръчката се установява че участника е предложил Мерки за намаляване негативните въздействия от шум, които обхващат Текущо прилагане на мярката, с което участника не е изпълнил изискването на възложителя, а именно: не са обхванати трите компонента дефинирани от възложителя:А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ и В)План за организация за изпълнение на мярката, с посочване на ресурсите(технически и човешки)	Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на строителството Участника е представил А. Предложение относно обхвата и предмета на мярката Б. Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ не се установява участника да е представил В)План за организация за изпълнение на мярката, с посочване на ресурсите(технически и човешки) след това участника е представил Мерки за намаляване негативните въздействия върху атмосферата; Мерки за намаляване негативните въздействия върху водите; Мерки за намаляване негативните въздействия върху почвите; Мерки за намаляване негативните въздействия върху биоразнообразието; Мерки за намаляване негативните
---	---

въздействия на отпадъците върху околната среда; Мерки за намаляване негативните въздействия от шум ; Мерки за борба с бедствия и промишлени аварии; Мерки за опазване на околната среда от излив на течни отпадъци; Мерки за опазване на околната среда от излив на непречистени отпадъчни води; Мерки за опазване на околната среда от санитарно - битови отпадъци; Мерки за опазване на околната среда от строителни отпадъци; *Екологични решения за опазване на околната среда*

не се установява участника да е направил предложение за мерки по следните аспекти

Оптимизиране на графици за доставка на материали за намаляване на графика

2. Минимално изискване: План за отпадъците, генерирани вследствие изпълнението предмета на поръчката

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА, НО ИМА НЕСЪОТВЕТСТВИЯ СПРЯМО ИЗСКВАНИЯТА НА ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ , ПРЕДВИД СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

Участника е представил План за организация по изпълнение на мерките за опазването на околната среда, като комисията установи несъответствие, където участника е посочил Действия по изпълнението на плана: Съгласно изискванията на община Ружинци на трите етапа от изпълнението на обекта ще приложим Планът за организация по изпълнение на мерките за опазването на околната среда; в табличен вид е описал действие по изпълнение; период на прилагане и екологичен ефект от действието; Очакван ефект от изпълнението на План за организация по изпълнение на мерките за опазването на околната среда. Комисията не установява участника да е направил предложение План за отпадъците, генерирани вследствие изпълнението предмета на поръчката

КТП4: Социални характеристики, свързани с изпълнението на поръчката
КТП4А-Първа степен на оценяване, за оферти съдържащи в себе си задължителен компонент по съответните приложения към техническото предложение предложени от участниците и представяващ базово/минимално изискване по всеки един показател
1. <u>Минимално изискване:</u> Предвидени са мерки касаещи социални характеристики по всеки един от посочените аспекти, идентифицирани от Възложителя. Установява се подробно предложение относно всички мерки в тази част от офертата на участника, като са предвидени най-малко по една мярка за всеки един аспект. Мерките отчитат спецификата на възлагащите работи и са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка съдържа едновременно три компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен социален ефект; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ; В) План за организация за изпълнение на мярката, с посочване на ресурсите (технически и човешки). Базовите аспекти идентифицирани от възложителя са : -Организиране на работния процес, така че да се не се прекъсва достъпа и достъпната среда около строежа; -Организиране на работния процес, така че да се минимизира неудобството за транспорта и пешеходците и гарантира безопасността им ; -Организиране на работния процес, така че да се минимизира неудобството за гражданите в близост до обекта от прах,

шум, замърсяване;

-Информирание на гражданите (живущи и работещи в близост до обекта) относно предстоящи строително-монтажни работи.

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА, НО ИМА НЕСЪОТВЕТСТВИЯ СПРЯМО ИЗСКВАНИЯТА НА ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ, ПРЕДВИД СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

Участника е представил:

Организиране на работния процес, така че да се минимизира риска от прекъсване на водоснабдяването на територията на изпълняваните участъци

към посочената мярка участника е представил Предложение относно конкретните социални характеристики, към които е насочена мярката; Текущо прилагане на мярката в процеса на изпълнение; Предложение относно конкретни методи и механизми, чрез които ще се елиминира или минимизира негативното проявление спрямо социалната среда и нейните компоненти.

от направеното предложение се установява че участника е покрил трите компонента дефинирани от възложителя, а именно: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен социален ефект; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението й; В)План за организация за изпълнение на мярката, с посочване на ресурсите(технически и човешки).

Информирание на постоянно и временно пребиваващите жители в обхвата на работите относно предстоящи

строително-монтажни работи.

към посочената мярка участника е представил

Предложение относно конкретните социални характеристики, към които е насочена мярката

Текущо прилагане на мярката в процеса на изпълнение

Предложение относно конкретни методи и механизми, чрез които ще се елиминира или минимизира негативното проявление спрямо социалната среда и нейните компоненти

от направеното предложение се установява че участника е покрил трите компонента дефинирани от възложителя, а именно: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен социален ефект; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението й; В)План за организация за изпълнение на мярката, с посочване на ресурсите(технически и човешки).

от направеното предложение не се установи участника да е направил предложение по следните аспекти дефинирани от възложителя

-Организиране на работния процес, така че да се не се прекъсва достъпа и достъпната среда около строежа;

-Организиране на работния процес, така че да се минимизира неудобството за транспорта и пешеходните и гарантира безопасността им ;

-Организиране на работния процес, така че да се минимизира неудобството за гражданите в близост до обекта от прах,

шум, замърсяване;

План за осигуряване на гаранционната поддръжка и устойчивост на обекта:

Изисквания:	Да/не
<u>Минимално изискване:</u>Превантивен мониторинг чрез регулярни огледи на място и/или други методи по предложение на участника (превантивни действия).-методи за наблюдение и оценка на състоянието на обекта по време на гаранционния период, включително честота на наблюдение, основни характеристики – обект на наблюдение, периодичност на докладване. Планираните методи, характеристики и периодичност да бъдат обвързани с осигуряването на нормално функциониране на обекта, както и предпоставки за появата на дефекти с цел ранна диагностика на проблеми, свързани с функционирането на обекта. <u>Представената част от плана отговаря на минималните изисквания на Възложителя, поради следните МОТИВИ:</u> Участника е представил метод и честота на наблюдение участника е представил оценка на състоянието на обекта по време на гаранционния период, и основни характеристики – обект на наблюдение, периодичност на докладване.	да
<u>Минимално изискване:</u> Честота на превантивен мониторинг-е на всеки 6 месеца	да

<u>Представената част от плана отговаря на минималните изисквания на Възложителя, поради следните МОТИВИ:</u> Участника е представил честота на мониторинга на всеки 6 месеца	
<u>Минимално изискване:</u> изпълнение на необходимите коригиращи дейности, за постигане на нормално функциониране и отстраняване на дефекти, свързани с описаните аспекти и дефекти Съществени дефекти са такива, свързани с: - Дефекти в резултат на несъответствие на качеството на вложените материали с техническата спецификация, включително тяхната годност и дълготрайност; - Дефекти, свързани с начина на изпълнение на строително – монтажните работи; - Срок на годност в съчетание на материал и технология.	да
<u>Представената част от плана отговаря на минималните изисквания на Възложителя, поради следните МОТИВИ:</u> е представил необходимите коригиращи дейности, за постигане на нормално функциониране и отстраняване на дефекти, не са свързани с описаните аспекти и дефекти Съществени дефекти са такива, свързани с: - Дефекти в резултат на несъответствие на качеството на вложените материали с техническата спецификация, включително тяхната годност и дълготрайност; - Дефекти, свързани с начина на изпълнение на строително – монтажните работи; - Срок на годност в съчетание на материал и технология.	

<u>Минимално изискване:</u> Реакция при констатирани дефекти, включително описание на процедури за реакция, отстраняване и срокове (коригиращи действия)-описание на техническия капацитет, необходимите ресурси и процедури за мобилизация за осигуряване на ефективна и навременна реакция и отстраняване на констатирани дефекти. Предвид обществената значимост на обекта на интервенция, максимално допустимият срок за реакция е 4 часа, а за отстраняване на констатирани дефекти е 24 /двадесет и четири / часа. Срокът може да бъде удължаван само при обективна невъзможност за срок, предварително съгласуван с Възложителя. <u>Представената част от плана не отговаря на минималните изисквания на Възложителя, поради следните МОТИВИ:</u> Участника не е представил Реакция при констатирани дефекти, включително описание на процедури за реакция, отстраняване и срокове (коригиращи действия)-описание на техническия капацитет, необходимите ресурси и процедури за мобилизация за осигуряване на ефективна и навременна реакция и отстраняване на констатирани дефекти	не
<u>Минимално изискване:</u> Комуникация с Възложителя през периода на гаранционните срокове-включващ като минимум: процедури за докладване на резултатите от превантивния мониторинг, регистър на констатирани проблеми и предприетите мерки за отстраняване на констатирани дефекти, оценка на рисковете, свързани с неправилна експлоатация, намеса на трети страни и препоръки за преодоляването им. <u>Представената част от плана не отговаря на минималните изисквания на Възложителя, поради следните МОТИВИ:</u> Участника не е представил Комуникация с Възложителя през периода на гаранционните срокове включващ като минимум: процедури за докладване на резултатите от превантивния мониторинг, регистър на констатирани проблеми и предприетите мерки за отстраняване на констатирани дефекти, оценка на рисковете, свързани с неправилна експлоатация, намеса на трети страни и препоръки за	не

преодоляването им.	<u>Минимално изискване:</u> Дейностите по превантивен мониторинг, докладване и отстраняване на констатирани дефекти-трябва да обхващат всички елементи на обекта, които са предмет на гаранционна отговорност, а именно: -Водопровод и елементите към него; -Асфалтови покрития, бордюри и тротоари; <u>Представената част от плана отговаря на минималните изисквания на Възложителя, поради следните МОТИВИ:</u> е представил Дейностите по превантивен мониторинг, докладване и отстраняване на констатирани дефекти не обхващат всички елементи на обекта, които са предмет на гаранционна отговорност, а именно: -Водопровод и елементите към него; -Асфалтови покрития, бордюри и тротоари;	Да
	<u>Минимално изискване:</u> Обосновка на предложения срок за реакция и отстраняване на констатирани дефекти, за всяка от изброените групи елементи. Срокът за реакция трябва да включва и времето на доставка и монтаж на материали и /или оборудване. <u>Представената част от плана не отговаря на минималните изисквания на Възложителя, поради следните МОТИВИ:</u> участника не е представил обосновка на предложения срок за реакция и отстраняване на констатирани дефекти, за всяка от изброените групи елементи	не

ВЪВ ВРЪЗКА С ГОРЕЦИТИРАНИТЕ КОНСТАТАЦИИ И МОТИВИ ОТНОСНО съдържанието на техническото предложение на участника спрямо Първа степен на оценяване, КОМИСИЯТА ЗАКЛЮЧИ, ЧЕ ПРЕДСТАВЕНОТО ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НЕ ОТГОВАРЯ НА МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ СЪГЛАСНО документацията за участие и съответно не отговаря на Първа степен на оценяване, за офerti съдържащи в себе си задължителен компонент по съответните приложения към техническото предложение предложен от участниците и представляващ базово/минимално изискване по всеки един показател ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

1.В част Предлаган подход за качествено изпълнение на поръчката (Приложение 1):

1.1. Подход за качествено изпълнение в който се установява, че участникът е направил анализ на техническата спецификация и действащото законодателство и е представил подход за качествено изпълнение на дейностите и СМР- не е направил направил анализ на техническата спецификация и действащото законодателство

1.2 *Технология на изпълнение на строително-монтажните работи (СМР), технологичните процеси и последователността на извършване на СМР при съблюдаването на общите изисквания за безопасни и здравословни условия на труд в строителството, като са обхванати всички дейности, технологични процеси и доставка на основните материали, необходими за изпълнението предмета на поръчката, отчитайки мерките за гарантиране на качество произтичащи пряко от обхвата и съдържанието на Техническите спецификации, както и разпоредбите на действащото законодателство- участник не е обхванал следните материали-Спирателен кран; Пожарен хидрант ф80 надземен; Автоматичен въздушник; Ел. заваряема водовземна скоба; Лъсова почва за засипване*

- 1.3. Мерки за осигуряване на качество при изпълнение на строителството- по -Мерки(тип 1), свързани с изпълнение на СМР - предвид обхвата на възлаганите СМР, както и относителната сложност на обекта в неговата: за 2). мерки, свързани с осигуряване на материали, чиито качества и характеристики съответстват на договорните изисквания, вкл. тези, произтичащи от съдържанието на одобрения проект-са предвидени дейности, които не са в обхвата на поръчката;липсва предложение за 3). мерки, касаещи замяна на техника и механизация в случай, че същата е дефектирала в процеса на изпълнение на СМР, за 4). мерки, отнасящи се до действия на участника в случай на изключително неблагоприятни климатични условия и за 5). мерки, отнасящи се до действия на участника при изпълнение и документирание на СМР подлежащи на закриване;Липсва предложение за Мерки(тип 2), отнасящи се до извършване на тестове (проби) след завършване на СМР - за да е възможно законосъобразното завършване на обекта и последващото му въвеждане в експлоатация бъдещият изпълнител следва да извърши тестове/проби (независимо дали единични или комплексни), доказващи експлоатационната годност на изградените мрежи и съоръжения. Последното е съществен елемент, свързан с цялостното спазване на определения чрез договора срок: 1). мерки за навременно провеждане на пробите с оглед фактическата степен на завършеност на СМР и 2). мерки в случай на неуспешни проби (т.е. резултати от проби, които не доказват експлоатационната годност на обекта или негова част);Липсва предложение за Мерки(тип 3), отнасящи се до спазване на наличния финансов ресурс: 1). мерки, целящи избягване или минимизиране размера на претендираните суми, чиито източници са непредвидените разходи като част от офертата на съответния участник и 2). мерки, свързани с избягване увреждане на чуждо имущество и последващи финансови претенции от тях към възложителя

2.В част Организация за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката (Приложение 2):

2.1.Организацията на строителната площадка, както в периода на подготовката ѝ и изграждане на временното строителство, така и в

периода на същинското строителство, включително на доставките и складирането на материалите и строителните продукти, като същата е съобразена с предложението за изпълнение на основните дейности/СМР и гарантира осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност на обекта- не е направил предложение по отношение на Организацията на строителната площадка в периода на същинското строителство като същата да е съобразена с предложението за изпълнение на основните дейности/СМР и гарантира осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и пожарна безопасност на обекта

2.2. Представен качествен и количествен анализ на дефинираните от Възложителя рискове и направена оценката на вероятността за проявлението и степента на въздействие, които могат да предизвикат затруднения в планираната организация на изпълнението на дейностите от предмета на поръчката, както и предложена програма (относими към риска, в случай на неговото настъпване- е направил предложение за Представен качествен и количествен анализ на дефинираните от Възложителя рискове и направена оценката на вероятността за проявлението и степента на въздействие, които могат да предизвикат затруднения в планираната организация на изпълнението на дейностите от предмета на поръчката, както и предложена програма (относими към обекта)за управление на риска, включваща мерки за недопускане/предотвратяване на риска, в приложимите случаи, съответно обосновка за невъзможността да се предприемат подобни мерки в конкретния случай; мерки за преодоляване на риска, в случай на неговото настъпване за дефинираните от възложителя рискове:

1. Закъснение началото на започване на изпълнението на строително-монтажните работи; 2. Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите по изпълнение на СМР; 3. Закъснение за окончателно приключване и предаване на

строяща; 4. Трудности с използваната от изпълнителя техника и/или човешки ресурси; 5. Липса и/или недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес и/или компетентни държавни и/или общински органи и институции; 6. Липса и/или неточности в проектната документация; 7. Промени в законодателството на Република България и/или на Европейския съюз, свързани с изпълнението на договора за обществена поръчка.

3. В част Мерки за опазване на околната среда (Приложение 6):

3.1. Предвидени са мерки за опазване на околната среда по всеки един от посочените аспекти, идентифицирани от Възложителя. Установява се подробно предложение относно всички мерки в тази част от офертата на участника, като са предвидени най-малко по една мярка за всеки един аспект. Всяка мярка съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението й и В) План за организация за изпълнение на ресурсите (технически и човешки). По аспект Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с отработени горива, масла и др. работни течности от механизацията - не се установява участника да е представил В) План за организация за изпълнение на мярката, с посочване на ресурсите (технически и човешки); по аспект Намаляване запрашеността на атмосферния въздух при изпълнение на поръчката - не се установява участника да е представил В) План за организация за изпълнение на мярката, с посочване на ресурсите (технически и човешки), предвид че обхвата на този аспект включва и шум, а именно: Намаляване запрашеността на атмосферния въздух и шума при изпълнение на поръчката се установява че участника е предложил Мерки за намаляване негативните въздействия от шум, които обхващат Текущо прилагане на мярката, с което участника не е изпълнил изискването на възложителя, а именно: не са обхванати трите компонента дефинирани от възложителя: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението й и В) План за организация за изпълнение на мярката, с

посочване на ресурсите(технически и човешки);по аспект Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на строителството- не се установява участника да е представил В)План за организация за изпълнение на мярката, с посочване на ресурсите(технически и човешки)..Липсва предложение по аспект Оптимизиране на графичите за доставка на материали за намаляване на трафика. Не е направил предложение за План за отпадъците, генерирани вследствие изпълнението предмета на поръчката.В тази част от предложението се констатира не съответствие, предвид че се цитира друг Възложител.

4. Социални характеристики, свързани с изпълнението на поръчката (Приложение 5):

4.1. Предвидени са мерки касаещи социални характеристики по всеки един от посочените аспекти, идентифицирани от Възложителя. Установява се подробно предложение относно всички мерки в тази част от офертата на участника, като са предвидени най-малко по една мярка за всеки един аспект. Мерките отчитат спецификата на възлаганите работи и са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка съдържа едновременно три компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен социален ефект; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението й; В)План за организация за изпълнение на мярката, с посочване на ресурсите(технически и човешки).- не е направил предложение по следните аспекти дефинирани от възложителя:-Организиране на работния процес, така че да се не се прекъсва достъпа и достъпната среда около строежа; -Организиране на работния процес, така че да се минимизира неудобството за транспорта и пешеходците и гарантира безопасността им ; -Организиране на работния процес, така че да се минимизира неудобството за гражданите в близост до обекта от прах, шум, замърсяване;

5. В част План за осигуряване на гаранционната поддръжка и устойчивост на обекта (Приложение 8)

- не е представил Реакция при констатирани дефекти, включително описание на процедури за реакция, отстраняване и срокове (коригирани действия)-описание на техническия капацитет, необходимите ресурси и процедури за мобилизация за осигуряване на ефективна и навременна реакция и отстраняване на констатирани дефекти
- не е представил Комуникация с Възложителя през периода на гаранционните срокове включващ като минимум: процедури за докладване на резултатите от превантивния мониторинг, регистър на констатираните проблеми и предприетите мерки за отстраняване на констатирани дефекти, оценка на рискове, свързани с неправилна експлоатация, намеса на трети страни и препоръки за преодоляването им.
- не е представил обобщка на предложения срок за реакция и отстраняване на констатирани дефекти, за всяка от изброените групи елементи

ВЪВ ВРЪЗКА С ГОРЕЦИТИРАНИТЕ КОНСТАТАЦИИ И МОТИВИ ОТНОСНО СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТЕХНИЧЕСКОТО предложение на участника КОМИСИЯТА КОНСТАТИРА, ЧЕ ЗА ПРЕДСТАВЕНОТО ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПРИЛОЖЕН КРИТЕРИЯ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ, ПРЕДВИД ЧЕ НЕ ОТГОВАРЯ НА Първа степен на оценяване, и офертата не съдържа в себе си задължителен компонент по съответните приложения към техническото предложение предложен от участника и представляващ базово/минимално изискване по всеки един показател, а именно :

Представеното предложение по подпоказател „КТП1: Предлаган подход за качествено изпълнение на поръчката“ не отговаря първа степен на оценяване, офертата не съдържащи в себе си следните задължителни компоненти по съответните приложения към техническото предложение предложен от участника и представляващ базово/минимално изискване по всеки

един показател и липсва една или повече от минимално изискуемите условия/хипотези за поставяне на 5 точки, а именно:	КТП1А-Първа степен на оценяване, за оферти съдържащи в себе си задължителен компонент по съответните приложения към техническото предложение предложен от участниците и представляващ базово/минимално изискване по всеки един показател 1. Подход за качествено изпълнение в който се установява, че участникът е направил анализ на техническата спецификация и действащото законодателство и е представил подход за качествено изпълнение на дейностите и СМР и 2. Технология на изпълнение на строително-монтажните работи (СМР), технологичните процеси и последователността на извършване на СМР при съблюдаването на общите изисквания за безопасни и здравословни условия на труд в строителството, като са обхванати всички дейности, технологични процеси и доставка на основните материали, необходими за изпълнението предмета на поръчката, отчитайки мерките за гарантиране на качество произтичащи пряко от обхвата и съдържанието на Техническите спецификации, както и разпоредбите на действащото законодателство и 3. Мерки за осигуряване на качество при изпълнение на строителството : За всяка от базовите мерки предложението отговаря едновременно на следните условия: - предложение за обхват, план и конкретни действия, свързани с реализация на изведените мерки, вкл. съставлящите ги фактори и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана и - Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество при изпълнение на настоящата
---	---

обществена поръчка	и - Входящ контрол от страна на персонала, отговарящ за контрола на качеството при логистиката, свързана с поръчване и получаване на материали и други продукти за строежа, както и контрол на качеството на труда по Мерки(тип I). Тези мярки следва да гарантира, че на строежа няма да се вложат материали, изделя и/или други стоки, имащи явни или скрити дефекти и че СМР ще бъдат изпълнени с необходимото качество според инвестиционния проект, действащите стандарти и добри практики.
	и да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености
	Представеното предложение по подпоказател „КТП2: Организация за изпълнение на дейностите“ не отговаря първа степен на оценяване, офертата не съдържащи в себе си следните задължителни компоненти по съответните приложения към техническото предложение предложен от участника и представляващ базово/минимално изискване по всеки един показател и липсва една или повече от минимално изискуемите условия/хипотези за поставяне на 5 точки, а именно: КТП2А-Първа степен на оценяване, за оферти съдържащи в себе си задължителен компонент по съответните приложения към техническото предложение предложено от участниците и представляващ базово/минимално изискване по всеки един показател

3. Организацията на строителната площадка, както в периода на подготовката ѝ и изграждане на временното строителство, така и в периода на същинското строителство, включително на доставките и складирането на материалите и строителните продукти, като същата е съобразена с предложението за изпълнение на основните дейности/СМР и гарантира осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност на обекта и

6. Представен качествен и количествен анализ на дефинираните от Възложителя рискове и направена оценката на вероятността за проявлението и степента на въздействие, които могат да предизвикат затруднения в планираната организация на изпълнението на дейностите от предмета на поръчката, както и предложена програма (относими към обекта) за управление на риска, включваща мерки за недопускане/предотвратяване на риска, в приложимите случаи, съответно обосновка за невъзможността да се предприемат подобни мерки в конкретния случай; мерки за преодоляване на риска, в случай на неговото настъпване;

Представеното предложение по подпоказател „КТП3: Мерки за опазване на околната среда“ не отговаря първа степен на оценяване, офертата не съдържащи в себе си следните задължителни компоненти по съответните приложения към техническото предложение предложен от участника и представляващ базово/минимално изискване по всеки един показател и липсва една или повече от минимално изискуемите условия/хипотези за поставяне на I точка, а именно:

КТП3А-Първа степен на оценяване, за оферти съдържащи в себе си задължителен компонент по съответните приложения към техническото предложение предложен от участниците и представляващ базово/минимално изискване по всеки един показател 1. Предвидени са мерки за опазване на околната среда по всеки един от посочените аспекти, идентифицирани от Възложителя. Установява се подробно предложение относно всички мерки в тази част от офертата на участника, като са предвидени най-малко по една мярка за всеки един аспект. Всяка мярка съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ и В) План за организация за изпълнение на мярката, с посочване на ресурсите (технически и човешки), Базовите аспекти идентифицирани от възложителя са: • Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с отработени горива, масла и др. работни течности от механизацията; • Намаляване запрашеността на атмосферния въздух и шума при изпълнение на поръчката; • Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на строителство; Оптимизиране на графика за доставка на материали за намаляване на трафика	Представеното предложение по подпоказател „КТП4: Социални характеристики, свързани с изпълнението на поръчката“ не отговаря първа степен на оценяване, офертата не съдържащи в себе си следните задължителни компоненти по съответните приложения към техническото предложение предложен от участника и представляващ базово/минимално изискване по всеки един показател и липсва една или повече от минимално изискуемите условия/хипотези за поставяне на 1
--	---

точка, а именно:	КТП4А-Първа степен на оценяване, за оферти съдържащи в себе си задължителен компонент по съответните приложения към техническото предложение предложен от участниците и представляващ базово/минимално изискване по всеки един показател 1. Предвидени са мерки касаещи социални характеристики по всеки един от посочените аспекти, идентифицирани от Възложителя. Установява се подробно предложение относно всички мерки в тази част от офертата на участника, като са предвидени най-малко по една мярка за всеки един аспект. Мерките отчитат спецификата на възлаганите работи и са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка съдържа едновременно три компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен социален ефект; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случай на отклонение от изпълнението ѝ; В) План за организация за изпълнение на мярката, с посочване на ресурсите (технически и човешки).
------------------	--

Съгласно критерия за възлагане „За оферти, за които не е налице изпълнението на базовите изисквания за присъждане на минимален брой точки независимо по кой подпоказател се отстранява от участие.“ **Представеното Техническо предложение НЕ отговаря на минимално поставените изисквания за съдържание и наличие на задължителни елементи в своята последователност спрямо минималните изисквания на техническата спецификация и спрямо изискванията на**

документацията. Представеното техническо предложение НЕ се допуска до оценяване по следващи степени предвид, че не покрива Първа степен на оценяване, поради горесцитираните мотиви.

чл. 37
ЗОП във
вр. с рег.
2016/679

Председател:
Николай Великов

чл. 37
ЗОП във
вр. с
рег.
2016/67
9

Членове:

.....
Ивайло Иванов

чл. 37
ЗОП
във вр.
с рег.
2016/6
79

инж. Орлин Първулов
