

«Хранкострой 2019» ДЗЗД е представил:

Участник «Хранкострой 2019» ДЗЗД е представил:

1. Заявява, че ще изпълни поръчката в съответствие с всички нормативни изисквания за този вид дейност, както и в съответствие с изискванията на възложителя, посочени в техническата спецификация, обявлението и указанията за възлагане на обществената поръчка.

2. Гарантира, че е в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с предложението ни, изискванията на Възложителя, действащото законодателство и представения проект на договор.

3. Срок на договора/срок за изпълнение:

(1)Срокът на договора: до 12 месеца от датата на сключване на договора за изпълнение. Срокът започва да

(2) Срок на изпълнение: Изпълнението на обществената поръчка е със срок за изпълнение до 6 месеца. Срокът започва да

тече от датата на съставяне и подписване на Протокол обр.2/2а по Наредба №3 от 31.07.2003г. за откриване на строителна

площадка и е до Датата на подписване на Констативен Акт обр. 15.

4. Предлаган подход за качествено изпълнение на поръчката (Приложение 1)

5. Организация за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката (Приложение 2)

6. Линеен график за изпълнение на предмета на поръчката (Приложение 3)

7. Комуникация и координация при изпълнение на поръчката (Приложение 4)

8. Социални характеристики, свързани с изпълнението на поръчката (Приложение 5)

9. Мерки за опазване на околната среда (Приложение 6)
10. Предложение за управление на риска (Приложение 7)
11. План за осигуряване на гаранционната поддръжка и устойчивост на обекта (Приложение 8)
12. Гаранционни срокове: минималните срокове за видовете дейности съгласно Наредба №2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, в случаите когато определените минимални срокове превишават 60 месеца, във всички останали случаи гаранционния срок е 60 месеца.

13. Декларира, че:

Всички дейности ще бъдат съгласувани с Възложителя и при необходимост коригирани и ще се изпълняват в обем и съдържание съгласно Техническите спецификации, приложенията към тях и настоящата оферта.

Са запознати с документацията за участие и приемаме без възражения условията и изискванията.

В случай, че бъдем определени за изпълнители, ние ще представим всички документи, необходими за подписване на договора съгласно документацията за участие в посочения срок от възложителя.

14. Удостоверява и потвърждава, че:

- Ще подписва съответните актове и протоколи по време на строителството, съгласно Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и договорните условия на договора;



- Строително-монтажните работи (СМР/СРР) ще бъдат изпълнени в съответствие със съществените изисквания към строежите, определени чрез Закона за устройство на територията (ЗУТ), както и другото приложимо действащо законодателство в областта на строителството, техническите спецификации, инвестиционния проект и изискванията на Възложителя;
- Екзекутивната документация и необходимите изпитания за пускане в експлоатация, когато и където е приложимо, се осигуряват за наша сметка.
- Разходите за консумация на електрическа енергия, вода и други консумативи, които са необходими за изграждане и въвеждане на обекта в експлоатация, са за наша сметка.

15.Декларира , че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд;

Констатации на комисията относно съдържанието на техническото предложение на участника спрямо Първа степен на оценяване, за оферти съдържащи в себе си задължителен компонент по съответните приложения към техническото предложение предложен от участника и представяващ базово/минимално изискване по всеки един показател:

КТП1: Предлаган подход за качествено изпълнение на поръчката
КТП1А-Първа степен на оценяване, за оферти съдържащи в себе си задължителен компонент по съответните приложения към техническото предложение предложено от участниците и представяващ базово/минимално изискване

по всеки един показател

1. Минимално изискване:Подход за качествено изпълнение в който се установява, че участникът е направил анализ на техническата спецификация и действащото законодателство и е представил подход за качествено изпълнение на дейностите и СМР и

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

Участника е представил анализ на техническата спецификация, която включва предмет на поръчка- съществуващо положение; обща информация за населеното място; описание и изискванията на отделните части на проекта, в това число: част технологична; част:конструкции; част геодезия; част: пътна и възстановяване на настилките; част: вод; пожарна безопасност ; пбз; част “водоснабдяване”; част ”пътни работи”; временна организация на движението; организация на строителството- подготовителни работи; разчистване на терена; обезопасяване на изкопите; поставяне на табели и знаци; временни технологични пътища; обезопасяване на изкопите; изграждане на водопровода; възстановяване на пътна настилка; механизация за изпълнение на смр; комплексен уедрен план-график; мерки и изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при извършване на смр; мерки и изисквания за збут при различните видове смр; изисквания относно строителните машини и съоръжения; част пусо; след това участника е направил предложение по отношение на действащото законодателство и е предложил подход за качествено изпълнение на дейностите и СМР, в който посочва , чеИзпълнението на строително-монтажните работи по договора, предмет на обществената поръчка ще изпълним пълно, качествено и в срок, при спазване на действащата нормативна и законова

уредба, приложимите технически стандарти в строителството, в съответствие с документацията за участие в процедурата; разработване на план за организация на строителството който ще включва описание на технологиите за изпълнение на строителните и монтажни работи, технологичната последователност и организацията на изпълнението им (онагледена с линеен календарен график), разчет на необходимите ресурси (човешки ресурси, материални ресурси, механизация) за изпълнение на задачата качествено и в срок; Ще обезпечи необходимите за работата финансови, човешки, материални ресурси, машини и съоръжения, необходими за цялостното изпълнение на Договора; след това е предложил генерален подход за изпълнение; методология на изпълнение на обекта; избраните подходи на работа, в това число Системен подход; Ситуационният подход; определени са изискванията към изходните елементи, а именно: да удовлетворяват изискванията на входните елементи на изпълнението; да дават подходяща информация за процесите и последващо обслужване; да съдържат и да се позовават на критериите за приемане на изпълнявания проект; да определят характеристиките на проекта, които са съществени за неговото правилно използване; да покриват нормативните и на възложителя изисквания, както и относимите стандарти и технологични норми. осигурява периодични систематични прегледи на разработването/изпълнението в съответствие с плановете за: оценка на способността на резултатите от разработването да удовлетворяват изискванията; идентифициране на всички проблеми и предлагане на необходимите действия

За представеното техническо предложение се установява наличие на представен подход за качествено изпълнение и направен анализ на техническата спецификация и действащото законодателство , както и подход за качествено изпълнение на дейностите и СМР

2. Минимално изискване:Технология на изпълнение на строително-монтажните работи (СМР), технологичните процеси и последователността на извършване на СМР при съблюдаването на общите изисквания за безопасни и здравословни условия на труд в строителството, като са обхванати всички дейности, технологични процеси и доставка на основните материали, необходими за изпълнението предмета на поръчката, отчитайки мерките за гарантиране на качество произтичащи пряко от обхвата и съдържанието на Техническите спецификации, както и разпоредбите на действащото законодателство и


ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

Участника е направил предложение за технология на изпълнение и технологични процеси , като е обхванал Ръчен изкоп; Машинен изкоп с багер ; Прехвърляне на земна почва до 3 м хоризонтално и 2м вертикално разстояние – ръчно; Натоварване разкопана земна почва на транспорт ; Превоз на земни маси и строителни отпадъци със самосвал ; Химическа стабилизация на лъсови почви; Довозване лъсова почва за засипване под водопровода и над темето на водопровода 30 см; Обратно засипване със земни маси и уплътняване на пластовете ; Натоварване разкопана земна почва на транспорт с багер; укрепване и разкрепване на изкопи; Рязане на асфалтова настилка, Разваляне на съществуваща асфалтова, трошенокаменна и тротоарна настилка, включително изкопаване и натоварване на транспорт; Отводняване ; Предпазни огради около обекта; Мост пътеки за преминаване над изкопа; ВОД по време на строителството - предвижда се водопровода да се изгражда на участъци от по 100 м; Монтаж на тръби и фасонни части; Детекторни и Сигнални ленти; Изпитване и дезинфекция; Спирателни кранове, крайник фланшов, свободен фланец, ВК; Бетоново блокче; Опорни блокове; Кифражни работи; Бетонови работи; Сградно водопроводно отклонение; Тротоарен спирателен кран; Пожарен хидрант ; Свободен стоманен фланец; Спирателни кранове; Шахта въздушник;

сглобяема стоманобетонова шахта, комплект със стъпала, цилиндри, КРШ и капак; Доставка и полагане на материал за основа с различна ширина и дебелина на пласта с СBR не по-малък от 80 % при плътност 98 % модифицирана суха плътност по АASHTO; Асфалтобетон и битумизирана основа; Разваляне и възстановяване на тротоарна настилка; Разваляне и възстановяване на бордюри; Вземане на проби на обратния насип ; Вземане проби на пътната настилка;слуд това участника е направил описание на водопроводните клонове; изискванията за възстановяване на пътна настилка и асфалтова, макадамова настилка; плочници. За всяка дейност участника е посочил и мерки за гарантиране на качеството

След това участника е представил в табличен вид последователността на изпълнение, като изпълнението на обекта е разделено на етапи, по дейности и задачи съобразно организацията на участника, при съблюдаване на предварително обявените условия на възложителя; участника е направил предложение за безопасни и здравословни условия на труд в строителството като е представил Организационен план; Задължения на работодателя; лични предпазни средства ; осигуряване с необходимите предпазни устройства, приспособления и ограждения; изправност на машините;инструктажи; Работно облекло и лични предпазни средства; след това е представил безопасни условия на труд при извършване на земни работи с багери; При работа с автосамасвали; НОРМАТИВНА УРЕДБА

Обхванати са и доставка на основните материали , като е обхванал Основните етапи при организирането на доставките; Стъпка 1: Поръчка за закупуване; Стъпка 2: Покана за предоставяне на оферти; Стъпка 3: Оценяване на офертите; Стъпка 4: Споразумение за доставка; Стъпка 5: Осигуряване на копие от всички документи и форми свързани с оборудването за Обекта; входящ контрол на материалите;предвижда При доставянето на материалите те ще бъдат подложени на повторен идентификационен контрол включително: външен вид, фабрично обозначение, място на

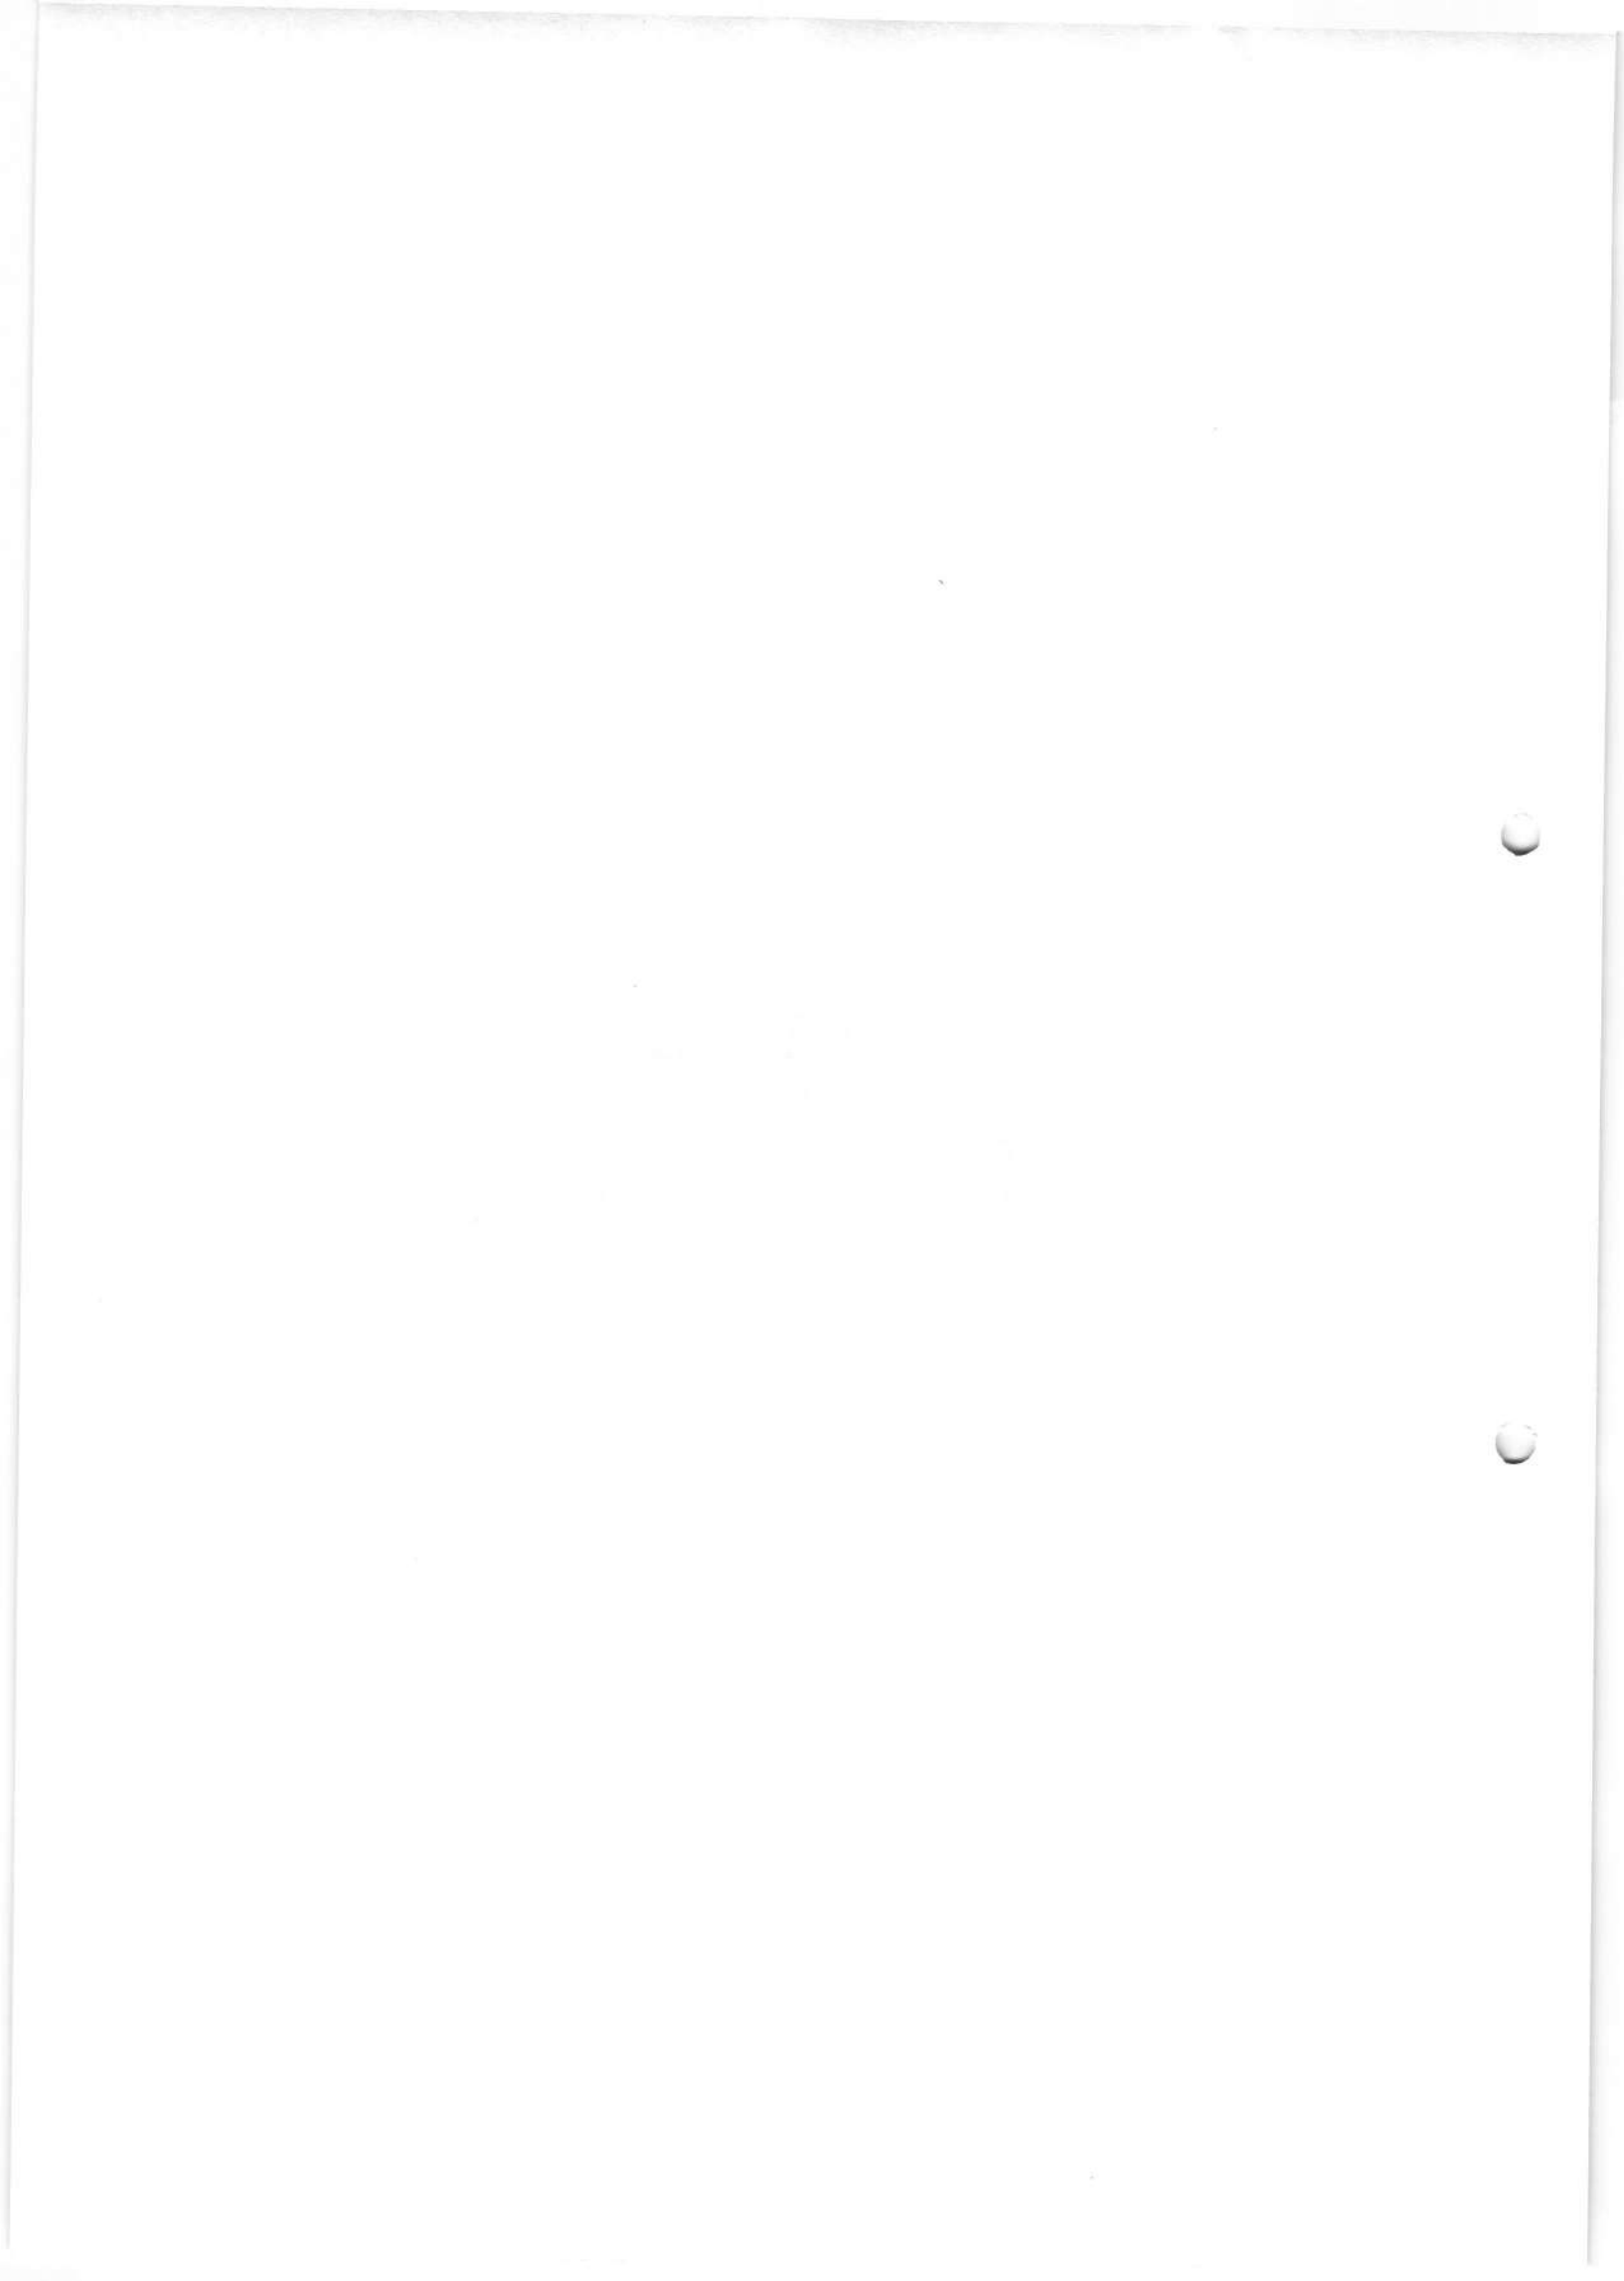

производство, пореден производствен номер, обозначение в съответствие с плана за полагане, евентуални увреждания по време на транспортирането и др. Освен визуален контрол ще се извършва и контролно изпитване чрез вземане на случайни проби; представени са дейности по Транспортирането и складирането на материалите; Графикът за доставката дейности по Складиране на материали и строителните продукти; Организацията по доставката на материали ще бъде групирана , в следните групи: 1 група Тръби PE-HD, PE100, PN10; Спирателен кран; Пожарен хидрант ф80 надземен; Автоматичен въздушник; Ел. заваряема водовземна скоба; 2 група-Льосова почва за засипване; Нестандартна баластра; Материал за основа с различна ширина и дебелина на пласта с CBR не по-малък от 80 % при плътност 98 % модифицирана суха плътност по AASHTO;3 група- Бетонови плочи в тротоар; Бетонови бордюри с размер 18/35/50(100), съгласно БДС 624-87;4група- Битумизирана основа съгласно БДС 4132-90 с минимално уплътнение 97%; Плътен асфалтобетон тип А, марка II, съгласно БДС 4132 за износващ пласт с дебелина в уплътнено състояние 4 см

За всяка група е представил осигуряване на материала, транспортиране и съхранение/складиране/ ; след това в табличен вид е посоч.,ил описание на основните материали и осигуряване на материала; описани са изискванията към Изисквания към основните материали и е предложен мерки за гарантиране на качеството

Участника е представил технология на изпълнение на строително-монтажните работи , придружени от съответните технологичните процеси и последователността на извършване на СМР при съблюдаването на общите изисквания за безопасни и здравословни условия на труд в строителството. Обхванати са всички дейности, технологични процеси и доставка на основните материали, необходими за изпълнението предмета на поръчката, отчетени са мерките за гарантиране на качество произтичащи пряко от обхвата и съдържанието на Техническите спецификации, както и

разпоредбите на действащото законодателство

3. Минимално изискване: Мерки за осигуряване на качество при изпълнение на строителството :

За всяка от базовите мерки предложението отговаря едновременно на следните условия:

- предложение за обхват, план и конкретни действия, свързани с реализация на изведените мерки, вкл. съставлящите ги фактори и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана

и

- Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество при изпълнение на настоящата обществена поръчка

и

- Входящ контрол от страна на персонала, отговарящ за контрола на качеството при логистиката, свързана с поръчване и получаване на материали и други продукти за строежа, както и контрол на качеството на труда по Мерки(тип I). Тези мярки следва да гарантира, че на строежа няма да се вложат материали, изделия и/или други стоки, имащи явни или скрити дефекти и че СМР ще бъдат изпълнени с необходимото качество според инвестиционния проект, действащите стандарти и добри практики.

и

да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки

от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености

Като минимум всеки един от участниците следва да разгледа мерките, посочени по-долу, които следва да се възприемат като базови изисквания на Възложителя:

-Мерки(тип 1), свързани с изпълнение на СМР - предвид обхвата на възлаганите СМР, както и относителната сложност на обекта в неговата:

- 1). мерки, свързани с ритмичност и достатъчност при доставка на необходимите материали;
- 2). мерки, свързани с осигуряване на материали, чиито качества и характеристики съответстват на договорните изисквания, вкл. тези, произтичащи от съдържанието на одобрения проект;
- 3). мерки, касаещи замяна на техника и механизация в случай, че същата е дефектирала в процеса на изпълнение на СМР;

- 4). мерки, отнасящи се до действия на участника в случай на изключително неблагоприятни климатични условия;

- 5). мерки, отнасящи се до действия на участника при изпълнение и документирание на СМР подлежащи на закриване;

- Мерки(тип 2), отнасящи се до извършване на тестове (проби) след завършване на СМР - за да е възможно законосъобразното завършване на обекта и последващото му въвеждане в експлоатация бъдещият изпълнител следва да извърши тестове/проби (независимо дали единични или комплексни), доказващи експлоатационната годност на изградените мрежи и съоръжения. Последното е съществен елемент, свързан с цялостното спазване на определения чрез

договора срок:

- 1). мерки за навременно провеждане на пробите с оглед фактическата степен на завършеност на СМР;
- 2). мерки в случай на неуспешни проби (т.е. резултати от проби, които не доказват експлоатационната годност на обекта или негова част);

-Мерки(тип 3), отнасящи се до спазване на наличния финансов ресурс

- 1). мерки, целящи избягване или минимизиране размера на претендираните суми, чиито източник са непредвидените разходи като част от офертата на съответния участник;
- 2). мерки, свързани с избягване увреждане на чуждо имущество и последващи финансови претенции от тях към възложителя.

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

Участника е представил:

-за Мерки(тип 1), свързани с изпълнение на СМР - предвид обхвата на възлаганите СМР, както и относителната сложност на обекта в неговата:

- 1). мерки, свързани с ритмичност и достатъчност при доставка на необходимите материали;

2). мерки, свързани с осигуряване на материали, чийто качества и характеристики съответстват на договорните изисквания, вкл. тези, произтичащи от съдържанието на одобрения проект;

3). мерки, касаещи замяна на техника и механизация в случай, че същата е дефектирала в процеса на изпълнение на СМР;

4). мерки, отнасящи се до действия на участника в случай на изключително неблагоприятни климатични условия;

5). мерки, отнасящи се до действия на участника при изпълнение и документиране на СМР подлежащи на закриване;

За посочените мерки е представил:

- предложение за обхват, план и конкретни действия, свързани с реализация на изведените мерки, вкл. съставлящите ги фактори и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана

и

- Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество при изпълнение на настоящата обществена поръчка

и

- Входящ контрол от страна на персонала, отговарящ за контрола на качеството при логистиката, свързана с поръчване и получаване на материали и други продукти за строежа, както и контрол на качеството на труда по Мерки(тип I). Тези мярки следва да гарантира, че на строежа няма да се вложат материали, изделия и/или други стоки, имащи явни или скрити дефекти и че СМР ще бъдат изпълнени с необходимото качество според инвестиционния проект, действащите стандарти и добри практики.

и

отчитат спецификата на възлаганите работи и са насочени към конкретната обществена поръчка, а не са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености

за Мерки(тип 2), отнасящи се до извършване на тестове (проби) след завършване на СМР - за да е възможно законосъобразното завършване на обекта и последващото му въвеждане в експлоатация бъдещият изпълнител следва да извърши тестове/проби (независимо дали единични или комплексни), доказващи експлоатационната годност на изградените мрежи и съоръжения. Последното е съществен елемент, свързан с цялостното спазване на определения чрез договора срок;

1). мерки за навременно провеждане на пробите с оглед фактическата степен на завършеност на СМР;


2). мерки в случай на неуспешни проби (т.е. резултати от проби, които не доказват експлоатационната годност на обекта или негова част);

За посочените мерки е представил:

- предложение за обхват, план и конкретни действия, свързани с реализация на изведените мерки, вкл. съставлящите ги фактори и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана

и
- Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество при изпълнение на настоящата обществена поръчка

и
отчитат спецификата на възлаганите работи и са насочени към конкретната обществена поръчка, а не са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености

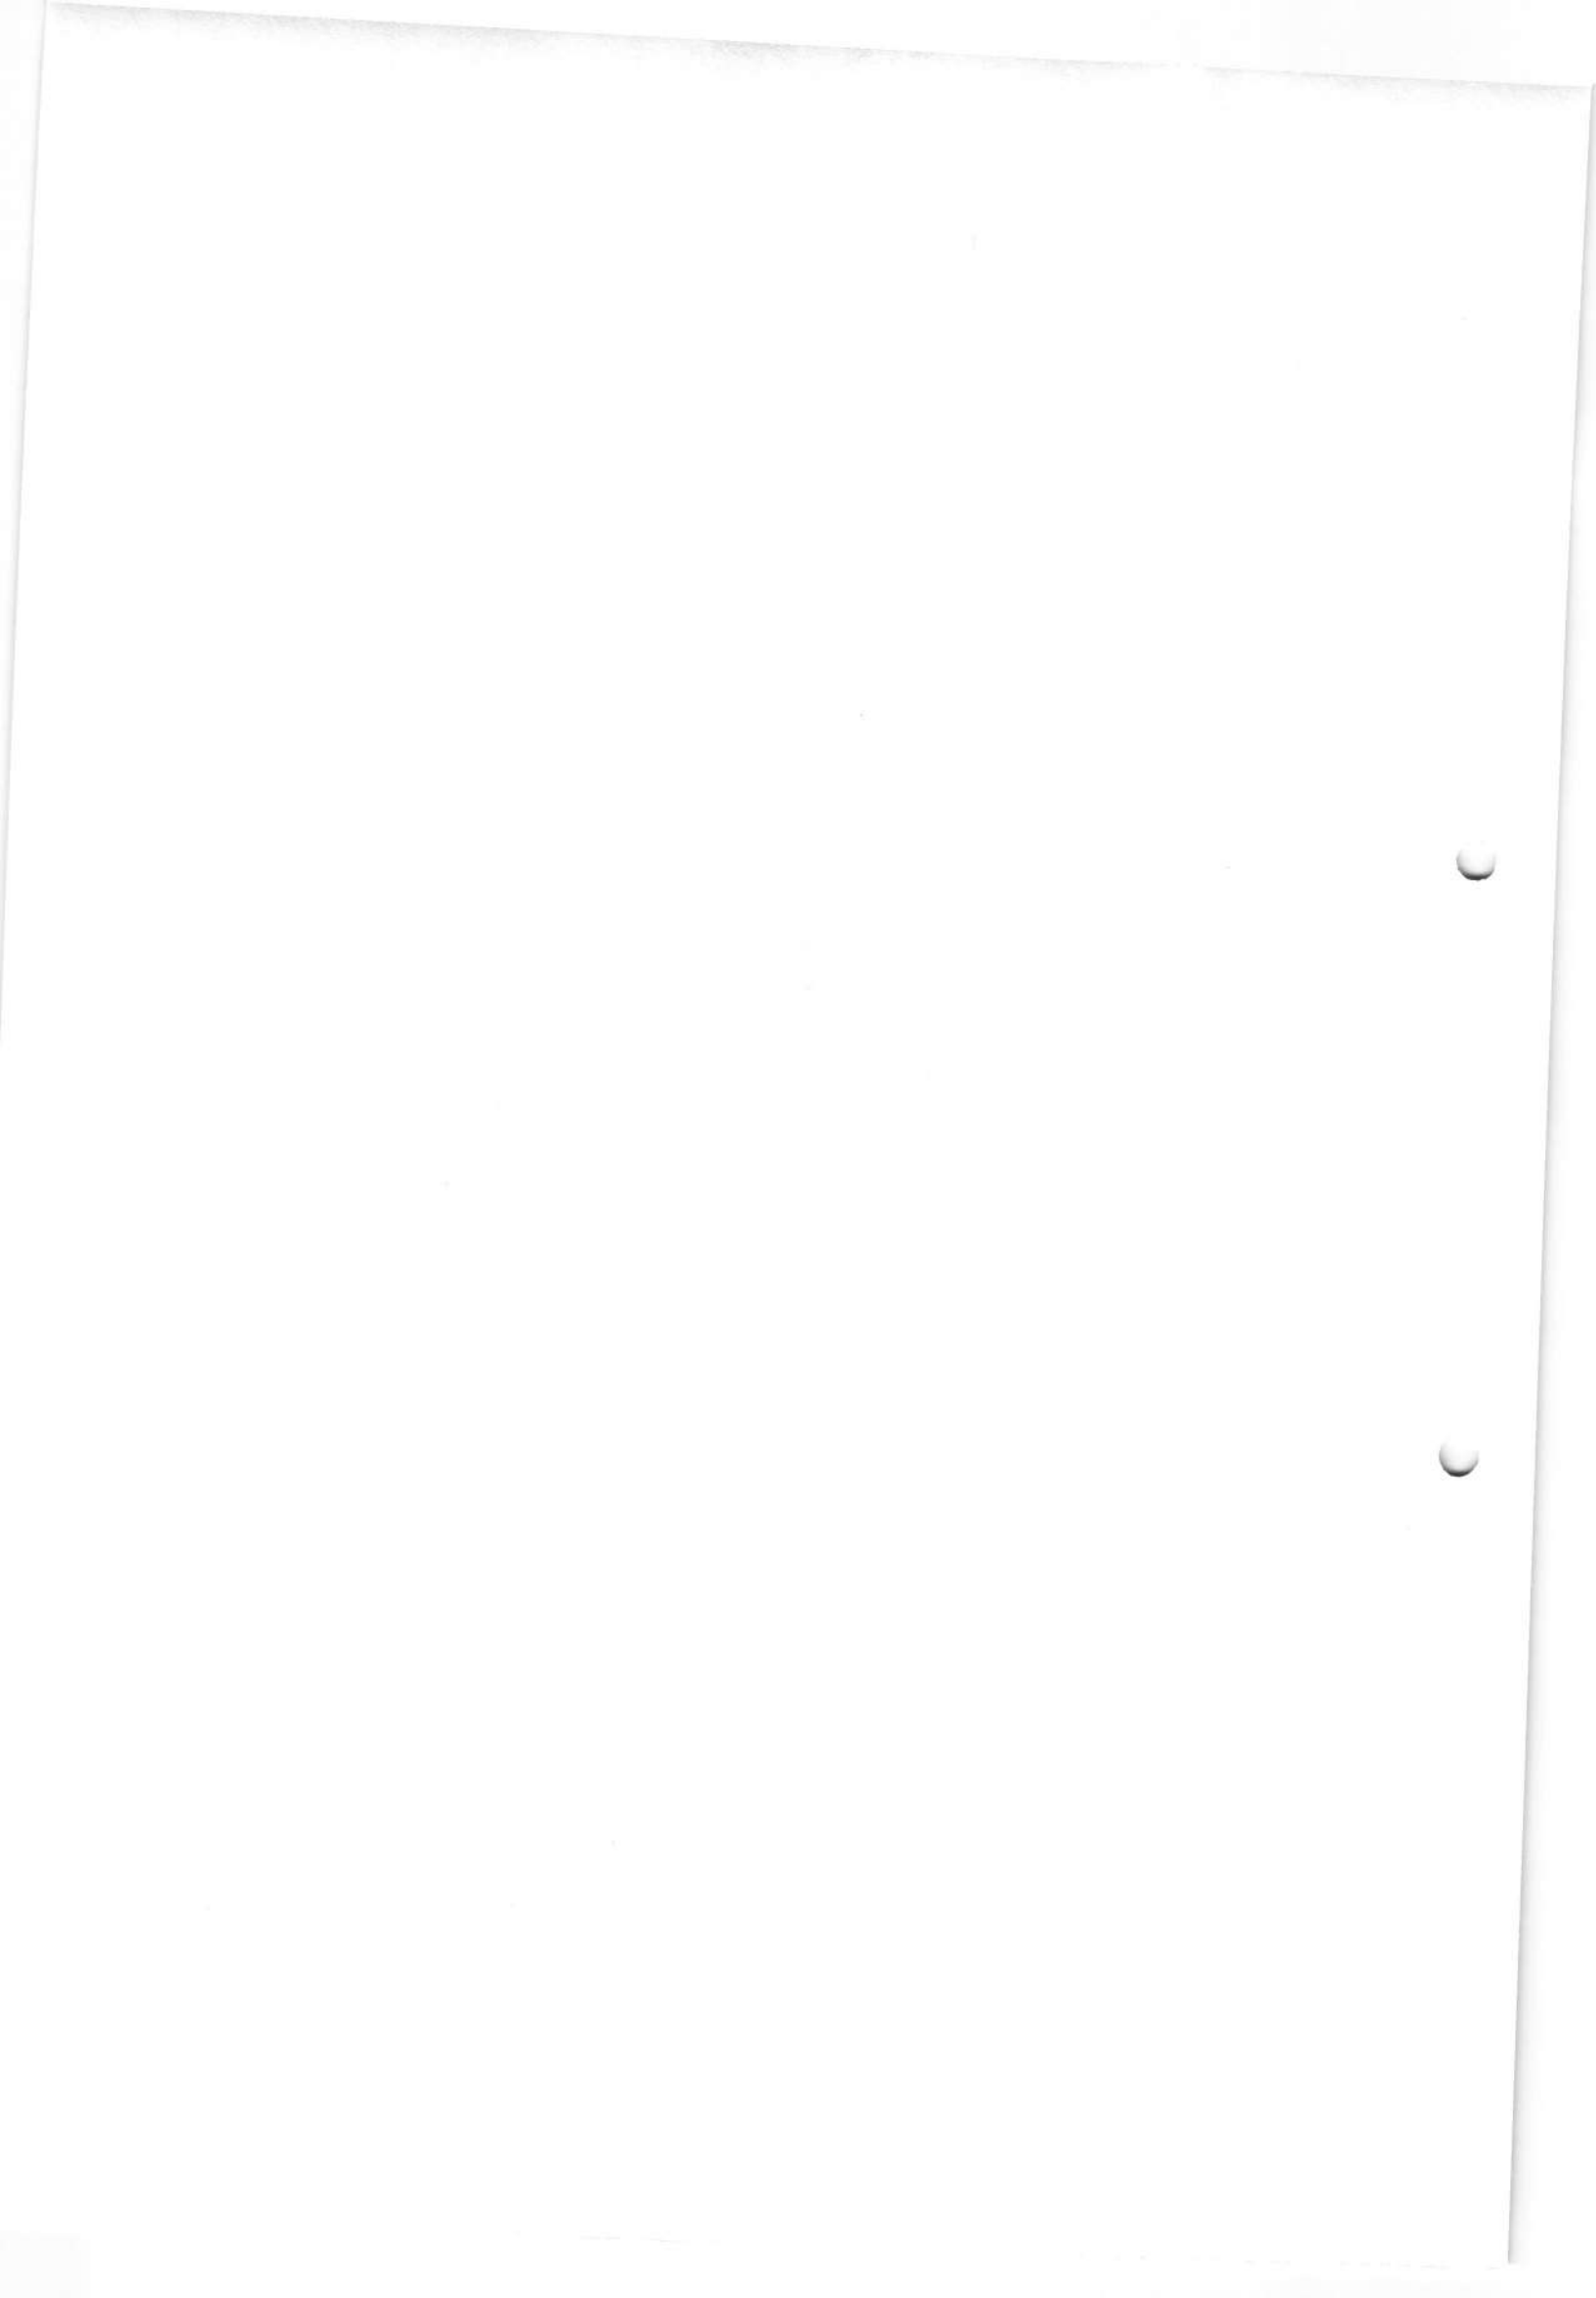

за Мерки(тип 3), отнасящи се до спазване на наличния финансов ресурс

1). мерки, целящи избягване или минимизиране размера на претендираните суми, чиито източник са непредвидените разходи като част от офертата на съответния участник;

2). мерки, свързани с избягване увреждане на чуждо имущество и последващи финансови претенции от тях към възложителя.

За посочените мерки е представил:

- предложение за обхват, план и конкретни действия, свързани с реализация на изведените мерки, вкл. съставлящите ги фактори и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана

и

- Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество при изпълнение на настоящата обществена поръчка

и

отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености

разгледани са всички базови мерки.


КТП2: Организация за изпълнение на дейностите

КТП2А-Първа степен на оценяване, за оферти съдържащи в себе си задължителен компонент по съответните приложения към техническото предложение предложен от участниците и представляващ базово/минимално изискване по всеки един показател

1. **Минимално изискване:** Дейности за изпълнението на предмета на поръчката, като са обхванати всички работи и технологични процеси, необходими за изпълнението предмета на поръчката, отчитайки времето за тяхното изпълнение, включително подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнението на СМР, тествания (в приложимите случаи), въвеждане на строежа в експлоатация, както и всички други съпътстващи работи, необходими за постигане целите на предмета на поръчката и

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

Участника е обхванал етапите на изпълнение както следва: Етап I подготвителни работи, който обхваща Сключване на договор за изпълнение ; Комуникация между изпълнителя и останалите участници в строителния процес; Подготовка на техническа документация съгласно сключения договор за строителство, подготовка на строителната документация; Подготовка на документи за откриване на строителна площадка (за Подписване на Протокол 2а); Етап II Изпълнение на СМР-Временно строителство– Дейности по изпълнение на Подготвителни работи, включително мобилизация на механизация, оборудване, работна сила. Описани са дейностите които е се извършват: определени местата на постоянните лагери за строителни работници и използваната механизация; определени местата на първите временни лагери за строителна техника; определени местата за складиране на материали и продукти; определени местата за организиране на производствени бази; организирана охраната и контрола на достъп до обекта; определени площадките

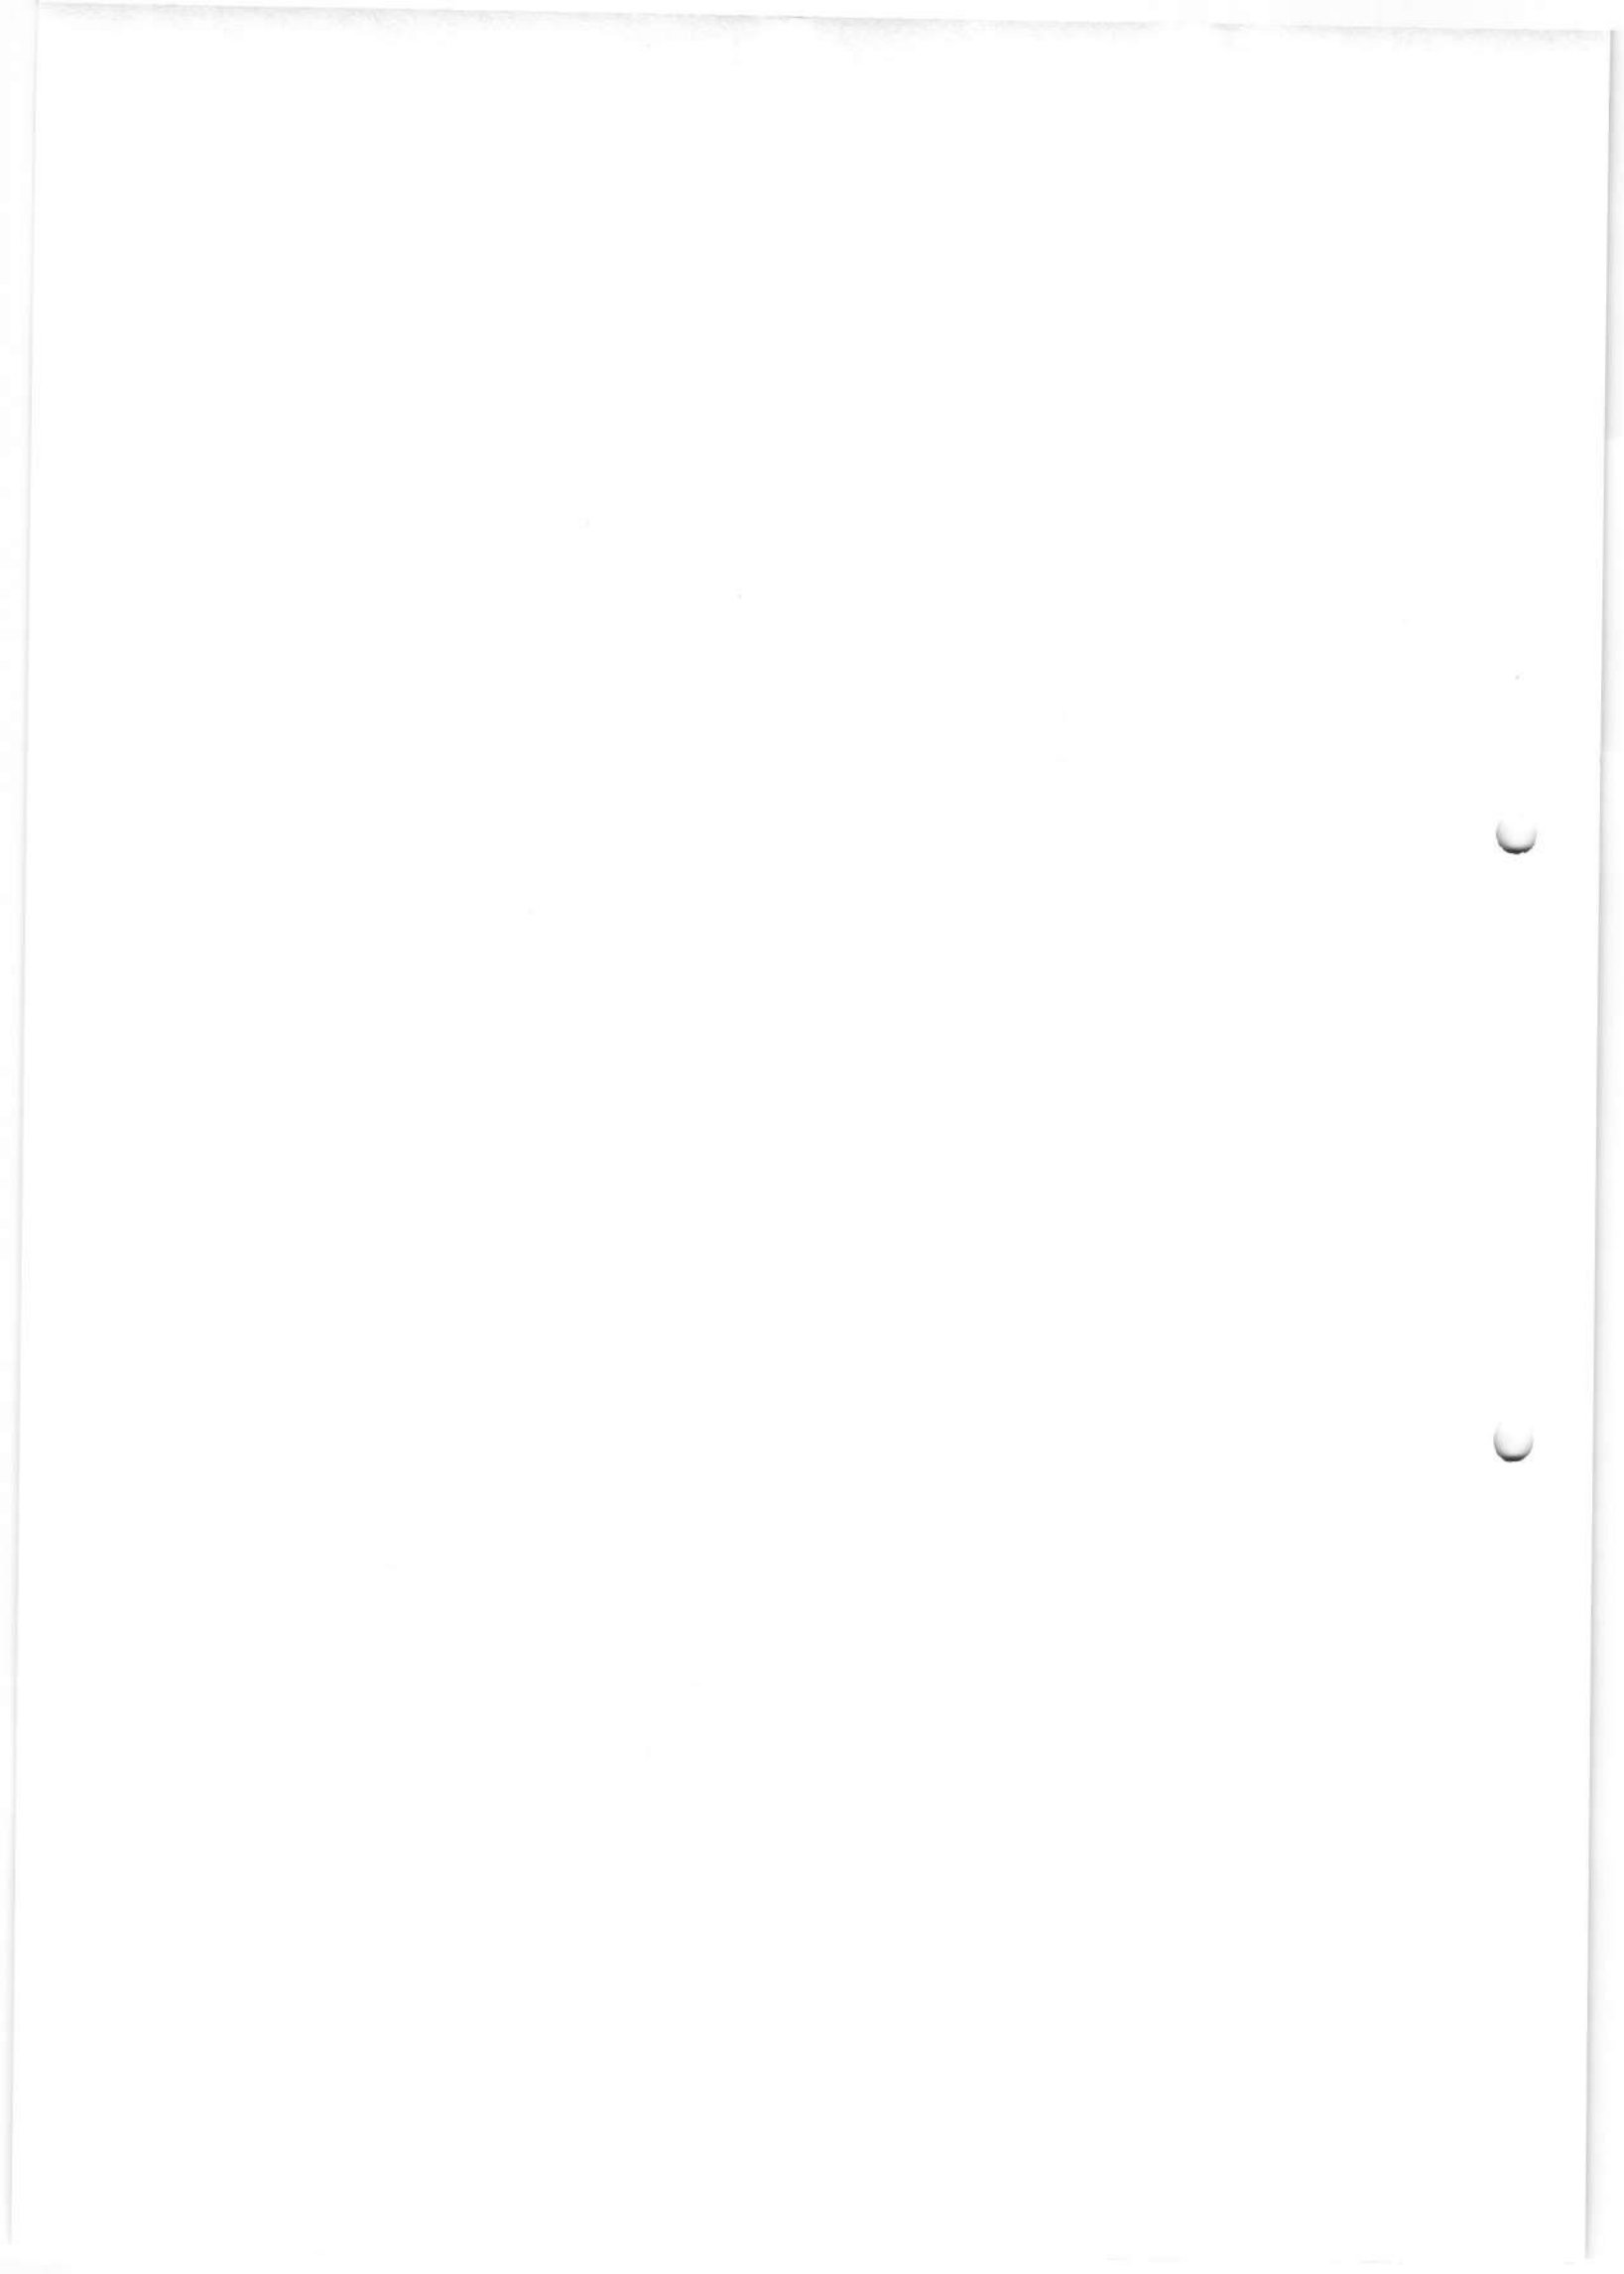

за депониране на материалите от изкопи; определени площадките за складиране на отпадъците, охрана на обекта; фургони за канцеларии на техническия персонал и координаторът по безопасност и здраве, за съблекални и кратък отход на работниците, химически тоалетни; противопожарно оборудване; обособяване на площадки: строителна база – на тази база ще се организира, битова част за работниците, като се допуска наличието на складова и производствена част и база за механизация;складова база – чисто складова база за отделни материали, изделия и заготовки.складово производство база – складиране на материали, обработка и производство на смеси, разтвори и изделия; представена е схема на временното селище; Поставяне на предпазни заграждения и предупредителна сигнализация; дейности по обезопасяване на района на работа;схеми на временна организация на движението; Установяване на контакти с експлоатационните дружества ВиК, Енергоснабдяване оператори и други заинтересовани дружества и организации; Охрана на обекта и пропускателен режим; Откриване на строителната площадка - Подписване на Протокол 2а; Дейности по Доставка на материали и оборудване; Дейности по изпълнение на строително-монтажни работи; Тествания- ИЗПИТВАНЕ НА ПЛЪТНОСТ НА ВОДОПРОВОДА; ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДА;ИЗПИТВАНЕ НА ОБРАТНИЯ НАСИП; асфалтова смес; Етап III Предаване на обекта на възложителя; Дейности по завършване и предаване на обекта на Възложителя - Издаване и подписване на протокол Акт - образец № 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г.

След това участника е представил Дейности за изпълнението на предмета на поръчката, като са обхванати всички работи и технологични процеси, необходими за изпълнението предмета на поръчката по клонове

Предвиде ни са всички дейности за изпълнението на предмета на поръчката, ведно с всички работи и технологични процеси, необходими за изпълнението предмета на поръчката, отчетено е времето за тяхното изпълнение, включително

подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнението на СМР, тествания (в приложимите случаи), въвеждане на строежа в експлоатация, както и всички други съпътстващи работи, необходими за постигане целите на предмета на поръчката

2. Минимално изискване: Последователността на строителните процеси в зависимост от представения технологичен подход за постигането на целите на предмета на поръчката, включително чрез определяне на тяхната продължителност в съответствие с Техническите спецификации и

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

Участника е представил Последователността на строителните процеси в зависимост от представения технологичен подход за постигането на целите на предмета на поръчката, включително чрез определяне на тяхната продължителност в съответствие с Техническите спецификации

3. Минимално изискване:Организацията на строителната площадка, както в периода на подготовката ѝ и изграждане на временното строителство, така и в периода на същинското строителство, включително на доставките и складирането на материалите и строителните продукти, като същата е съобразена с предложението за изпълнение на основните дейности/СМР и гарантира осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност на обекта и

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

Участника е обхванал етапите на изпълнение както следва: Етап I подготвителни работи, който обхваща Сключване на

договор за изпълнение ; Комуникация между изпълнителя и останалите участници в строителния процес; Подготовка на техническа документация съгласно сключения договор за строителство, подготовка на строителната документация; Подготовка на документи за откриване на строителна площадка (за Подписване на Протокол 2а); Етап II Изпълнение на СМР-Временно строителство– Дейности по изпълнение на Подготвителни работи, включително мобилизация на механизация, оборудване, работна сила. Описани са дейностите които е се извършват: определени местата на постоянните лагери за строителни работници и използваната механизация; определени местата на първите временни лагери за строителна техника; определени местата за складиране на материали и продукти; определени местата за организиране на производствени бази; организирана охраната и контрола на достъп до обекта; определени площадките за депониране на материалите от изкопи; определени площадките за складиране на отпадъците. охрана на обекта; фургони за канцеларии на техническия персонал и координаторът по безопасност и здраве, за съблекални и кратък отход на работниците, химически тоалетни; противопожарно оборудване; обособяване на площадки: строителна база – на тази база ще се организира, битова част за работниците, като се допуска наличието на складова и производствена част и база за механизация;складова база – чисто складова база за отделни материали, изделия и заготовки.складово производствена база – складиране на материали, обработка и производство на смеси, разтвори и изделия; представена е схема на временното селище; Поставяне на предпазни заграждения и предупредителна сигнализация; дейности по обезопасяване на района на работа;схеми на временна организация на движението; Установяване на контакти с експлоатационните дружества ВиК, Енергоснабдяване оператори и други заинтересовани дружества и организации; Охрана на обекта и пропускателен режим; Откриване на строителната площадка - Подписване на Протокол 2а; Дейности по Доставка на материали и оборудване; Дейности по изпълнение на строително-монтажни работи; Тествания- ИЗПИТВАНЕ НА ПЛЪТНОСТ НА ВОДОПРОВОДА; ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДА;ИЗПИТВАНЕ

НА ОБРАТНИЯ НАСИП; асфалтова смес; Етап III Предаване на обекта на възложителя; Дейности по завършване и предаване на обекта на Възложителя - Издаване и подписване на протокол Акт - образец № 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г.

След това в табличен вид е представил вид на дейността ; Организация на Подготвителни работи; Организация на Работи по изпълнение на СМР за всички дейности попадащи в обхвата на възлагане

Обхванати са и доставка на основните материали , като е обхванал Основните етапи при организирането на доставките-
Стъпка 1: Поръчка за закупуване; Стъпка 2: Покана за предоставяне на оферти; Стъпка 3: Оценяване на офертите;
Стъпка 4: Споразумение за доставка; Стъпка 5: Осигуряване на копие от всички документи и форми свързани с оборудването за Обекта; входящ контрол на материалите;предвижда При доставянето на материалите те ще бъдат подложени на повторен идентификационен контрол включително: външен вид, фабрично обозначение, място на производство, пореден производствен номер, обозначение в съответствие с плана за полагане, евентуални увреждания по време на транспортирането и др. Освен визуален контрол ще се извършва и контролно изпитване чрез вземане на случайни проби; представени са дейности по Транспортирането и складирането на материалите; Графикът за доставката дейности по Складиране на материали и строителните продукти; Организацията по доставката на материали ще бъде групирана , в следните групи: 1 група Тръби PE-HD, PE100, PN10; Спирателен кран; Пожарен хидрант ф80 надземен; Автоматичен въздушник; Ел. заваряема водовземна скоба; 2 група-Льосова почва за засипване; Нестандартна баластра; Материал за основа с различна ширина и дебелина на пласта с CBR не по-малък от 80 % при плътност 98 % модифицирана суха плътност по AASHTO;3 група- Бетонови плочи в тротоар; Бетонови бордюри с размер 18/35/50(100), съгласно БДС 624-87;4група- Битумизирана основа съгласно БДС 4132-90 с минимално уплътнение 97%; Плътен асфалтобетон тип А, марка П, съгласно БДС 4132 за износващ пласт с дебелина в уплътнено

състояние 4 см

За всяка група е представил осигуряване на материала, транспортиране и съхранение/складиране/ ; след това в табличен вид е посочен, ил описание на основните материали и осигуряване на материала; описани са изискванията към Изисквания към основните материали и е предложен мерки за гарантиране на качеството

участника е направил предложение за безопасни и здравословни условия на труд в строителството като е представил **ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ЗЕМНИ РАБОТИ** ; При извършване на земни работи с булдозери; При извършване на земни работи с багери; При работа с автосамасвали; Здравословни и безопасни условия на труд при изпълнение на асфалтови работи; Изисквания за здравословни и безопасни условия на труд; Лични предпазни средства; Принудително и аварийно преустановяване на работата; **СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР; СИГНАЛИЗАЦИЯ ЗА БЕДСТВИЕ, АВАРИЯ, ПОЖАР ИЛИ ЗЛОПОЛУКА, С ОПРЕДЕЛЕНО МЯСТО ЗА ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ПОМОЩ; НОРМАТИВНА УРЕДБА**; Организация на строителната площадка; План за предотвратяване и ликвидиране на пожари и аварии и за евакуация на работещите и на намиращите се на строителната площадка; Организационен план по здравословни и безопасни условия на труд; Инструкции за безопасна работа; **ПОЛИТИКА ПО ЗДРАВΟΣЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД**; Рискове и мерки за предотвратяването им; Пожарна и аварийна безопасност, Пасивни мерки за пожарна безопасност; Активни мерки за пожарна безопасност; Строителни машини и устройства; Пожарна и аварийна безопасност; Дейности при аварии; Опазване на околната среда, като е обхванал редица мерки по опазване на околната среда

Участника е представил организацията на строителната площадка, както в периода на подготовката ѝ и изграждане на

временното строителство, така и в периода на същинското строителство, включително на доставките и складирането на материалите и строителните продукти, като същата е съобразена с предложението за изпълнение на основните дейности/СМР и гарантира осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност на обекта

4. Минимално изискване: Организацията на работата на инженерно-техническия (ръководен) състав на участника и на изпълнителския/ките екип/и (строителните работници), отговорни за строителството на обекта и предложение относно начините за осъществяване на координация и за съгласуване на дейностите по между им и

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

Участника е обхванал Предлагани експерти и разпределение на действията, задачите и отговорностите между тях, като предвижда Ръководител на обекта; Обектов технически ръководител; Експерт по ЗБУТ ; Експерт по контрол на качеството; Ръководител механизация и автотранспорт; Експерт ПТО; Счетоводител; Началник склад; описал е основните функции, задължения и отговорности на ръководния персонал и е представил организация на работа; след това е представил Организация на работа на Изпълнителски състав и бригадири и начините за осъществяване на координация и за съгласуване на дейностите по между им; представил е схема за йерархия, координация и съгласуване

5. Минимално изискване: Линеен график за изпълнение на обекта, отразяващ последователността и продължителността на всички видове работи и дейности, необходими за изпълнението и

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА

НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

Участника е представил Линеен график за изпълнение на обекта, отразяващ последователността и продължителността на всички видове работи и дейности, необходими за изпълнението

6. Минимално изискване:Представен качествен и количествен анализ на дефинираните от Възложителя рискове и направена оценка на вероятността за проявлението и степента на въздействие, които могат да предизвикат затруднения в планираната организация на изпълнението на дейностите от предмета на поръчката, както и предложена програма (относими към обекта) за управление на риска, включваща мерки за недопускане/предотвратяване на риска, в приложимите случаи, съответно обосновка за невъзможността да се предприемат подобни мерки в конкретния случай; мерки за преодоляване на риска, в случай на неговото настъпване;

Възложителят дефинира следните рискове, които могат да възникнат при изпълнението на обекта и които следва да бъдат отчетени от Участниците при подготовката на Предложението им за изпълнение на поръчката, а именно:

1. Закъснение началото на започване на изпълнението на строително-монтажните работи;
2. Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите по изпълнение на СМР;
3. Закъснение за окончателно приключване и предаване на строежа;
4. Трудности с използваната от изпълнителя техника и/или човешки ресурси;
5. Липса и/или недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес и/или

компетентни държавни и/или общински органи и институции;

6. Липса и/или неточности в проектната документация;

7. Промени в законодателството на Република България и/или на Европейския съюз, свързани с изпълнението на договора за обществена поръчка.

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

Участника е направил предложение в тази си част от офертата, като е обхванал:

Качествен и количествен анализ на всеки от дефинираните от Възложителя рискове, които могат да предизвикат затруднения в планираната организация на строителната площадка, като съответният риск следва минимум да бъде класифициран по вид. Класифициране на възможните рискове

Времеви рискове:

1. Закъснение началото на започване на изпълнението на строително-монтажните работи.
2. Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите по изпълнение на СМР.
3. Закъснение за окончателно приключване и предаване на строежа

Технически рискове:

4.Трудности с използваната от изпълнителя техника и/или човешки ресурси.

Нормативни рискове

Нормативни рискове

7. Промени в законодателството на Република България и/или на Европейския съюз, свързани с изпълнението на договора за обществена поръчка

Други рискове:

5. Липса и/или недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес и/или компетентни държавни и/или общински органи и институции;

6. Липса и/или неточности в проектната документация;

След това е предложил методика за оценка, по която е извършил количествен и качествен анализ.

В табличен вид е направил предложение: видове рискове; Класификация по вид; Качествен анализ и Количествен анализ за следните рискове: Закъснение началото на започване на изпълнението на строително-монтажните работи; Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите по изпълнение на СМР; Закъснение за окончателно приключване и предаване на строежа; Трудности с използваната от изпълнителя техника и/или човешки ресурси; Липса и/или недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес и/или компетентни държавни и/или общински органи и институции; Липса и/или неточности в проектната документация; Промени в законодателството на Република България и/или на Европейския съюз, свързани с изпълнението на

договора за обществена поръчка

След това е представил оценка на вероятността на проявление и степента на въздействие върху изпълнението на дейностите от предмета на поръчката, които ще бъдат засегнати от съответния риск, като в табличен вид е предложил по вертикала за дейности по отделните части, спрямо дефинираните от възложителя рискове, а именно Закъснение началото на започване на изпълнението на строително-монтажните работи; Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите по изпълнение на СМР; Закъснение за окончателно приключване и предаване на строежа; Трудности с използваната от изпълнителя техника и/или човешки ресурси; Липса и/или недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес и/или компетентни държавни и/или общински органи и институции; Липса и/или неточности в проектната документация; Промени в законодателството на Република България и/или на Европейския съюз, свързани с изпълнението на договора за обществена поръчка, вероятност от настъпване; степен на въздействие; оценка на риска

След това участника е предложил програма за управление на риска, която да включва: мерки за недопускане/предотвратяване на риска, в приложимите случаи, съответно обосновка за невъзможността да се предприемат подобни мерки в конкретния случай; мерки за преодоляване на риска, в случай на неговото настъпване, дейности за мониторинг и дейности за контрол, както следва

1.Закъснение началото на започване на изпълнението на строително-монтажните работи;

Към този риск са предложени:

мерки за недопускане/предотвратяване на риска; мерки за преодоляване на риска, в случай на неговото настъпване;

Дейности по мониторинг; Дейности по контрол	
2.Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите по изпълнение на СМР;	
Към този риск са предложени:	
мерки за недопускане/предотвратяване на риска; мерки за преодоляване на риска, в случай на неговото настъпване;	
Дейности по мониторинг; Дейности по контрол	
3.Закъснение за окончателно приключване и предаване на строежа;	
Към този риск са предложени:	
мерки за недопускане/предотвратяване на риска; мерки за преодоляване на риска, в случай на неговото настъпване;	
Дейности по мониторинг; Дейности по контрол	
4.Трудности с използването от изпълнителя техника и/или човешки ресурси;	
Към този риск са предложени:	
мерки за недопускане/предотвратяване на риска; мерки за преодоляване на риска, в случай на неговото настъпване;	
Дейности по мониторинг; Дейности по контрол	
5.Липса и/или недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес и/или компетентни държавни и/или общински органи и институции;	

Към този риск са предложени: мерки за недопускане/предотвратяване на риска; мерки за преодоляване на риска, в случай на неговото настъпване; Дейности по мониторинг; Дейности по контрол 6. Липса и/или неточности в проектната документация; Към този риск са предложени: мерки за недопускане/предотвратяване на риска; мерки за преодоляване на риска, в случай на неговото настъпване; Дейности по мониторинг; Дейности по контрол 7. Промени в законодателството на Република България и/или на Европейския съюз, свързани с изпълнението на договора за обществена поръчка. Към този риск са предложени: мерки за недопускане/предотвратяване на риска; мерки за преодоляване на риска, в случай на неговото настъпване; Дейности по мониторинг; Дейности по контрол <u>разгледани са всички базови рискове</u>	
КТПЗ: Мерки за опазване на околната среда	

КТПЗА-Първа степен на оценяване, за оферти съдържащи в себе си задължителен компонент по съответните приложения към техническото предложение предложен от участниците и представляващ базово/минималноизискване по всеки един показател

1. **Минимално изискване:**Предвидени са мерки за опазване на околната среда по всеки един от посочените аспекти, идентифицирани от Възложителя. Установява се подробно предложение относно всички мерки в тази част от офертата на участника, като са предвидени най-малко по една мярка за всеки един аспект. Всяка мярка съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението й и В)План за организация за изпълнение на мярката, с посочване на ресурсите(технически и човешки),

Базовите аспекти идентифицирани от възложителя са:

- Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с отработени горива, масла и др.работни течности от механизацията;
- Намаляване запрашеността на атмосферния въздух и шума при изпълнение на поръчката;
- Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на строителство;
- Оптимизиране на графика за доставка на материали за намаляване на трафика

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

Участника е направил предложение по следните аспекти по опазване на околната среда и е предвидел следните мерки към тях:



Аспект 1 Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с отработени горива, масла и др. работни течности от механизацията;

Мярка 1 Товарните автомобили и механизацията ще се поддържа в добро техническо състояние, за да се сведат до минимум вредните емисии от изгорели газове, теч на масла и гориво и др работни течности

Мярка 2 Извършване на инструктажи и провеждане на обучения на персонала и забрана за претоварване на транспортните средства над допустимия товар и извършване на ремонт на същите на строителната площадка

Мярка 3 Използване на механизация и транспортни средства от ново поколение и където е приложимо да се предпочитат и прилага изпълнението на дейностите ръчно пред механизирано

Към тези мерки, участника е направил предложение, относно:

А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен екологичен ефект;

Към тази точка е посочил обхват на мярката; предмет на мярката и целен екологичен ефект;

Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението й

Към тази точка е описал текущо прилагане на мярката и прилагане на действия в случаите на отклонение от

изпълнението й

В) План за организация за изпълнение на мярката, спосочване на ресурсите (технически и човешки), които ще се използват

Към тази точка е обхванат план за организация за изпълнение на мярката и ресурсите (технически и човешки), които

ще се използват

След това участника е направил предложение дейности за мониторинг на отрицателно влияние на строителния процес върху посочените аспекти идентифицирани от Възложителя като е направил предложение, по мярка 1, по мярка 2 и по мярка 3. След това е направил предложение за дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки, като е предложил дейности за контрол по мярка 1, по мярка 2 и по мярка 3

Аспект 2 Намаляване запрашеността на атмосферния въздух и шума при изпълнение на поръчката

запрашеност

Мярка 1 Покриване на транспортните средства с покривала при превоз на строителни отпадъци маси по предварително одобрени маршрути от възложителя

Към тази мярка, участника е направил предложение, относно:

Мярка 2 Ежедневно почистване,организиране и поддържане на строителната площадка, чрез събиране на строителните отпадъци и обмокрянето и с вода

Към тези мерки, участника е направил предложение, относно:

А).Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен екологичен ефект;

Към тази точка е посочил обхват на мярката; предмет на мярката и целен екологичен ефект;

Б).Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите наотклонение от изпълнението ѝ

Към тази точка е описал текущо прилагане на мярката и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ	
В)План за организация за изпълнение на мярката, спосочване на ресурсите(технически и човешки), които ще се използват	
Към тази точка е обхванал план за организация за изпълнение на мярката и ресурсите(технически и човешки), които ще се използват	
шум	
Мярка 1 Осигуряване на екрани, които ще предпазват от високи нива на шум, както и ограничаване изпълнението на шумни работи извън регламентирано време	
Мярка 2 Използване на транспортни средства от ново поколение, от които се генерира по –малко шум, включително и забрана на същите да работят на празен ход	
Към тези мерки, участника е направил предложение, относно:	
А).Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен екологичен ефект;	
Към тази точка е посочил обхват на мярката; предмет на мярката и целен екологичен ефект;	
Б).Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите наотклонение от изпълнението ѝ	
Към тази точка е описал текущо прилагане на мярката и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ	

В) План за организация за изпълнение на мярката, спосочване на ресурсите (технически и човешки), които ще се използват

Към тази точка е обхванат план за организация за изпълнение на мярката и ресурсите (технически и човешки), които ще се използват

След това участника е направил предложение за дейности за мониторинг на отрицателно влияние на строителния процес върху посочените аспекти идентифицирани от Възложителя, а именно: за Запращеност - По мярка 1 и По мярка 2; Шум - По мярка 1 и По мярка 2. След това е описал дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки, а именно: за Запращеност - По мярка 1 и По мярка 2; Шум - По мярка 1 и По мярка 2

Аспект 3 Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на строителство

Към този аспект е посочил следните мерки:

Мярка 1 Недопускане изоставянето, нерегламентирано изхвърляне и изгаряне или друга форма на неконтролирано обзвредяване на отпадъците

Мярка 2 Ежедневно събиране, извозване и депониране или оползотворяване на генерираните отпадъци от обекта за деня, като няма да се допуска отпадъци да нощуват на обекта

Към тези мерки, участника е направил предложение, относно:

А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен екологичен ефект;

Към тази точка е посочил обхват на мярката; предмет на мярката и целен екологичен ефект;

Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението й
Към тази точка е описал текущо прилагане на мярката и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението й

В)План за организация за изпълнение на мярката, спосочване на ресурсите(технически и човешки), които ще се използват

Към тази точка е обхванал план за организация за изпълнение на мярката и ресурсите(технически и човешки), които ще се използват

След това е направил предложение за дейности за мониторинг на отрицателно влияние на строителния процес по мярка 1 и по мярка 2. След това е направил предложение за дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки по мярка 1 и по мярка 2.

Аспект 4 Оптимизиране на графици за доставка на материали за намаляване на трафика
Към този аспект , участник е предвидил следните мерки

Мярка 1 Изготвяне и прилагане на график за необходимите за деня количества материали

Мярка 2 Доставка на материали в ненатоварен часови диапазон

Към тези мерки, участник е направил предложение, относно:

А).Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен екологичен ефект;

Към тази точка е посочил обхват на мярката; предмет на мярката и целен екологичен ефект;

Б).Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението й

Към тази точка е описал текущо прилагане на мярката и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ	
В)План за организация за изпълнение на мярката, спосочване на ресурсите(технически и човешки), които ще се използват	
Към тази точка е обхванал план за организация за изпълнение на мярката и ресурсите(технически и човешки), които ще се използват	
<u>Предложени са мерки по всички базови аспекти</u>	
2. <u>Минимално изискване:</u> План за отпадъците, генерирани вследствие изпълнението предмета на поръчката	
<u>ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:</u>	
Участника в табличен вид е посочил Вид отпадък и код; категоризация на отпадъците съгл чл.4от НУСОВРСМ; разпределение на задълженията; Честота на събиране; начин на депониране/ оползотворяване/ рециклиране	
Представил е А)Анализ на предвидените мерки и Б)Предложение за конкретни действия за опазване на околната средаСлед това е направил предложение А)Анализ на предвидените мерки , както следва: Мярка 1 Недопускане изоставянето, нерегламентирано изхвърляне и изгаряне или друга форма на неконтролирано обозвредяване на отпадъците;	
Към тази мярка, участника е направил предложение, относно:	

А).Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен екологичен ефект; Към тази точка е посочил обхват на мярката; предмет на мярката и целен екологичен ефект; Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението й Към тази точка е описал текущо прилагане на мярката и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението й В).План за организация за изпълнение на мярката, спосочване на ресурсите(технически и човешки), които ще се използват Към тази точка е обхванал план за организация за изпълнение на мярката и ресурсите(технически и човешки), които ще се използват	Мярка 2 Ежедневно събиране, извозване и депониране или оползотворяване на генерираните отпадъци от обекта за деня, като няма да се допуска отпадъци да нощуват на обекта Към тази мярка, участника е направил предложение, относно: А).Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен екологичен ефект; Към тази точка е посочил обхват на мярката; предмет на мярката и целен екологичен ефект; Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението й Към тази точка е описал текущо прилагане на мярката и прилагане на действия в случаите на отклонение от
--	--


изпълнението ѝ В)План за организация за изпълнение на мярката, спосочване на ресурсите(технически и човешки), които ще се използват Към тази точка е обхванал план за организация за изпълнение на мярката и ресурсите(технически и човешки), които ще се използват Предложил е дейности за мониторинг на отрицателно влияние на строителния процес и дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки След това е направил предложение от допълнителни мерки, А) Анализ на предвидените мерки, като е предложил характеристики и показатели на конкретните видове отпадъци и аргументи за тяхното третиране. Направил е Описание на мерки за изпълнение на йерархията на управление на отпадъците. Предложил е Б)Предложение за конкретни действия за опазване на околната среда, като е описал Превантивни природозащитни мерки , в това число Инструктажи; Почистване на работната площадка по време на строителството; Работа с изправни и регулирани ДВГ; Депониране на съществуващи стари материали само на регламентиран депа;след това е направил предложение Предвидени и дейности за мониторинг на Плана за отпадъците , както и предвидени и дейности за контрол на изпълнението на предложените действия	КТП4: Социални характеристики, свързани с изпълнението на поръчката
--	--

КТП4А-Първа степен на оценяване, за оферти съдържащи в себе си задължителен компонент по съответните приложения към техническото предложение предложени от участниците и представляващ базово/минимално изискване по всеки един показател

1. Минимално изискване: Предвидени са мерки касаещи социални характеристики по всеки един от посочените аспекти, идентифицирани от Възложителя. Установява се подробно предложение относно всички мерки в тази част от офертата на участника, като са предвидени най-малко по една мярка за всеки един аспект. Мерките отчитат спецификата на възлагащите работи и са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка съдържа едновременно три компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен социален ефект; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението й; В) План за организация за изпълнение на мярката, с посочване на ресурсите (технически и човешки).

Базовите аспекти идентифицирани от възложителя са :

- Организиране на работния процес, така че да се не се прекъсва достъпа и достъпната среда около строежа;
- Организиране на работния процес, така че да се минимизира неудобството за транспорта и пешеходците и гарантира безопасността им ;
- Организиране на работния процес, така че да се минимизира неудобството за гражданите в близост до обекта от прах, шум, замърсяване;
- Информирание на гражданите (живущи и работещи в близост до обекта) относно предстоящи строително-монтажни

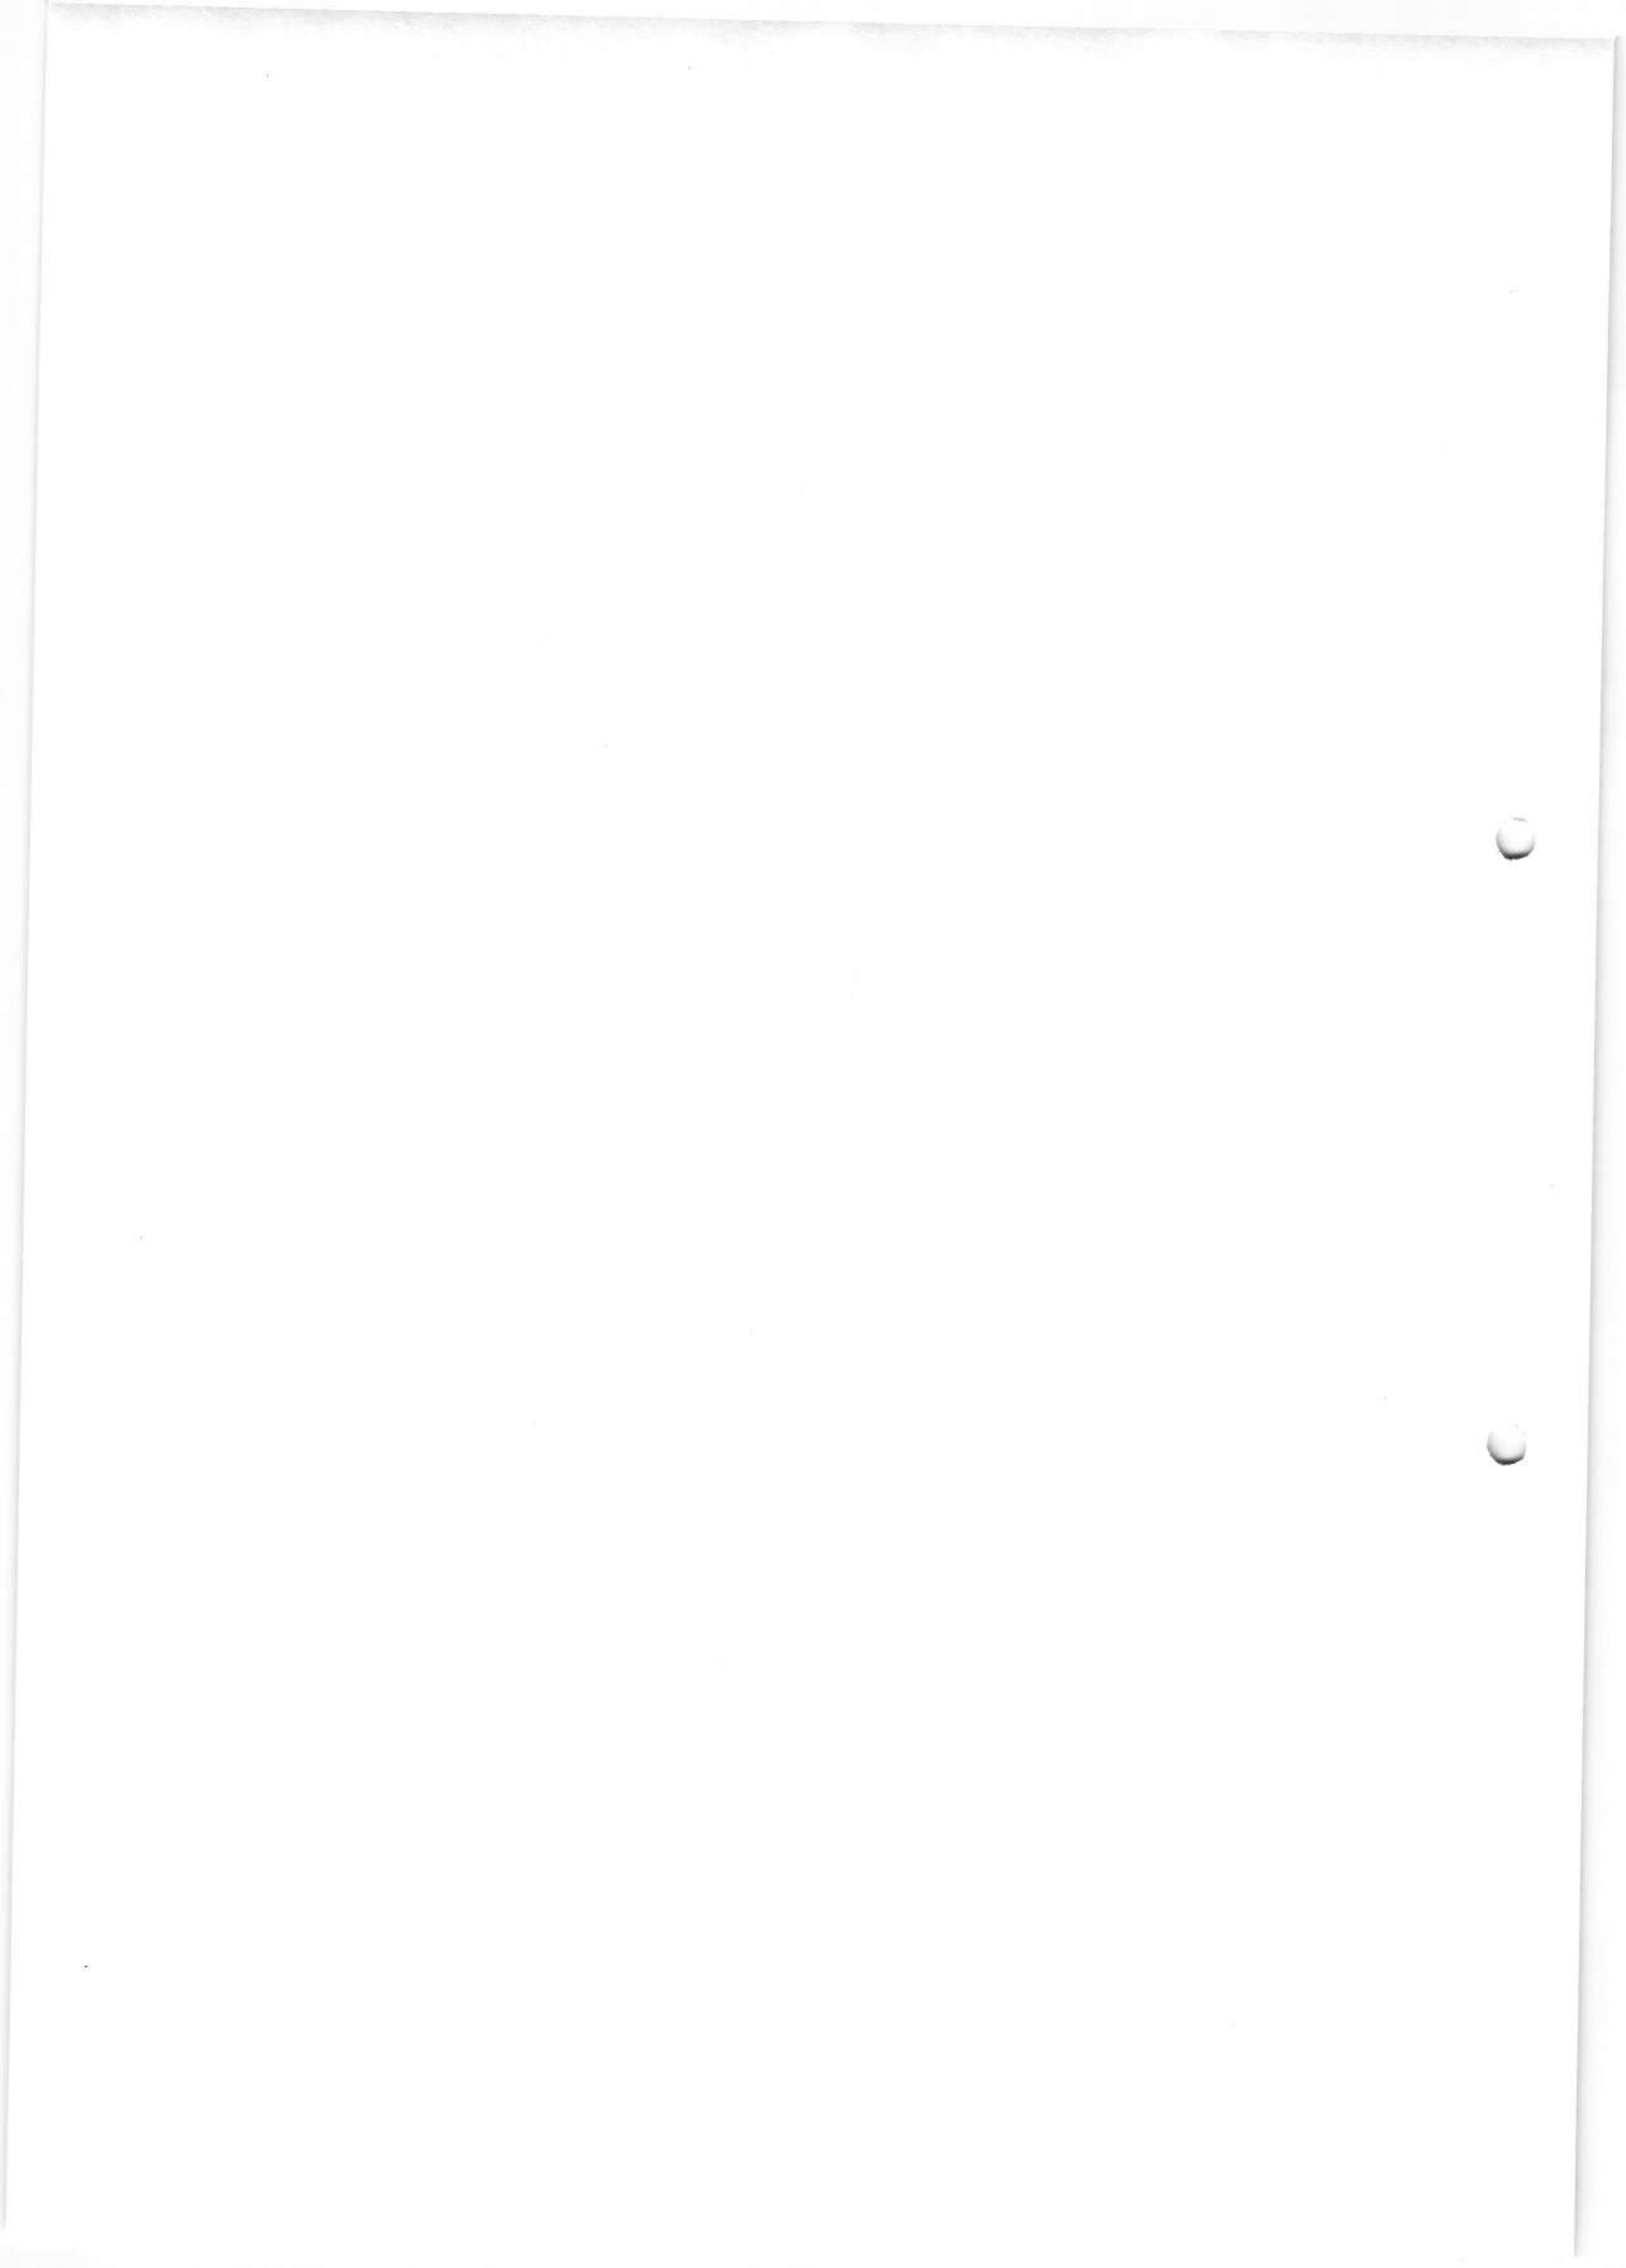

работи.

**ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА
НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:**

Участника е представил

Аспект 1 Организиране на работния процес, така че да се не се прекъсва достъпа и достъпната среда около строежа;

Мярка 1 Ежедневно извозване на строителни отпадъци и изкопани земни маси, с цел да не се прекъсва достъпа и достъпната среда около строежа

Към посочената мярка е представил:). Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен социален ефект; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението й; В) План за организация за изпълнение на мярката, с посочване на ресурсите (технически и човешки).

Мярка 2 Доставените количества материали, ще са необходимите за влагане за деня, като няма да се допуска материали да нощуват на обекта, с цел да не се прекъсва достъпа и достъпната среда около строежа

Към посочената мярка е представил:). Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен социален ефект; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението й; В) План за организация за изпълнение на мярката, с посочване на ресурсите (технически и човешки).

Аспект 2 Организиране на работния процес, така че да се минимизира неудобството за транспорта и пешеходите и

гарантира безопасността им

Мярка 1 Организиране на работния процес, така че да не се прекъсва транспортната свързаност между крайните точки на пътните/улични отсечки, както за автомобили, така и за пешеходци

Към посочената мярка е представил:). Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен социален ефект; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението й; В) План за организация за изпълнение на мярката, с посочване на ресурсите (технически и човешки).

Мярка 2 Осигуряване на необходимия инвентар - временни огради, заграждения, указателни табели и знаци, пасарелки и други, за обезпечаване безопасното преминаване, както на пешеходци, така и на автомобилния поток

Към посочената мярка е представил:). Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен социален ефект; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението й; В) План за организация за изпълнение на мярката, с посочване на ресурсите (технически и човешки).

Аспект 3 Организиране на работния процес, така че да се минимизира неудобството за гражданите в близост до обекта от прах, шум, замърсяване

Прах

Мярка 1 Покриване на транспортните средства с покривала при превоз на строителни отпадъци и земни маси по



предварително одобрени маршрути от възложителя

Към посочената мярка е представил:). Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен социален ефект; и Б).

Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението й; В) План за организация за изпълнение на мярката, с посочване на ресурсите(технически и човешки).

Мярка 2 Ежедневно почистване, организиране и поддържане на строителната площадка, чрез събиране на строителните отпадъци и обмъкването и с вода

Към посочената мярка е представил:). Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен социален ефект; и Б).

Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението й; В) План за организация за изпълнение на мярката, с посочване на ресурсите(технически и човешки).

шум

Мярка 1 Осигуряване на екрани, които ще предпазват от високи нива на шум, както и ограничаване изпълнението на шумни работи извън регламентирано време

Към посочената мярка е представил:). Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен социален ефект; и Б).

Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението й; В) План за организация за изпълнение на мярката, с посочване на ресурсите(технически и човешки).

Мярка 2 Използване на техника от ново поколение, от която се генерира по –малко шум, включително и забрана на същата да работи на празен ход

«Хранкострой 2019» ДЗЗД

Към посочената мярка е представил:). Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен социален ефект; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението й; В) План за организация за изпълнение на мярката, с посочване на ресурсите(технически и човешки).

замърсяване

Мярка 1 Ежедневно събиране, извозване и депониране или оползотворяване на генерираните отпадъци от обекта за деня, като няма да се допуска отпадъци да ношуват на обекта

Към посочената мярка е представил:). Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен социален ефект; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението й; В) План за организация за изпълнение на мярката, с посочване на ресурсите(технически и човешки).

Мярка 2 Недопускане изоставянето, нерегламентирано изхвърляне и изгаряне или друга форма на неконтролирано обозвредяване на отпадъците;

Към посочената мярка е представил:). Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен социален ефект; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението й; В) План за организация за изпълнение на мярката, с посочване на ресурсите(технически и човешки).

Аспект 4 Информирание на гражданите (живущи и работещи в близост до обекта) относнопредстоящи строително-монтажни работи

<u>Мярка 1 Изготвяне на седмични графици за предстоящите дейности и поставянето им на видно място</u> <u>Към посочената мярка е представил:</u>). Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен социален ефект; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението й; В) План за организация за изпълнение на мярката, с посочване на ресурсите (технически и човешки). <u>Мярка 2 Съобщения по местното радио и телевизия с цел достигане до по-голям кръг заинтересовани лица</u> <u>Към посочената мярка е представил:</u>). Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен социален ефект; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението й; В) План за организация за изпълнение на мярката, с посочване на ресурсите (технически и човешки). <u>Предложени са мерки по всички базови аспекти</u>
--

План за осигуряване на гаранционната поддръжка и устойчивост на обекта:

Изисквания:	Да/не
<u>Минимално изискване:</u> Превантивен мониторинг чрез регулярни огледи на място и/или други методи по предложение на участника (превантивни действия).- методи за наблюдение и оценка на състоянието на обекта по време на гаранционния период, включително честота на наблюдение, основни характеристики – обект на	Да

наблюдение, периодичност на докладване. Планираните методи, характеристики и периодичност да бъдат обвързани с осигуряването на нормално функциониране на обекта, както и предпоставки за появата на дефекти с цел ранна диагностика на проблеми, свързани с функционирането на обекта. <u>Представената част от плана отговаря на минималните изисквания на Възложителя, поради следните МОТИВИ:</u> Участника в тази си част от предложението е обхванал описание на обекта на поръчката. След това е посочил, че За целите на превантивния мониторинг по време на гаранционни период предлага обекта да бъде разделен на две групи : Първа група:изпълнени видими дейности –като посочва дейностите които попадат в тази група; Втора група:дейности , които са подлежащи на закриване и не са видими – като отново е описал дейностите които попадат в тази група. След това е направил предложение Превантивен мониторинг чрез регулярни огледи на място, като за метод на наблюдение е посочил как ще се извършва огледа съобразно предложените от него групи- по първа и втора. Описани са методите за наблюдение за конкретните дейности; Оценка на състоянието на обекта- след изпълнение на огледа от специалистите констатациите се записват в Дневник на обекта, като се описват всички нередности или нормален режим на работа на обекта и съответните елементи. Честота на наблюдение- предвижда минимум един път на всеки 6 месеца, предвид нейната значимост и опазване живота и здравето на хората . Също така предвижда на всеки два месеца разговор по телефон и/или имейл да поддържа контакт с инвеститорски контрол , за превантивен мониторинг за състоянието на изпълнените дейности. След предаване на обекта на възложителя възнамерява първият месец да се правят ежеседмични огледи на място, с цел установяване правилното набиране на якост, слягания, и други

процеси които се характеризират при изпълнение на дейностите Периодичност на докладване- При констатиране на нормален режим на работа След извършване на огледа веднага ще бъде изготвен доклад и представен на възложителя . При констатирана нередност веднага се уведомява Възложителя . Първо по телефон и след това писмено вхотирано в деловодството и/или по имейл. Обхванал е дейности за мониторинг. След това е описал основните характеристики обект на наблюдение и дейности за ранна диагностика на дефекти	Да <u>Минимално изискване:</u>Честота на превантивен мониторинг-е на всеки 6 месеца <u>Представената част от плана отговаря на минималните изисквания на Възложителя, поради следните МОТИВИ:</u> предвижда минимум един път на всеки 6 месеца, предвид нейната значимост и опазване живота и здравето на хората . Също така предвижда на всеки два месеца разговор по телефон и/или имейл да поддържа контакт с инвеститорски контрол , за превантивен мониторинг за състоянието на изпълнените дейности. След предаване на обекта на възложителя възнамерява първият месец да се правят ежеседмични огледи на място, с цел установяване правилното съхнене, набиране на якост, слягания, и други процеси които се характеризират при изпълнение на дейностите
---	--

<u>Минимално изискване:</u>изпълнение на необходимите коригиращи дейности, за постигане на нормално функциониране и отстраняване на дефекти, свързани с описаните аспекти и дефекти Съществени дефекти са такива, свързани с: - Дефекти в резултат на несъответствие на качеството на вложените материали с техническата спецификация, включително тяхната годност и дълготрайност; - Дефекти, свързани с начина на изпълнение на строително – монтажните работи; - Срок на годност в съчетание на материал и технология. <u>Представената част от плана отговаря на минималните изисквания на Възложителя, поради следните МОТИВИ:</u> Участника е направил предложение за коригиращи дейности, за постигане на нормално функциониране и отстраняване на дефекти, свързани с по-горе описаните аспекти и дефекти, като е описал организацията на екипа, който извършва огледите и коригиращите действия за постигане на нормално функциониране; обхванал е дейности за Непрекъснато функциониране на сградата и действия за Дефекти в резултат на несъответствие на качеството на вложените материали с техническата спецификация, включително тяхната годност и дълготрайност; Дефекти, свързани с начина на изпълнение на строително – монтажните работи; Срок на годност в съчетание на материал и технология	Да
<u>Минимално изискване:</u>Реакция при констатирани дефекти, включително описание на процедури за реакция, отстраняване и срокове (коригиращи действия)-описание на техническия капацитет, необходимите ресурси и процедури за мобилизация за осигуряване на ефективна и навременна реакция и отстраняване на констатирани дефекти. Предвид обществената значимост на обекта на интервенция, максимално допустимият	да

срок за реакция е 4 часа, а за отстраняване на констатираните дефекти е 24 /двадесет и четири / часа. Сроктът може да бъде удължаван само при обективна невъзможност за срок, предварително съгласуван с Възложителя. <u>Представената част от плана отговаря на минималните изисквания на Възложителя, поради следните МОТИВИ:</u> Участника е предложил срок за реакция е 4 часа, а за отстраняване на констатираните неизправности и повреди е 24 часа Предложил е <i>Обосновка за Сроковете за реакция и отстраняване на дефекти за всички елементи на гаранционна отговорност и доказателства</i>, че в посочените от участника срокове ще обезпечи необходимите доставки и ще извърши необходимите строително – монтажни работи, за да гарантира запазване на качествените характеристики на елементите, които характеристики съответстват на заложените в техническата спецификация След това е направил предложение за организацията за осигуряване на техническия и изпълнителски капацитет, както и Механизация,транспортни средства , инвентар и инструменти за гаранционна поддръжка; направил е описание на инженерно- техническия състав и е определил техните отговорности. След това в табличен вид е направил Описание на изпълнителски състав, механизация, транспортни средства, инвентар и инструменти и материали предвидени за изпълнение на гаранционната поддръжка по дейности подлежащи на гаранционна поддръжка.След това е направил предложение <i>Процедурите за мобилизация и Осигуряване (обезпечаване) подмяната на материалите или други елементи и съоръжения, които са повредени или негодни за експлоатация</i>	
--	--

	<u>Минимално изискване:</u> Комуникация с Възложителя през периода на гаранционните срокове-включващ като минимум: процедури за докладване на резултатите от превантивния мониторинг, регистър на констатираните проблеми и предприетите мерки за отстраняване на констатирани дефекти, оценка на рисковете, свързани с неправилна експлоатация, намеса на трети страни и препоръки за преодоляването им. <u>Представената част от плана отговаря на минималните изисквания на Възложителя, поради следните МОТИВИ:</u> Участника е предложил план за комуникация с възложителя, който обхваща Процедури за докладване на резултатите от превантивния мониторинг, регистър на констатираните проблеми и предприетите мерки за отстраняване на констатирани нередовности. Предложени са Оценка на рисковете, свързани с неправилна експлоатация, намеса на трети страни и препоръки за преодоляването им, като в табличен вид е описал видове рискове; вероятност от настъпване; оценка на риска; степен на въздействие; Препоръка за преодоляване	Да <u>Минимално изискване:</u> Дейностите по превантивен мониторинг, докладване и отстраняване на констатирани дефекти-трябва да обхващат всички елементи на обекта, които са предмет на гаранционна отговорност, а именно: -Водопровод и елементите към него; -Асфалтови покрития, бордюри и тротоари;
--	---	--

<u>Представената част от плана отговаря на минималните изисквания на Възложителя, поради следните МОТИВИ:</u> Участника е предложил Дейностите по превантивен мониторинг, докладване и отстраняване на констатирани дефекти обхващат всички елементи на обекта, които са предмет на гаранционна отговорност, а именно: -Водопровод и елементите към него; -Асфалтови покрития, бордюри и тротоари;	Да <u>Минимално изискване:</u>Обосновка на предложения срок за реакция и отстраняване на констатирани дефекти, за всяка от изброените групи елементи. Срокът за реакция трябва да включва и времето на доставка и монтаж на материали и /или оборудване. <u>Представената част от плана отговаря на минималните изисквания на Възложителя, поради следните МОТИВИ:</u> Участника е представил Обосновка на предложени срок за реакция и отстраняване на констатирани дефекти, за всяка от изброените групи елементи
---	--

ВЪВ ВРЪЗКА С ГОРЕЦИТИРАНИТЕ КОНСТАТАЦИИ И МОТИВИ ОТНОСНО съдържанието на техническото предложение на участника спрямо Първа степен на оценяване , КОМИСИЯТА ЗАКЛЮЧИ, ЧЕ ПРЕДСТАВЕНОТО ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТГОВАРЯ НА МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ СЪГЛАСНО документацията за участие и съответно отговаря на Първа степен на оценяване, за оферти съдържащи в себе си

задължителен компонент по съответните приложения към техническото предложение предложен от участниците и представляващ базово/минимално изискване по всеки един показател .

Констатации на комисията относно съдържанието на техническото предложение на участника спрямо втора и трета степен на оценяване:

КТШ1: Предлагаан подход за качествено изпълнение на поръчката
КТШ1Б- Втора степен за оценяване, в който са въведени допълнителни компоненти за всеки един от подпоказателите, които се явяват надграждащи над базовите и същите могат да бъдат предлагани от участниците ,т.е. те не са от задължителен характер. Тези надграждащи компоненти са във връзка с установяване на наличието на преимущества на предложението спрямо базовите.
Минимално изискване: По една допълнителна мярка за мерки-тип 1, тип 2 и тип 3 за осигуряване на качество при изпълнение на строителството – извън базовите мерки , като предложената допълнителна мярка отчита спецификата на възлаганите работи и е насочена към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и характерни особености. За всяка от допълнителните мерки предложението отговаря едновременно на следните условия:

- предложение за обхват, план и конкретни действия, свързани с реализация на изведените по-горе мерки, вкл. съставлящите ги фактори и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана

и

- Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество при изпълнение на настоящата обществена поръчка

и

- Входящ контрол от страна на персонала, отговарящ за контрола на качеството при логистиката, свързана с поръчване и получаване на материали и други продукти за строежа, както и контрол на качеството на труда по Мерки(тип 1). Тези мерки следва да гарантира, че на строежа няма да се вложат материали, изделия и/или други стоки, имащи явни или скрити дефекти и че СМР ще бъдат изпълнени с необходимото качество според инвестиционния проект, действащите стандарти и добри практики.

и

да отчетат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

Участника е представил допълнителни мерки, както следва:

-Мерки(тип 1), свързани с изпълнение на СМР - предвид обхвата на възлаганите СМР, както и относителната сложност на обекта в неговата:

Мерки по осигуряване на инженерно-технически и изпълнителски състав, обезпечавщи изпълнението на строежа, както и осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

За посочената мярка е представил:

- предложение за обхват, план и конкретни действия, свързани с реализация на изведените мерки, вкл. съставлящите ги фактори и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана

и

- Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество при изпълнение на настоящата обществена поръчка

и

- Входящ контрол от страна на персонала, отговарящ за контрола на качеството при логистиката, свързана с поръчване и получаване на материали и други продукти за строежа, както и контрол на качеството на труда по Мерки(тип 1). Тези мерки следва да гарантира, че на строежа няма да се вложат материали, изделия и/или други стоки, имащи явни или скрити дефекти и че СМР ще бъдат изпълнени с необходимото качество според инвестиционния проект, действащите стандарти и добри практики.

и

отчитат спецификата на възлаганите работи и са насочени към конкретната обществена поръчка, а не са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености

- Мерки(тип 2), отнасящи се до извършване на тестове (проби) след завършване на СМР - за да е възможно законосъобразното завършване на обекта и последващото му въвеждане в експлоатация бъдещият изпълнител следва да извърши тестове/проби (независимо дали единични или комплексни), доказващи експлоатационната годност на изградените мрежи и съоръжения. Последното е съществен елемент, свързан с цялостното спазване на определения чрез договора срок:

1.Контрол по време на изпълнение на основните дейности, с цел недопускане последващи неуспешни проби (т.е. резултати от проби, които не доказват експлоатационната годност на обекта или негова част)

За посочената мярка е представил:

- предложение за обхват, план и конкретни действия, свързани с реализация на изведените мерки, вкл. съставлящите ги фактори и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана

и

- Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество при изпълнение на настоящата обществена поръчка

и

отчитат спецификата на възлаганите работи и са насочени към конкретната обществена поръчка, а не са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености

<u>-Мерки(тип 3), отнасящи се до спазване на наличния финансов ресурс</u>	Изготвяне на ежеседмични вътрешнофирмени финансови доклади за изпълнени дейности, за проследяване на паричния поток За посочената мярка е представил: - предложение за обхват, план и конкретни действия, свързани с реализация на изведените мерки, вкл. съставлящите ги фактори и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана - и - Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество при изпълнение на настоящата обществена поръчка - и отчитат спецификата на възлаганите работи и са насочени към конкретната обществена поръчка, а не са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености <u>предложени са по една допълнителна мярка по всички типови мерки.</u>
КТП1В- Трета степен за оценяване, в който са въведени допълнителни компоненти за всеки един от подпоказателите, които се явяват надгравждащи над базовите и същите могат да бъдат предлагани от участниците ,т.е. те не са от задължителен характер. Тези надгравждащи компоненти са във връзка с установяване на наличието на преимущества на	

предложенията спрямо базовите.

Минимално изискване: По още една или повече допълнителни мерки за мерки-тип 1, тип 2 и тип 3 осигуряване на качество при изпълнение на строителството – извън базовите мерки, като предложените допълнителни мерки отчит спецификата на възлаганите работи и са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и характерни особености.

За всяка от допълнителните мерки предложението отговаря едновременно на следните условия:

- предложение за обхват, план и конкретни действия, свързани с реализация на изведените по-горе мерки, вкл. съставлящите ги фактори и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана

и

- Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество при изпълнение на настоящата обществена поръчка

и

- Входящ контрол от страна на персонала, отговарящ за контрола на качеството при логистиката, свързана с поръчване и получаване на материали и други продукти за строежа, както и контрол на качеството на труда по Мерки(тип 1). Тези мярки следва да гарантира, че на строежа няма да се вложат материали, изделия и/или други стоки, имащи явни или скрити дефекти и че СМР ще бъдат изпълнени с необходимото качество според инвестиционния проект, действащите стандарти и добри практики.

и

да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

Участника е представил по още една допълнителна мярка, както следва:

-Мерки(тип 1), свързани с изпълнение на СМР - предвид обхвата на възлаганите СМР, както и относителната сложност на обекта в неговата:

Мерки за осигуряване на надежно измервателно оборудване и инструменти, в т.ч. Проверка и калибриране на измервателно оборудване - геодезически инструменти Теодолити, Нивелири и Тотални станции, необходими за качествено изпълнение на обекта

За посочената мярка е представил:

- предложение за обхват, план и конкретни действия, свързани с реализация на изведените мерки, вкл. съставлящите ги фактори и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана

и

- Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество при изпълнение на настоящата обществена поръчка

и

- Входящ контрол от страна на персонала, отговарящ за контрола на качеството при логистиката, свързана с поръчване и получаване на материали и други продукти за строежа, както и контрол на качеството на труда по Мерки(тип 1). Тези мярки следва да гарантира, че на строежа няма да се вложат материали, изделия и/или други стоки, имащи явни или скрити дефекти и че СМР ще бъдат изпълнени с необходимото качество според инвестиционния проект, действащите стандарти и добри практики.

и

отчитат спецификата на възлаганите работи и са насочени към конкретната обществена поръчка, а не са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености

- Мерки(тип 2), отнасящи се до извършване на тестове (проби) след завършване на СМР - за да е възможно законосъобразното завършване на обекта и последващото му въвеждане в експлоатация бъдещият изпълнител следва да извърши тестове/проби (независимо дали единични или комплексни), доказващи експлоатационната годност на изградените мрежи и съоръжения. Последното е съществен елемент, свързан с цялостното спазване на определения чрез договора срок:

Осигуряване на независима лаборатория и резервна такава

За посочената мярка е представил:

- предложение за обхват, план и конкретни действия, свързани с реализация на изведените мерки, вкл. съставлящите ги фактори и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана

и

- Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество при изпълнение на настоящата

обществена поръчка

и

отчитат спецификата на възлаганите работи и са насочени към конкретната обществена поръчка, а не са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености

-Мерки(тип 3), отнасящи се до спазване на наличния финансов ресурс

Изпълнение на дейностите с необходимото качество и завършеност, осигуряване на всички документи, необходими за въвеждането на обекта в експлоатация, както и изпълнение на всички задължения по договора, в това число и опазване на околната среда,така че да се избегне риска от налагане на санкции на възложителя от трети страни

За посочената мярка е представил:

- предложение за обхват, план и конкретни действия, свързани с реализация на изведените мерки, вкл. съставлящите ги фактори и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана

и

- Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество при изпълнение на настоящата обществена поръчка

и

отчитат спецификата на възлаганите работи и са насочени към конкретната обществена поръчка, а не са мерки от

общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености предложени са по още една допълнителна мярка по всички типове мерки.	КТП2: Организация за изпълнение на дейностите КТП2Б- <i>Втора степен за оценяване, в който са въведени допълнителни компоненти за всеки един от подпоказателите, които се явяват надграждащи над базовите и същите могат да бъдат предлагани от участниците ,т.е. те не са от задължителен характер. Тези надграждащи компоненти са във връзка с установяване на наличието на преимущества на предложенията спрямо базовите.</i> - <u>Минимално изискване:</u> За всяка от основните дейности/СМР е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача* и са предложени конкретни начини за контрол на изпълнението на задачите, отчитането на резултатите и спазване на изискванията за качество на завършения обект на строителство и <u>ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:</u> Участника в табличен вид е представил вид на дейността;вид на експерта ; Мерки и начини за контрол на изпълнението на задачите и Отчитане на резултатите и спазване на изискване за качество за всички предвидени за изпълнение дейности - <u>Минимално изискване:</u> За всяка от основните дейности/СМР са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение - материали, механизация, инженерно-технически (ръководен) състав и строителни работници (работни екипи/групи) и др. и
--	--

* За целите на настоящата методика под „задача“ се разбира обособена част от основна дейност/СМР, която може да

бъде самостоятелно възлагана на отделен експерт, отговорен за предмета на настоящата поръчка и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати.

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

Участника е представил наименование на дейността; мярка; количество; материали; Техника, механизация, транспортни средства; Изпълнителски състав; Инженерно-технически състав за всички дейности попадащи в обвата на възлагане

- **Минимално изискване:**за вътрешна организация на неключовия персонал, обособен в работни групи(звена-ръководител и общи работници), които изпълняват същинското строителство разпределени по отделни дейности включени в строежа от гледна точка възлагане на техните задължения и надзор спрямо изпълнението им.

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

Участника в тази си част е дифинирал неключовия персонал за обекта , определил е техните задължения и е описал лицата, които възлагат техните задължения и надзор спрямо изпълнението им, дейности по възлагането и изпълнението на надзора по изпълнението им. Описал е че Разпределението по дейности е описано в по- горната таблица за дифинираните ресурси

- **Минимално изискване:**Линеен график за изпълнение на предмета на поръчката представя критичния път* при

изпълнението и

* Графикът включва метод на критичния път, който позволява ефективно планиране и приоритизиране на съвкупността от дейности (в общ график), отчитайки времената им за изпълнение и зависимостите между тях. За да може да се приложат тези алгоритми са нужни: списък от всички дейности, техните времеви рамки и зависимостите между тях. На база на тях се изчислява най-дългия и най-късия път за изпълнение на всички планирани дейности (и съответно на самия проект), както и кога най-рано или най-късно трябва да започне работата по конкретна планирана дейност. Една дейност е критична, ако всяко забавяне при нейното изпълнение води до забавяне на целия проект (изместване на крайния срок на проекта). Критичен път в този смисъл представлява непрекъсната последователност от критични дейности, които свързват началото и края на проекта. От определението става ясно, че то дефинира най-късия път за изпълнението на проекта - най-малко време за изпълнение! Графикът следва да показва технологична съвместимост на отделните дейности и операции, както и съответствие с останалите части на офертата, техническата спецификация, техническата документация и предложените ресурси. Графикът следва да е в пълно съответствие с декларираната организация на работа и техническо оборудване за изпълнение на поръчката.

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

Участника е представил Линеен график за изпълнение на предмета на поръчката, който представя критичния път и критични взаимовръзки; същия съдържа и продължителност, период на изпълнение, изпълнителски състав по брой и вид, техника, инструменти, оборудване и транспортни средства по брой и вид и материали. Освен това в Приложение 2, участника е представил Начин на изчисляване на критичния път и изчисляване на критичния път, в табличен вид,

като е посочил: № на дейността; наименование на дейността; ранно начало; ранен край; късно начало и късен край; резерв ; критична дейност - <u>Минимално изискване:</u> За всеки един от дефинираните от Възложителя рискове са посочени дейности по мониторинг <u>ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:</u> Участника е представил За всеки един от дефинираните от Възложителя рискове са посочени дейности по мониторинг	КТП2В- Трета степен за оценяване, в който са въведени допълнителни компоненти за всеки един от подпоказателите, които се явяват надграждащи над базовите и същите могат да бъдат предлагани от участниците ,т.е. те не са от задължителен характер. Тези надграждащи компоненти са във връзка с установяване на наличието на преимуществва на предложенията спрямо базовите. - Представена е в допълнение и организационна структура на персонала под формата на (схема/органиграма), отговорен за строителството, съответстваща на предложената организация на работната сила и <u>ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:</u> Участника е Представил в допълнение и организационна структура на персонала под формата на (схема/органиграма), отговорен за строителството, съответстваща на предложената организация на работната сила
---	--

- Предложени са начините на комуникация и координация, контрол и субординация както между експертите на изпълнителя, така и между заинтересованите лица в рамките на изпълнението на поръчката, включително при допустимите варианти по прекъсването. Описание на организацията за управление на договора и

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА

НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

Участникът в тази си част от предложението е представил комуникация и координация, като е определил комуникационни канали, където основните елементи за успешното управление са:Планиране на комуникациите – определяне на нуждите на заинтересованите страни от информация и данни;Разпространение на получената информация – своевременно достигане на информацията до заинтересованите страни;Отчитане на изпълнението – събиране и разпространение на данни за изпълнението, показатели за използването на ресурсите за постигане целите на договора. Неразделна част от този процес представлява и:Отчитане на състоянието – описване напредъка в даден момент;Отчитане на напредъка – Ние като изпълнител описваме какво е постигнал екипът;Прогнозиране – предполага бъдещото състояние за очаквания резултат;Отчет на изпълнението – данни за обхвана, разходите, постигнато качество и резултати.След това е обхванал управлението на обмена на информация и комуникациите между участниците в проекта е подчинено на следните принципи:Информираност – всеки един участник в инвестиционния процес да бъде информиран съобразно неговите функции, задължения и отговорности;Ангажираност – който и да е било участник в инвестиционния процес съобразно неговите функции, задължения и отговорности да бъде конкретно ангажиран да отговори / реагира на съответния проблем възможно

най-експедитивно; Проследяемост – възможност за идентифициране / проследяване на целия процес за решаване на даден проблем; Документираност – създаване на безусловна и безспорна документация на инвестиционния процес; Доказуемост - възможност във всеки един момент от инвестиционния процес да бъдат обективно възпроизведени необходимите факти и обстоятелства. След това е описал комуникацията и координацията която ще изпълняват ръководителя на проекта, техническия ръководител, Специалиста по здравословни и безопасни условия на труд и Специалиста по контрол на качеството, както и изпълнителския състав. Описана е координацията и комуникацията по всички нива в дружеството; предложена е схема за структурата за управление на договора, както и схема отразяваща субординацията в дружеството; посочил е че При настоящия проект организационната структура на екипа е от линеен тип, което предполага лесна комуникация в рамките на целия екип. Това дава възможност за дискусия по проблемите на проекта на целия екип и достъп до информация; описал е Положителните страни на този вид структура. След това участника е предложил основните мерки за процедурите за контрол, взаимодействие и суординация между експертите на изпълнителя, като: Начин на планиране; строго спазване на йерархичната структура; Методи на изпълнение; Готовност; Контрол; Спазване на нормативната уредба. След това участника е направил предложение за комуникация и координация, контрол и субординация между заинтересованите лица в рамките на изпълнението на поръчката, като е описал Комуникация и координация с Възложителя ,строителния надзор, проектантски екип, и други заинтересовани страни- МВР, Енерго, ВиК, РИОСВ. Описал е информационно-комуникационна система, която планира да приложи; посочил е начина на представяне на информацията и е определил отговорното лице , от страна на участника; предложените Комуникационни канали - Обменът на информация между Възложителя, строителния надзор, проектантски екип, и други заинтересовани страни- МВР, Енерго, ВиК, РИОСВ и изпълнителя ще се извършва по един от следните начини: по пощата - чрез

препоръчано писмо с обратна разписка; чрез куриерска служба; по факс; по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис ; чрез комбинация от тези средства; доклади; описал е дневния ред на срещите със заинтересованите страни; Всички срещи ще се протоколират и ще се изготвя списък на присъствалите, като всеки от тях ще го подписва собственоръчно; описани са Дейностите по управление на изпълнението на договора; след това е представил схема на контрол и субординация между заинтересованите лица в рамките на изпълнението на поръчката; описани са организация и начин на комуникация и координация и Взаимодействие с Възложителя – инвеститорския контрол; Взаимодействие с Авторският надзор; Взаимодействие със Строителният надзор; Взаимодействие с КАТ; Взаимодействие с Експлоатационни дружества на подземни комуникации - защита на подземната инфраструктура. След това е обхванал Комуникация, координация, контрол и субординация при допустимите варианти по прекъсването, като е предложил действия при прекъсване на строителството, в зависимост от причините- изготвяне на съответните актове, организация за спиране на обекта, организация за започване на строителството; актуализиране на графика; предложени са Организационни мерки, действия и начини за комуникация, които ще бъдат предприети от страна на Дружеството при прекъсване ; след това е направил описание на организацията за управление на договора, в т.ч. структура, схеми, необходими доклади, начин на организация на работни срещи и др, в това число Организация на Управление на договора; Децентрализация и овластяване; Планиране управлението на проекта; Организация на контрола и документооборота; Създаване на система за документитиране на изготвянето, прегледа и предаването на Възложителя на всички документи във връзка с изпълнението на договора; Създаване на система за отчитане работата на всички експерти и сътрудници на дружеството; планиране изпълнението на договора; Мобилизация на експертите. След това е предложил структура на управление, както между екипа на участника , така и между заинтересованите

страни. След това е обанал Необходими доклади и Начин на организация на работни срещи със заинтересованите страни; представил е приноса на всеки от членовете на обединението, както и на разпределението на задачите и връзката между тях. Описал е и начинът на комуникация между отделните членове

- Минимално изискване: Линеен график за изпълнение представя критичните взаимовръзки* при изпълнението и
* Критични взаимовръзки са връзките между дейностите (работите), които лежат на критичния път.

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

Участника е представил Линеен график за изпълнение на предмета на поръчката, който представя критичния път и критични взаимовръзки; същия съдържа и продължителност, период на изпълнение, изпълнителски състав по брой и вид, техника, инструменти, оборудване и транспортни средства по брой и вид и материали. Освен това в Приложение 2, участника е представил Начин на изчисляване на критичния път и изчисляване на критичния път, в табличен вид, като е посочил: № на дейността; наименование на дейността; ранно начало; ранен край; късно начало и късен край; резерв ; критична дейност

- Минимално изискване: За всеки един от дефинираните от Възложителя рискове са посочени дейности по контрол
ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

Участника, За всеки един от дефинираните от Възложителя рискове е посочил дейности по контрол

- Минимално изискване:Предложение за организацията, касаеща съставянето на актовете и протоколите по време на строителството, относно съставяне съобразно изискванията на законодателството на актове и протоколи по време на строителството спрямо други ключови експерти, така и с други участници в строителството

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

Участника е представил в тази си част от предложението , като е посочил изискванията за съставяне на актове и протоколи по време на строителството; след това е описал необходимите актове , които ще се съставят по време на строителството; описана е организация, по съставяне на актове от строителен надзор;възложител и строителя. Посочил е, че Лицата - участници в строителството - възложител, строител, проектант, консултант, физическото лице, упражняващо технически контрол за част “Конструктивна”, технически ръководител, доставчик и др., съставят актовете и протоколите непосредствено след извършените проверки, огледи и измервания на място само когато са постигнати изискванията към строежите по чл. 169, ал. 1 и 2 ЗУТ за съответните извършени СМР.представена е организация по подписване на актовете ; Обем, съдържание и реквизити на окончателния доклад

КТПЗ: Мерки за опазване на околната среда

КТПЗБ- Втора степен за оценяване, в който са въведени допълнителни компоненти за всеки един от подпоказателите,

които се явяват надграждани над базовите и същите могат да бъдат предлагани от участниците ,т.е. те не са от задължителен характер. Тези надграждани компоненти са във връзка с установяване на наличието на преимущества на предложението спрямо базовите.

- Минимално изискване:Предвидени са повече от една мярка за опазване на околната среда по всеки един от посочените аспекти, идентифицирани от Възложителя. Установява се подробно предложение относно всички мерки в тази част от офертата на участника. Всяка мярка съдържа едновременно следните три компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен екологичен ефект; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението й; и В)План за организация за изпълнение на мярката, с посочване на ресурсите(технически и човешки), които ще се използват и

-Плана за отпадъците, генерирани вследствие изпълнението предмета на поръчката обхваща:

А). Анализ на предвидените мерки и

Б). Предложение за конкретни действия за опазване на околната среда.

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

Участника е направил предложение по следните аспекти по опазване на околната среда и е предвидел следните мерки към тях:

Аспект 1 Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с отработенигорива, масла и др.работни

течности от механизацията;

Мярка 1 Товарните автомобили и механизацията ще се поддържа в добро техническо състояние, за да се сведат до минимум вредните емисии от изгорели газове, теч на масла и гориво и др работни течности

Мярка 2 Извършване на инструктажи и провеждане на обучения на персонала и забрана за преговаряване на транспортните средства над допустимия товар и извършване на ремонт на същите на същите на строителната площадка

Мярка 3 Използване на механизация и транспортни средства от ново поколение и където е приложимо да се предпочитат и прилага изпълнението на дейностите ръчно пред механизизирано

Към тези мерки , участника е направил предложение, относно:

А).Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен екологичен ефект;

Към тази точка е посочил обхват на мярката; предмет на мярката и целен екологичен ефект;

Б).Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите наотклонение от изпълнението й
Към тази точка е описал текущо прилагане на мярката и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението й

В)План за организация за изпълнение на мярката, спосочване на ресурсите(технически и човешки), които ще се използват

Към тази точка е обхванал план за организация за изпълнение на мярката и ресурсите(технически и човешки), които

ще се използват

След това участника е направил предложение дейности за мониторинг на отрицателно влияние на строителния процес върху посочените аспекти идентифицирани от Възложителя като е направил предложение, по мярка 1, по мярка 2 и по мярка 3. След това е направил предложение за дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки, като е предложил дейности за контрол по мярка 1, по мярка 2 и по мярка 3

Аспект 2 Намаляване запрашеността на атмосферния въздух и шума при изпълнение на поръчката
запрашеност

Мярка 1 Покриване на транспортните средства с покривала при превоз на строителни отпадъци маси по предварително одобрени маршрути от възложителя

Към тази мярка, участника е направил предложение, относно:

Мярка 2 Ежедневно почистване, организиране и поддържане на строителната площадка, чрез събиране на строителните отпадъци и обмокрянето и с вода

Към тези мерки , участника е направил предложение, относно:

А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен екологичен ефект;

Към тази точка е посочил обхват на мярката; предмет на мярката и целен екологичен ефект;

Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите наотклонение от изпълнението ѝ

Към тази точка е описал текущо прилагане на мярката и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ	
В) План за организация за изпълнение на мярката, спосочване на ресурсите (технически и човешки), които ще се използват	
Към тази точка е обхванат план за организация за изпълнение на мярката и ресурсите (технически и човешки), които ще се използват	
шум	
Мярка 1 Осигуряване на екрани, които ще предпазват от високи нива на шум, както и ограничаване изпълнението на шумни работи извън регламентирано време	
Мярка 2 Използване на транспортни средства от ново поколение, от които се генерира по –малко шум, включително и забрана на същите да работят на празен ход	
Към тези мерки, участника е направил предложение, относно:	
А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен екологичен ефект;	
Към тази точка е посочил обхват на мярката; предмет на мярката и целен екологичен ефект;	
Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ	
Към тази точка е описал текущо прилагане на мярката и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ	

В)План за организация за изпълнение на мярката, спосочване на ресурсите(технически и човешки), които ще се използват
Към тази точка е обхванат план за организация за изпълнение на мярката и ресурсите(технически и човешки), които ще се използват
След това участника е направил предложение за дейности за мониторинг на отрицателно влияние на строителния процес върху посочените аспекти идентифицирани от Възложителя, а именно: за Запашеност - По мярка 1 и По мярка 2; Шум - По мярка 1 и По мярка 2. След това е описал дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки, а именно: за Запашеност - По мярка 1 и По мярка 2; Шум - По мярка 1 и По мярка 2
Аспект 3 Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на строителство
Към този аспект е посочил следните мерки:
Мярка 1 Недопускане изоставянето, нерегламентирано изхвърляне и изгаряне или друга форма на неконтролирано обозвредяване на отпадъците
Мярка 2 Ежедневно събиране, извозване и депониране или оползотворяване на генерираните отпадъци от обекта за деня, като няма да се допуска отпадъци да нощуват на обекта
Към тези мерки, участника е направил предложение, относно:
А).Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен екологичен ефект;
Към тази точка е посочил обхват на мярката; предмет на мярката и целен екологичен ефект;

Б).Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите наотклонение от изпълнението й Към тази точка е описал текущо прилагане на мярката и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението й
В)План за организация за изпълнение на мярката, спосочване на ресурсите(технически и човешки), които ще се използват
Към тази точка е обхванал план за организация за изпълнение на мярката и ресурсите(технически и човешки), които ще се използват
След това е направил предложение за дейности за мониторинг на отрицателно влияние на строителния процес по мярката 1 и по мярката 2. След това е направил предложение за дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки по мярката 1 и по мярката 2.
Аспект 4 Оптимизиране на графици за доставка на материали за намаляване на трафика Към този аспект , участника е предвидил следните мерки
Мярка 1 Изготвяне и прилагане на график за необходимите за деня количества материали
Мярка 2 Доставка на материали в ненатоварен часови диапазон Към тези мерки, участника е направил предложение, относно:
А).Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен екологичен ефект; Към тази точка е посочил обхват на мярката; предмет на мярката и целен екологичен ефект;
Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите наотклонение от изпълнението й

Към тази точка е описал текущо прилагане на мярката и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ В)План за организация за изпълнение на мярката, спосочване на ресурсите(технически и човешки), които ще се използват Към тази точка е обхванал план за организация за изпълнение на мярката и ресурсите(технически и човешки), които ще се използват <u>Предложени са по една допълнителна мярка по всички базови аспекти</u>	КТПЗВ- Трета степен за оценяване, в който са въведени допълнителни компоненти за всеки един от подпоказателите, които се явяват надграждащи над базовите и същите могат да бъдат предлагани от участниците ,т.е. те не са от задължителен характер.Тези надграждащи компоненти са във връзка с установяване на наличието на преимущества на предложенията спрямо базовите. - <u>Минимално изискване:</u>Предвидени и дейности за мониторинг на отрицателно влияние на строителния процес върху посочените аспекти идентифицирани от Възложителя, както и предвидени и дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки. - <u>Минимално изискване:</u> Предвидени и дейности за мониторинг на Плана за отпадъците, както и предвидени и дейности за контрол на изпълнението на предложените действия.
--	--

**ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА
НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:**

Участника е направил предложение по следните аспекти по опазване на околната среда и е предвидел следните мерки към тях:

Аспект 1 Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с отработени горива, масла и др. работни течности от механизацията;

Мярка 1 Товарните автомобили и механизацията ще се поддържа в добро техническо състояние, за да се сведат до минимум вредните емисии от изгорели газове, теч на масла и гориво и др работни течности

Мярка 2 Извършване на инструктажи и провеждане на обучения на персонала и забрана за преговаряване на транспортните средства над допустимия товар и извършване на ремонт на същите на същите на строителната площадка

Мярка 3 Използване на механизация и транспортни средства от ново поколение и където е приложимо да се предпочитат и прилага изпълнението на дейностите ръчно пред механизизирано

Към тези мерки , участника е направил предложение, относно:

А).Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен екологичен ефект;

Към тази точка е посочил обхват на мярката; предмет на мярката и целен екологичен ефект;

Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението й

Към тази точка е описал текущо прилагане на мярката и прилагане на действия в случаите на отклонение от

изпълнението ѝ	
В)План за организация за изпълнение на мярката, спосочване на ресурсите(технически и човешки), които ще се използват	
Към тази точка е обхванат план за организация за изпълнение на мярката и ресурсите(технически и човешки), които ще се използват	
След това участника е направил предложение дейности за мониторинг на отрицателно влияние на строителния процес върху посочените аспекти идентифицирани от Възложителя като е направил предложение, по мярка 1, по мярка 2 и по мярка 3. След това е направил предложение за дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки, като е предложил дейности за контрол по мярка 1, по мярка 2 и по мярка 3	
Аспект 2 Намаляване запрашеността на атмосферния въздух и шума при изпълнение на поръчката	
запрашеност	
Мярка 1 Покриване на транспортните средства с покривала при превоз на строителни отпадъци маси по предварително одобрени маршрути от възложителя	
Мярка 2Ежедневно почистване,организиране и поддържане на строителната площадка, чрез събиране на строителните отпадъци и обмокрянето и с вода	
Към тези мерки, участника е направил предложение, относно:	

А).Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен екологичен ефект; Към тази точка е посочил обхват на мярката; предмет на мярката и целен екологичен ефект; Б).Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите наотклонение от изпълнението й Към тази точка е описал текущо прилагане на мярката и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението й	В)План за организация за изпълнение на мярката, спосочване на ресурсите(технически и човешки), които ще се използват Към тази точка е обхванал план за организация за изпълнение на мярката и ресурсите(технически и човешки), които ще се използват шум	Мярка 1 Осигуряване на екрани, които ще предпазват от високи нива на шум, както и ограничаване изпълнението на шумни работи извън регламентирано време Мярка 2 Използване на транспортни средства от ново поколение, от които се генерира по –малко шум, включително и забрана на същите да работят на празен ход Към тези мерки, участника е направил предложение, относно: А).Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен екологичен ефект; Към тази точка е посочил обхват на мярката; предмет на мярката и целен екологичен ефект;
--	---	---

Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението й
Към тази точка е описал текущо прилагане на мярката и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението й

В). План за организация за изпълнение на мярката, спосочване на ресурсите (технически и човешки), които ще се използват

Към тази точка е обхванат план за организация за изпълнение на мярката и ресурсите (технически и човешки), които ще се използват

След това участника е направил предложение за дейности за мониторинг на отрицателно влияние на строителния процес върху посочените аспекти идентифицирани от Възложителя, а именно: за Запашеност - По мярка 1 и По мярка 2; Шум - По мярка 1 и По мярка 2. След това е описал дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки, а именно: за Запашеност - По мярка 1 и По мярка 2; Шум - По мярка 1 и По мярка 2

Аспект 3 Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на строителство

Към този аспект е посочил следните мерки:

Мярка 1 Недопускане изоставянето, нерегламентирано изхвърляне и изгаряне или друга форма на неконтролирано обзвръждане на отпадъците

Мярка 2 Ежедневно събиране, извозване и депониране или оползотворяване на генерираните отпадъци от обекта за деня, като няма да се допуска отпадъци да нощуват на обекта

Към тези мерки, участника е направил предложение, относно:

А).Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен екологичен ефект;

Към тази точка е посочил обхват на мярката; предмет на мярката и целен екологичен ефект;

Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението й

Към тази точка е описал текущо прилагане на мярката и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението й

В)План за организация за изпълнение на мярката, спосочване на ресурсите(технически и човешки), които ще се използват

Към тази точка е обхванал план за организация за изпълнение на мярката и ресурсите(технически и човешки), които ще се използват

След това е направил предложение за дейности за мониторинг на отрицателно влияние на строителния процес по мярка 1 и по мярка 2. След това е направил предложение за дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки по мярка 1 и по мярка 2.

Аспект 4 Оптимизиране на графика за доставка на материали за намаляване на графика

Към този аспект , участника е предвидил следните мерки

Мярка 1 Изготвяне и прилагане на график за необходимите за деня количества материали

Мярка 2 Доставка на материали в ненатоварен часови диапазон

Към тези мерки, участника е направил предложение, относно:

А).Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен екологичен ефект; Към тази точка е посочил обхват на мярката; предмет на мярката и целен екологичен ефект; Б).Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението й Към тази точка е описал текущо прилагане на мярката и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението й	
В)План за организация за изпълнение на мярката, спосочване на ресурсите(технически и човешки), които ще се използват	
Към тази точка е обхванал план за организация за изпълнение на мярката и ресурсите(технически и човешки), които ще се използват	
Участника в табличен вид е посочил Вид отпадък и код; категоризация на отпадъците съгл чл.4от НУСОВРСМ; разпределение на задълженията; Честота на събиране; начин на депониране/ оползотворяване/ рециклиране	
Представил е А)Анализ на предвидените мерки и Б)Предложение за конкретни действия за опазване на околната средаСлед това е направил предложение А)Анализ на предвидените мерки , както следва: Мярка 1 Недопускане изоставянето, нерегламентирано изхвърляне и изгаряне или друга форма на неконтролирано обозвреждане на отпадъците;	
Мярка 2 Ежедневно събиране, извозване и депониране или оползотворяване на генерираните отпадъци от обекта за	

деня, като няма да се допуска отпадъци да нощуват на обекта

Към тези мерки, участника е направил предложение, относно:

А).Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен екологичен ефект;

Към тази точка е посочил обхват на мярката; предмет на мярката и целен екологичен ефект;

Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите наотклонение от изпълнението ѝ

Към тази точка е описал текущо прилагане на мярката и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ

В)План за организация за изпълнение на мярката, спосочване на ресурсите(технически и човешки), които ще се използват

Към тази точка е обхванал план за организация за изпълнение на мярката и ресурсите(технически и човешки), които ще се използват

Предложил е дейности за мониторинг на отрицателно влияние на строителния процес и дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки

След това е направил предложение от допълнителни мерки, А) Анализ на предвидените мерки, като е предложил характеристики и показатели на конкретните видове отпадъци и аргументи за тяхното третиране. Направил е Описание на мерки за изпълнение на йерархията на управление на отпадъците. Предложил е Б)Предложение за конкретни действия за опазване на околната среда, като е описал Превантивни природозащитни мерки , в това число

Инструктажи; Почистване на работната площадка по време на строителството; Работа с изправни и регулирани ДВГ; Деponиране на съществуващи стари материали само на регламентирани депa;след това е направил предложение Предвидени и дейности за мониторинг на Плана за отпадъците , както и предвидени и дейности за контрол на изпълнението на предложените действия	КТП4: Социални характеристики, свързани с изпълнението на поръчката
КТП4Б- <i>Втора степен за оценяване, в който са въведени допълнителни компоненти за всеки един от подпоказателите, които се явяват надграждащи над базовите и същите могат да бъдат предлагани от участниците ,т.е. те не са от задължителен характер. Тези надграждащи компоненти са във връзка с установяване на наличието на преимущества на предложението спрямо базовите.</i> <u>Минимално изискване:</u>Предвидени са повече от една мерка касаещи социални характеристики по всеки един от посочените аспекти, идентифицирани от Възложителя. Установява се подробно предложение относно всички мерки в тази част от офертата на участника. Мерките отчитат спецификата на възлаганите работи и са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка съдържа едновременно следните три компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен социален ефект; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението й; В)План за организация за изпълнение на мярката, с посочване на ресурсите(технически и човешки)	

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА
НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

Участника е представил

Аспект 1 Организиране на работния процес, така че да се не се прекъсва достъпа и достъпната среда около строежа;

Мярка 1 Ежедневно извозване на строителни отпадъци и изкопани земни маси, с цел да не се прекъсва достъпа и достъпната среда около строежа

Мярка 2 Доставените количества материали, ще са необходимите за влагане за деня, като няма да се допуска материали да ношуват на обекта, с цел да не се прекъсва достъпа и достъпната среда около строежа

Към тези мерки е представил:). Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен социален ефект; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението й; В) План за организация за изпълнение на мярката, с посочване на ресурсите (технически и човешки).

Аспект 2 Организиране на работния процес, така че да се минимизира неудобството за транспорта и пешеходците и гарантира безопасността им

Мярка 1 Организиране на работния процес, така че да не се прекъсва транспортната свързаност между крайните точки на пътните/улични отсечки, както за автомобили, така и за пешеходци

Мярка 2 Осигуряване на необходимия инвентар - временни огради, заграждения, указателни табели и знаци, пасарелки и други, за обезпечаване безопасното преминаване , както и на пешеходци , така и на автомобилния поток

Към тези мерки е представил:). Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен социален ефект; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението й; В)План за организация за изпълнение на мярката, с посочване на ресурсите(технически и човешки).

Аспект 3 Организиране на работния процес, така че да се минимизира неудобството за гражданите в близост до обекта от прах, шум, замърсяване

Прах

Мярка 1 Покриване на транспортните средства с покривала при превоз на строителни отпадъци и земни маси по предварително одобрени маршрути от възложителя

Мярка 2 Ежедневно почистване,организиране и поддържане на строителната площадка, чрез събиране на строителните отпадъци и обмокрянето и с вода

Към тези мерки е представил:). Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен социален ефект; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението й; В)План за организация за изпълнение на мярката, с посочване на ресурсите(технически и човешки).

Шум

Мярка 1 Осигуряване на екрани, които ще предпазват от високи нива на шум, както и ограничаване изпълнението на шумни работи извън регламентирано време

Мярка 2 Използване на техника от ново поколение, от която се генерира по –малко шум, включително и забрана на същата да работи на празен ход

Към тези мерки е представил:). Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен социален ефект; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението й; В)План за организация за изпълнение на мярката, с посочване на ресурсите(технически и човешки).

замърсяване

Мярка 1 Ежедневно събиране, извозване и депониране или оползотворяване на генерираните отпадъци от обекта за деня, като няма да се допуска отпадъци да нощуват на обекта

Мярка 2 Недопускане изоставянето, нерегламентирано изхвърляне и изгаряне или друга форма на неконтролирано обзввреждане на отпадъците;

Към тези мерки е представил:). Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен социален ефект; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението й; В)План за организация за изпълнение на мярката, с посочване на ресурсите(технически и човешки).

Аспект 4 Информирание на гражданите (живущи и работещи в близост до обекта) относнопредстоящи строително-монтажни работи <u>Мярка 1 Изготвяне на седмични графици за предстоящите дейности и поставянето им на видно място</u> <u>Мярка 2 Съобщения по местното радио и телевизия с цел достигане до по-голям кръг заинтересовани лица</u> Към тези мерки е представил:). Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен социален ефект; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението й; В)План за организация за изпълнение на мярката, с посочване на ресурсите(технически и човешки). <u>Предложени са по една допълнителна мярка по всички базови аспекти</u>	КТП4В- Трета степен за оценяване, в който са въведени допълнителни компоненти за всеки един от подпоказателите, които се явяват надграждащи над базовите и същите могат да бъдат предлагани от участниците, т.е. те не са от задължителен характер. Тези надграждащи компоненти са във връзка с установяване на наличието на преимущества на предложенията спрямо базовите. <u>Минимално изискване:</u>Представен един или повече допълнителни аспекти извън базовите аспекти на социални характеристики, като аспекти отчитат спецификата на възлаганите работи и са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са аспекти от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Предвидени са повече от една мерка и на допълнителните аспекти касаещи социалните характеристики. Установява се подробно предложение относно всички мерки в тази част от офертата на участника.
---	---

Мерките отчитат спецификата на възлаганите работи и са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка съдържа едновременно следните три компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен социален ефект; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението й; В) План за организация за изпълнение на мярката, с посочване на ресурсите(технически и човешки) .

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

Участника е представил допълнителен аспект

Аспект 1 Осигуряване на достъп до жизнено важни услуги за живота и бита награжданите и гостите на града

Мярка 1Организиране на работния процес, така че да не се прекъсва достъпа до комунални услуги- телефон, интернет и телевизия

Към посочената мярка е представил:). Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен социален ефект; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението й; В)План за организация за изпълнение на мярката, с посочване на ресурсите(технически и човешки).

Мярка 2Достъп до електроснабдяване и топлоснабдяване /газификация

Към посочената мярка е представил:). Предложение относно обхвата и предмета на мярката, целен социален ефект; и Б).

Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението й; В) План за организация за изпълнение на мярката, с посочване на ресурсите(технически и човешки).


Участника е представил допълнителен аспект

ВЪВ ВРЪЗКА С ГОРЕЦИТИРАНИТЕ КОНСТАТАЦИИ И МОТИВИ ОТНОСНО съдържанието на техническото предложение на участника спрямо отделните показатели за оценка и надграждащи елементи КОМИСИЯТА направи следната оценка:

По показател КТП1: Предлаган подход за качествено изпълнение на поръчката:

Офертата покрива Първа степен на оценяване, предвид че съдържа в себе си задължителни компонент представляващ базово/минимално изискване по този показател

Офертата покрива Втора степен за оценяване, в който са въведени допълнителни компоненти , които се явяват надграждащи над базовите

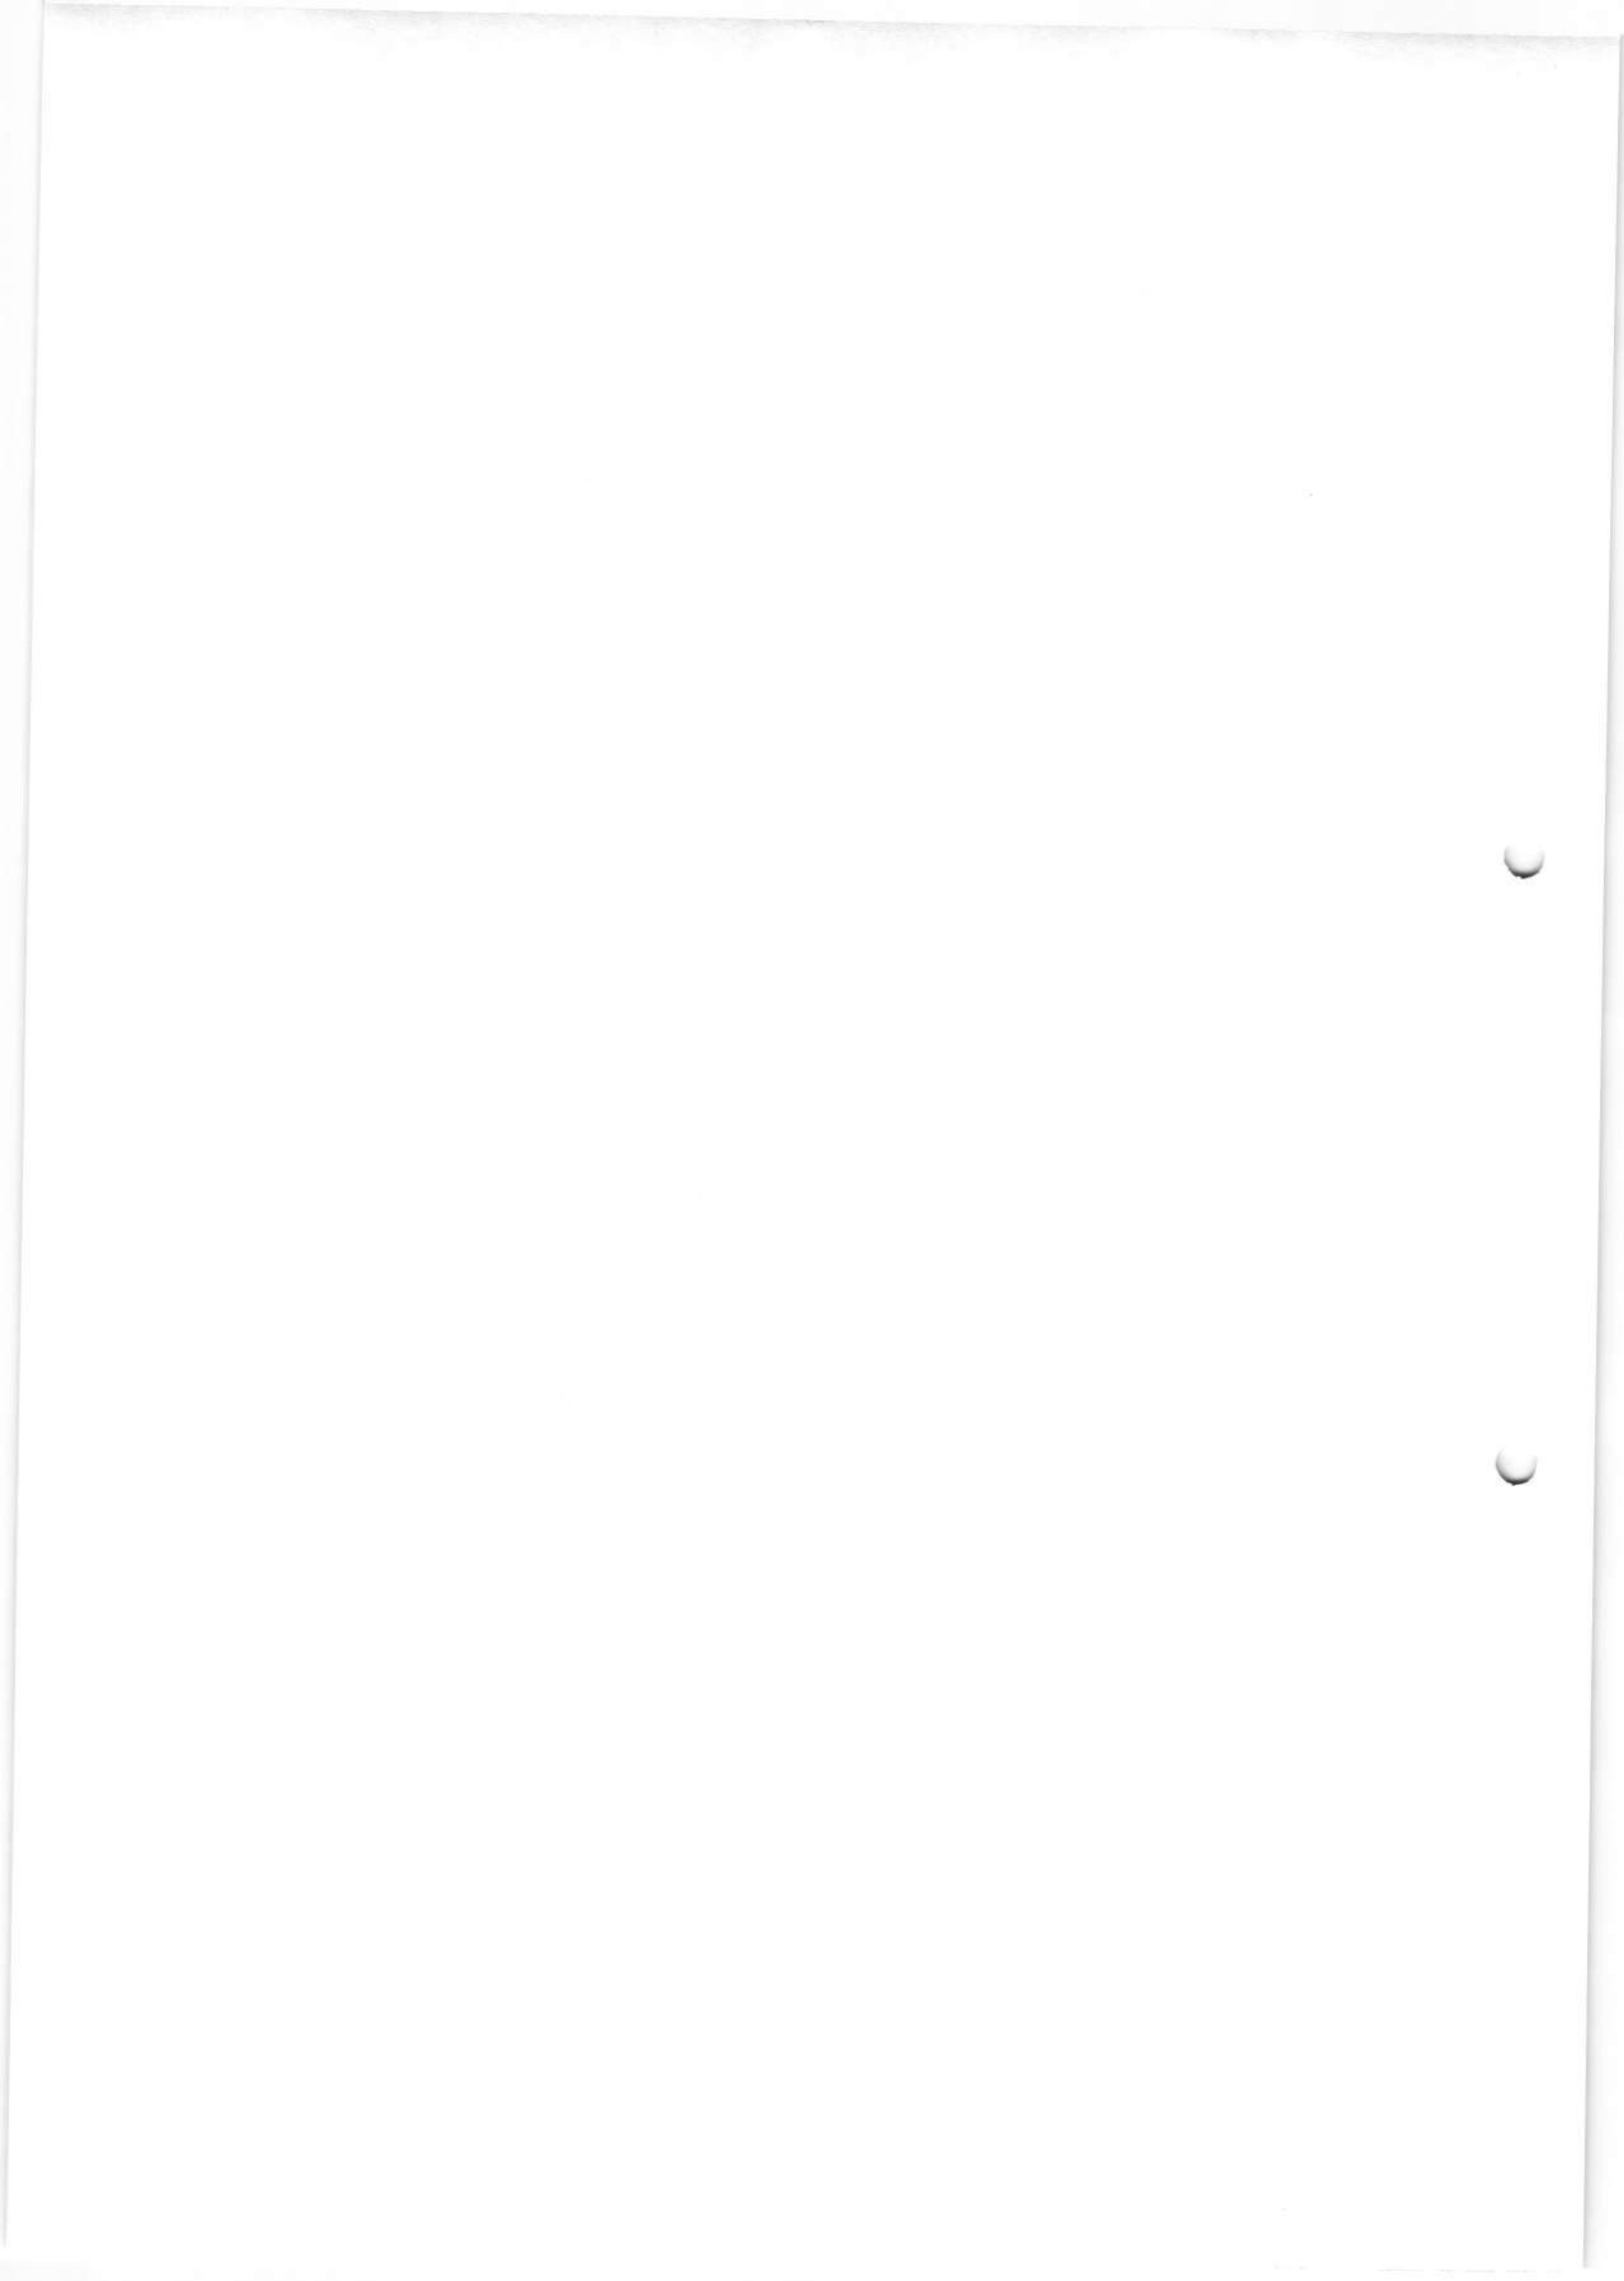

Офертата покрива Трета степен за оценяване, в който са въведени допълнителни компоненти , които се явяват надграждащи над базовите

Офертата покрива трета степен на оценяване, и съответно по показател КТП1: Предлагаан подход за качествено изпълнение на поръчката се присъждат 20 точки – КТП1В

По показател КТП2: Организация за изпълнение на дейностите:

Офертата покрива Първа степен на оценяване, предвид че съдържа в себе си задължителни компонент представляващ базово/минимално изискване по този показател

Офертата покрива Втора степен за оценяване, в който са въведени допълнителни компоненти , които се явяват надграждащи над базовите

Офертата покрива Трета степен за оценяване, в който са въведени допълнителни компоненти , които се явяват надграждащи над базовите

Офертата покрива трета степен на оценяване, и съответно по показател КТП2: Организация за изпълнение на дейностите на поръчката се присъждат 20 точки – КТП2В

По показател КТП3: Мерки за опазване на околната среда:

Офертата покрива Първа степен на оценяване, предвид че съдържа в себе си задължителни компонент представляващ базово/минимално изискване по този показател

Офертата покрива Втора степен за оценяване, в който са въведени допълнителни компоненти , които се явяват надграждащи над базовите

Офертата покрива Трета степен за оценяване, в който са въведени допълнителни компоненти , които се явяват надграждащи над базовите

Офертата покрива трета степен на оценяване, и съответно по показател КТПЗ: Мерки за опазване на околната среда се присъждат 5 точки – КТПЗВ

По показател КТП4: Социални характеристики, свързани с изпълнението на поръчката:

Офертата покрива Първа степен на оценяване, предвид че съдържа в себе си задължителни компонент представляващ базово/минимално изискване по този показател

Офертата покрива Втора степен за оценяване, в който са въведени допълнителни компоненти , които се явяват надграждащи над базовите

Офертата покрива Трета степен за оценяване, в който са въведени допълнителни компоненти , които се явяват надграждащи над базовите

Офертата покрива трета степен на оценяване, и съответно по показател КТП4: Социални характеристики, свързани с изпълнението на поръчката се присъждат 5 точки – КТП4В

Оценка:

П1 – „Техническо предложение на участника за изпълнение на поръчката	точки
КТП1: Предлаган подход за качествено изпълнение на поръчката	20,00
КТП2: Организация за изпълнение на дейностите	20,00
КТП3: Мерки за опазване на околната среда	5,00
КТП4: Социални характеристики, свързани с изпълнението на поръчката	5,00
П1= КТП1 + КТП2+ КТП3+ КТП4	50,00

чл. 37
ЗОП
във вр.
с пер.
2016/6
79

Председател:
Николай Великов

чл. 37
ЗОП във
вр. с пер.
2016/679

Членове:

Ивайло Иванов

чл.
37
ЗОП
във
вр. с
пер.
2016/
679

инж. Орлин Първулов

